



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
Processo de Pagamento Orçamentário

MAIO/2023

Processo Pagamento: 2559

Data: 12/05/2023

FORNECEDOR

Nome: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 05.325.864/0001-05
Endereço: R A Compl: LOTE ARTHUR B DO ROSARIO
Bairro: CENTRO Cidade: Japaratuba UF: SE
E-mail: @ Telefone: (79)99003-449 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
SubFunção: 361 Ensino Fundamental
Programa: 0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
Ação: 1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações
SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo
Fonte: 15500000 Transferência do Salário-Educação
Marcador: 15500000 Transferência do Salário-Educação
Centro Custo:

Licitação: Nº 01/2022 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
966	10/03/2023	44.917,94	20.000,00	24.917,94

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A REEMPENHO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 781/2022 EM 23/03/2023 - CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 COM VIGÊNCIA DE 12 MESES.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PARTE DA NOTA FISCAL 0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 E CONTRATO N.º 17/2022 BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 01/2023 (MARIO TRINDADE CRUZ).

Liquidações(Nº - Data)	Valor
1351 - 21/03/2023	20.000,00
Retenção	Valor

VINTE MIL REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	20.000,00

Data: 12/05/2023

Conta: 3000752 - SALARIO EDUCACAO

Autorização de Débito: 67IN


GUILHERME JULIUS ZACARIAS DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0001195


ALINE BATISTA DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.0002815

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

MARÇO/2023

Nota de Liquidação: 1351 Data: 21/03/2023

FORNECEDOR

Nome: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPF: 05.325.864/0001-05

Endereço: R A, 75

Compl: LOTE ARTHUR B DO ROSARIO

Bairro: CENTRO

Cidade: Japaratuba

UF: SE

E-mail: @

Telefone: (79)99003-449

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0206

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12

Educação

SubFunção: 361

Ensino Fundamental

Programa: 0005

EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Ação: 1010

CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 44905100

Obras e Instalações

SubElemento: 44905103

Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo

Fonte: 15500000

Transferência do Salário-Educação

Marcador: 15500000

Transferência do Salário-Educação

Centro Custo:

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
966	10/03/2023	74.917,94	74.917,94	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A REEMPENHO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 781/2022 EM 23/03/2023 - CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 COM VIGÊNCIA DE 12 MESES.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF. NOTA FISCAL 0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 E CONTRATO N.º 17/2022 BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 01/2023 (MARIO TRINDADE CRUZ).

Documento	Valor
Nota Fiscal (01 / Série: A / UF: SE / Emissão: 06/03/2023)	74.917,94

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	74.917,94

SETENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS	Total Retido: 0,00
	Total Liquido: 74.917,94


Data: 21/03/2023

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.


CARLAS ANDREA DOS SANTOS NUNES
SOUZA
ENCARREGADO DE EMPENHO Mat.0001426



Banese

Agência 059 Tipo 22 Conta 300075-2
PIRAMBU GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20230512994000067IN
Data: Realizado em 12/05/2023 às 12h:34m

Dados da transação

Finalidade: 01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem: Conta Corrente
Banco origem: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem: 059
Conta origem: 22/300075-2
1º titular da conta origem: MUNICIPIO DE PIRAMBU
Tipo de conta destino: Conta Corrente
Banco destino: 001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino: 2206
Conta destino: 000007290-7
CNPJ do favorecido: 05.325.864/0001-05
Nome do favorecido: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA
Valor do documento: R\$ 20.000,00
Descrição: REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PAGO



Agência 059 Tipo 22 Conta 300075-2
PIRAMBU GABINETE PREFEITO

Banese

TED Aguardando Autorização de outro usuário

Dados da transação

Tipo de conta origem: Conta Corrente
Agência Origem: 59
Conta Origem: 22/300075-2
Banco destino: 001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Tipo de conta destino: Conta Corrente
Agência destino: 2206
Conta destino: 000007290-7
CNPJ do favorecido: 05.325.864/0001-05
Nome do favorecido: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA
Valor: 20.000,00
Finalidade: 01 - Crédito em Conta Corrente
Descrição: REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



TERMO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 05.325.864/0001-05

Nome: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Endereço: R A

Bairro: CENTRO

E-mail: @

Compl: LOTE ARTHUR B DO ROSARIO

Cidade: Japaratuba

Telefone: (79)99003-449

UF: SE

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Conta:

EMPENHO

966

EMIÇÃO

10/03/2023

CLASSIFICAÇÃO

1010.44905100-15500000

TIPO

Global

FONTE

15500000 - Transferência do Salário-Educação

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A REEMPENHO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 781/2022 EM 23/03/2023 - CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTES MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 COM VIGÊNCIA DE 12 MESES.

Documentação

Nota Fiscal 01
Valor R\$ 74.917,94
Emissão 06/03/2023
Horário de Entrega 13/03/2023 08:55:31

LIQUIDADO

Para acompanhar o andamento do seu processo na fila pública, acesse o link abaixo:

<http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pirambu/fornecedor/filapagamento>

Cadastrado por: Santiago Santos Gois

Secretaria de Controle Interno

☒ Aprovado

☐ Reprovado

Obs. _____



MUNICÍPIO DE JAPARUTUBA

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento Tributário - Praça Padre Celso Tavares, Nº 66, Centro - CEP: 49.960-000 - Telefone: (79) 3272-3216

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília):
15/03/2023 08:10:39

Período de Competência:
03/2023

Município de Prestação do Serviço:
Pirambu - SE

Reg. Especial Tributação:

Eligibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigível em Pirambu

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:

J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia:

J & A ENGENHARIA

E-mail:

jcalex1@hotmail.com

CNPJ (CNP):

05.325.864/0001-05

Inscrição Municipal:

533

Inscrição Estadual:

Simples Nacional:

Sim

Incentivador Cultural:

Não

Por. Fax:

(79) 9900-3449

Endereço:

RUA A, LOT. ARTHUR BISPO DO ROSARIO, 75, Centro - CEP: 49960-000 - Japarutuba - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

CNPJ (CNP):

13.095.039/0001-81

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Por. Fax:

(79) 3276-1375

E-mail:

pmpirambu@hotmail.com

Endereço:

Praça Dos Esportes, 75, Centro - CEP: 49190-000 - Pirambu - SE

SERVIÇO PRESTADO

0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS);.. CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO VIBULETIN DE MEDIÇÃO REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR MARIO TRINDADE - PIRAMBU/SE - INCLUIDO AO CONTRATO Nº 17/2022.

CONTRATO Nº 17/2022

PERÍODO ESCOLAR MARIO TRINDADE: 25/02/2022 a 20/03/2022

ISS 2,00% RETIDO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/06, Art. 10, § 5º INCII PERTINENTE AO REGIME TRIBUTÁRIO (SIMPLES NACIONAL).

SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

BASE DE CÁLCULO PARA EFEITO DO ISS CONFORME CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE.

CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PREFEITURA DE PIRAMBU/SE - MATERIAL 40%.

CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PREFEITURA DE PIRAMBU/SE - IMPO DE CBPA 60%.

VALOR DO ISS A SER RETIDO: R\$ 899,02 BASE DE CÁLCULO: R\$ 44.950,76 INCII 10%.

DADOS BANCÁRIOS:

J A PROJECT ENG

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2206-3

CONTA CORRENTE: 7030-7

RETENÇÕES FEDERAIS

RIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
74.917,94	0,00	0,00	*****	2,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	74.917,94	74.917,94

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 10.076,46 Federal e R\$ 3.745,90 Municipal. Fonte: IBPT (3EF85C)

Substitui nota 2023000000000001 de 06/03/2023

Atualizado em: 15/03/2023 08:10:39

Para validação desta NFS-e acesse: <https://www.spbrasil.gov.br/validar-nfs-e>

Esta NFS-e foi emitida com respeito ao Decreto nº 970 de 22 de abril de 2014.

Nota: 2023000

00000002

Código Verificação
4TGV-1HHS



MUNICÍPIO DE JAPARUTUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

CNPJ: 13.065.039/0001-81

DECLARO QUE:

- ☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
☐ OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES
☐ A OBR FOI EXECUTADA.

15/03/2023

Acácia Dias da Cruz Ribeiro



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CHECK LIST PARA PAGAMENTO DE OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA

Processo nº: TP Nº 01/22 Vigência: 23/03/23
Empresa Contratada: J.A. PROJECT & ENGENHARIA LTDA
Resumo do objeto: REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

14/03/23

Katia Silveira dos Santos
Secretária de Controle Interno
Decreto nº 57/2021

ITENS	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Nota Fiscal contendo Nº do empenho/Ano, Modalidade – Número/Ano da Licitação e Nº do Contrato/Ano.	X		
Laudo de medição da obra, assinado pelo Engenheiro responsável.	X		APRESENTAR ORIGINAL ✓
Certidão de Regularidade do FGTS	X		
Certidão Negativa de Tributos Municipais	X		COM VALIDADE NA DATA DA NF
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais e Dívida Ativa da União	X		
Certidão Negativa de Tributos Estaduais	X		
Certidão de Regularidade Trabalhista	X		
CERTIDÃO DO CREA - PESSOA JURÍDICA	X		
CERTIDÃO DO CREA - PESSOA FÍSICA	X		
Cópia do comprovante de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART DE EXECUÇÃO	X		
Cópia do comprovante de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART DE FISCALIZAÇÃO		X	
Cadastro Nacional de Obras - CNO	X		
Planilha de Levantamento de Eventos - PLE			
REGISTRO FOTOGRÁFICO	X		APRESENTAR CLASSINATURAS ✓
DIÁRIO DA OBRA	X		APRESENTAR ORIGINAL ✓
Extrato de Optante ou de Não Optante pelo Simples			
Memorial descritivo da obra			
Cópia do Alvará de Construção, Reconstrução, Reforma, Ampliação ou Demolição, nos termos do Código de Obras (Lei n.º 502/01), ou justificativa do fiscal quando não for necessário.	X		
Recolhimento do INSS relativo aos funcionários (Guia da Previdência Social – (GPS).			APRESENTADO COMPETÊNCIA ✓
Recolhimento do FGTS relativo aos funcionários (Guia de Recolhimento do FGTS – (GRF).			11/2022 - PERÍODO DE ✓
Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – SEFIP, do mês anterior à Prestação de Serviço, só com a relação dos trabalhadores constantes do arquivo e com o resumo das informações à Previdência Social constantes do arquivo, e que comprove o valor pago referente ao FGTS e à Contribuição Previdenciária.			MEDICÃO 15/02 A 02/03 TOMADOR DA OBRA: CAPELA ✓ FAZENDO COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ✓

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					Preço Unitário (R\$)	VALORES (R\$)					
			Prevista	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Previsto	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	Saldo (%)
05.001	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								99.417,35	0,01	74.917,94	74.917,95	35.960,82	75,36
05.001.001	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	11,99	18.402,71	0,00	7.201,71	7.201,71	11.201,00	39,13
05.001.002	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,92	227,81	0,00	227,81	227,81	0,00	100,00
05.001.003	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	25,54	4.036,80	0,00	4.036,80	4.036,80	0,00	100,00
05.001.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	97,40	2.937,10	0,00	2.937,10	2.937,10	0,00	100,00
05.002	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								11.201,00	0,00	0,00	0,00	11.201,00	0,00
05.002.001	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	38,69	1.231,77	0,00	0,00	0,00	1.231,77	0,00
05.002.002	Revisão de ponto de água tipo 1	un	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	26,14	735,11	0,00	0,00	0,00	735,11	0,00
05.003	LOUÇAS E METAIS								496,66	0,00	0,00	0,00	496,66	0,00
05.003.001	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	227,55	1.133,77	0,00	0,00	0,00	1.133,77	0,00
05.003.002	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	11,76	682,65	0,00	0,00	0,00	682,65	0,00
05.003.003	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	380,56	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00
05.004	ESQUADRIAS								380,56	0,00	0,00	0,00	380,56	0,00
05.004.001	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	15,12	0,00	0,00	0,00	15,12	11,61	19.927,72	0,00	0,00	0,00	19.927,72	0,00
05.004.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore	un	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	959,17	175,54	0,00	0,00	0,00	175,54	0,00
05.004.003	Conjunto de ferragens p/ porta interna com fechadura de embutir c/maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha residencial, ref:1801/19 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2 " x 2 1/2", esp. = 2,40mm (Líder ou similar)	cj	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	221,11	5.755,02	0,00	0,00	0,00	5.755,02	0,00
05.004.004	Vidro liso incolor 3mm - Rev 01, 10/2021	m2	1,82	0,00	0,00	0,00	1,82	146,85	5.306,64	0,00	0,00	0,00	5.306,64	0,00
05.004.005	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m - fornecimento	un	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	267,27	267,27	0,00	0,00	0,00	267,27	0,00
05.004.006	Revisão de esquadria de ferro	m2	5,06	0,00	0,00	0,00	5,06	844,61	7.601,49	0,00	0,00	0,00	7.601,49	0,00
05.004.007	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	2,34	0,00	0,00	0,00	2,34	139,28	704,76	0,00	0,00	0,00	704,76	0,00
01.005	COBERTURA								117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00
01.005.001	FUNDAÇÃO								17.479,96	0,01	16.151,89	16.151,89	1.328,08	92,40
05.005.001.001	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	449,02	4.690,48	0,01	4.690,49	4.690,49	0,00	100,00
05.005.001.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,87	0,00	1,87	1,87	0,00	2.395,42	211,04	0,00	211,04	211,04	0,00	100,00
05.005.002	ESTRUTURA								4.479,44	0,00	4.479,44	4.479,44	0,00	100,00
05.005.002.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,83	0,00	3,83	3,83	0,00	2.395,42	9.174,46	0,00	9.174,46	9.174,46	0,00	100,00
05.005.003	REVESTIMENTOS								2.286,94	0,00	2.286,94	2.286,94	0,00	100,00
05.005.003.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	61,23	0,00	61,23	61,23	0,00	5,80	355,13	0,00	355,13	355,13	0,00	100,00
05.005.003.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	61,23	0,00	61,23	61,23	0,00	31,55	1.931,81	0,00	1.931,81	1.931,81	0,00	100,00
05.005.004	PINTURA								1.328,08	0,00	0,00	0,00	1.328,08	0,00
05.005.004.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de texturatto colorido	m2	61,23	0,00	0,00	0,00	61,23	21,69	1.328,08	0,00	0,00	0,00	1.328,08	0,00
05.006	COBERTURA								41.241,42	0,00	40.102,94	40.102,94	1.138,48	97,24
05.006.001	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	57,95	5.795,00	0,00	5.795,00	5.795,00	0,00	100,00
05.006.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	55,56	10.417,50	0,00	10.417,50	10.417,50	0,00	100,00

Contratada: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº: 17/2022

B.M.Nº: 01

Período: 15/02/2023 a 02/03/2023

Data da medição: 02/03/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					Preço Unitário (R\$)	VALORES (R\$)					
			Previsto	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		Previsto	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	Saldo (%)
05.006.003	Monteprumo em madeira de lei, de alvenaria serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	104,93	16.369,08	0,00	16.369,08	16.369,08	0,00	100,00
05.006.004	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, tubulana ou similar	m2	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	48,84	7.521,36	0,00	7.521,36	7.521,36	0,00	100,00
05.006.005	Ferramentagem de cunha com telha cerâmica - Rev. 001	m	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	27,12	379,12	0,00	0,00	0,00	379,12	0,00
05.006.006	Extensão de telha de telha cerâmica	m	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	6,77	379,12	0,00	0,00	0,00	379,12	0,00
TOTAL DA MEDIÇÃO									39.417,35	0,00	0,00	0,00	39.417,35	0,00

ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Engº Civil

CREA: 271563679-2

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA


ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE B.M.
 FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
 Data da medição: 02/03/2023

APROVADO PARA PAGAMENTO


Data da medição: 02/03/2023

B.M.Nº: 01
Período: 15/02/2023 a 02/03/2023


ORDEM DE SERVIÇO - INICIO: 15/02/2023
Data da medição: 02/03/2023

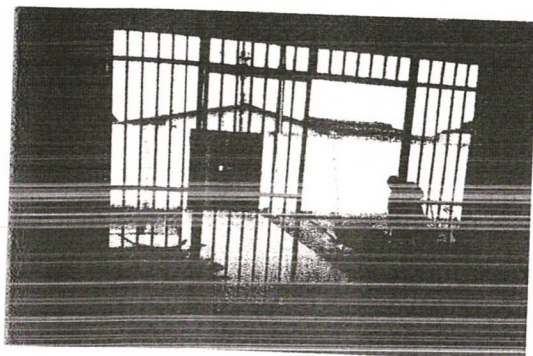

Fundação: Escavação de vaia para execução de pilar

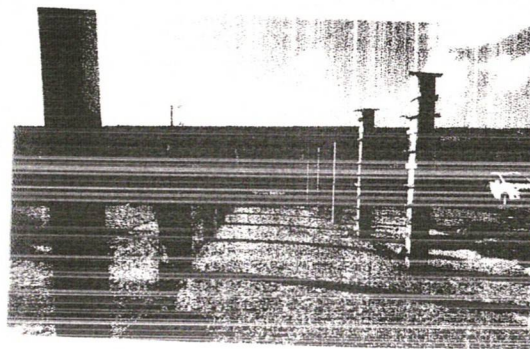

Execução de formas para pilares

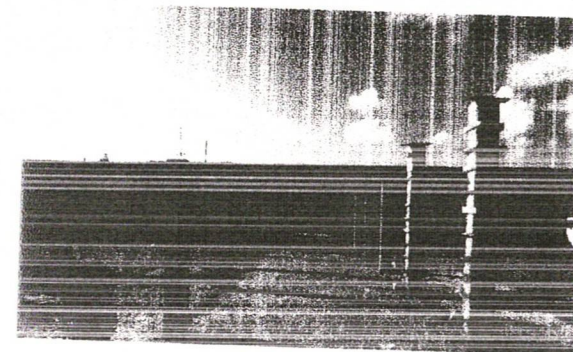

Execução de Pilares




Revisão de Cobertura



Revisão de Cobertura




Revisão de Cobertura


Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2




B.M.Nº: 01
Período: 15/02/2023 a 02/03/2023


ORDEM DE SERVIÇO - INÍCIO: 15/02/2023
Data da medição: 02/03/2023

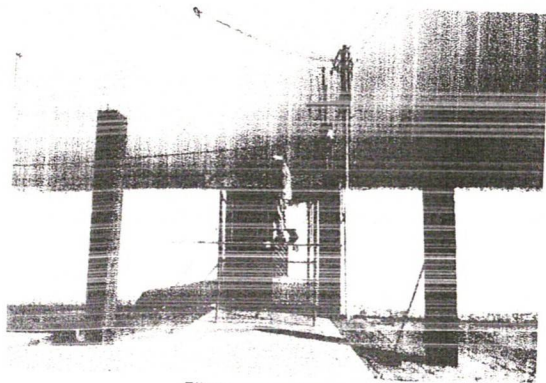


Pilares executados

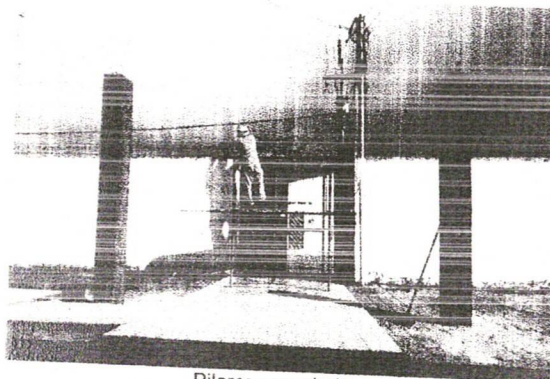


Pilares executados

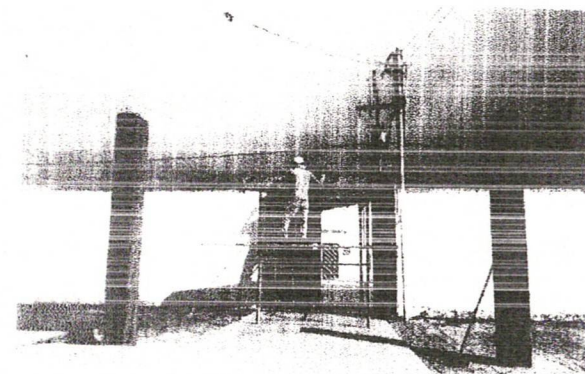


Pilares executados

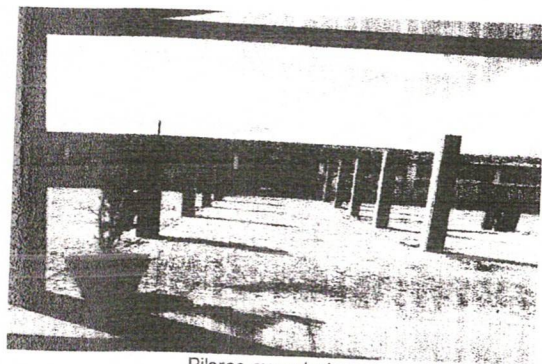

Pilares executados

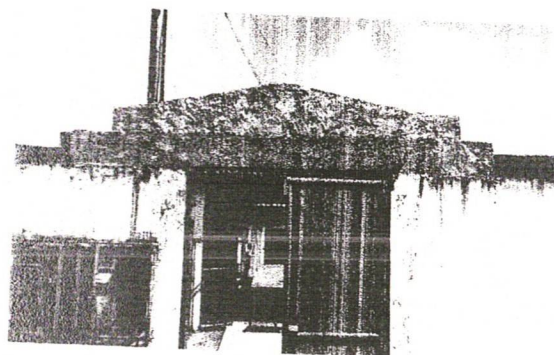

Desempena

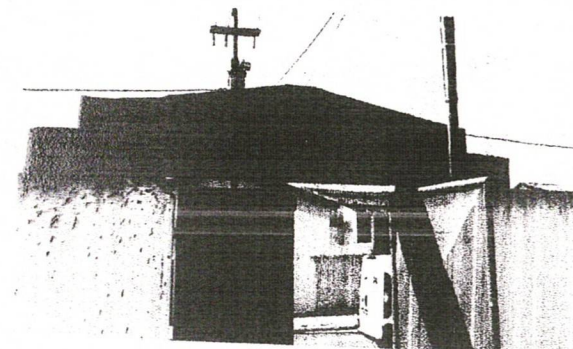

Desempena


Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE

Folha nº

Data: 15/03/2023

Endereço: MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO TRINDADE

CONTRATO Nº: 17/2022

Prazo Contratual: 12 meses

Tempo para Conclusão:

Prazo de Execução: 2 meses

Ordem de Serviço: 15/02/2023

Observações:



Tempo Bom



Tempo Chuvoso



Itens Prejudiciais



Paralisação

Anotações da Contratada:

Mobilização e Desmobilização

Anotações da Fiscalização:

Técnicos responsáveis (contratada):

ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS
Engº Civil:
CREA: 271563679-2

Fiscalização:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE

Folha nº

Data: 16/02/2023

Endereço: MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO TRINDADE

CONTRATO Nº: 17/2022

Prazo Contratual: 12 meses

Tempo para Conclusão:

Prazo de Execução: 2 meses

Ordem de Serviço: 15/02/2023

Observações:



Tempo Bom



Tempo Chuvoso



Itens Prejudiciais



Paralisação

Anotações da Contratada:

Chegada de materiais na obra

Anotações da Fiscalização:

Técnicos responsáveis (contratada):

ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS
Engº Civil:
CREA: 271563679-2

Fiscalização:



PROJECT ENGENHARIA LTDA

LIVRO DE OCORRÊNCIAS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE

Folha nº

Data: 17/02/2023

Endereço: MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE

J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO TRINDADE

CONTRATO Nº: 17/2022

Prazo Contratual: 12 meses

Tempo para Conclusão:

Prazo de Execução: 2 meses

Ordem de Serviço: 15/02/2023

Observações



Tempo Bom



Itens Prejudiciais

Tempo Chuoso

Paralisação

Anotações da Contratada

Locação de Pilares

Montagem de formas de madeira para execução de pilares de concreto armado

Anotações da Fiscalização

Técnicos responsáveis (contratada):

Fiscalização:

ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Engº Civil:

CREA: 271563679-2



PROJECT ENGENHARIA LTDA

LIVRO DE OCORRÊNCIAS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE

Folha nº

Data: 20/02/2023

Endereço: MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE

J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO TRINDADE

CONTRATO Nº: 17/2022

Prazo Contratual: 12 meses

Tempo para Conclusão:

Prazo de Execução: 2 meses

Ordem de Serviço: 15/02/2023

Observações



Tempo Bom



Itens Prejudiciais

Tempo Chuoso

Paralisação

Anotações da Contratada

Anotações da Fiscalização

Técnicos responsáveis (contratada):

Fiscalização:

ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Engº Civil:

CREA: 271563679-2



PROJECT ENGENHARIA LTDA

LIVRO DE OCORRENCIAS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE

Folha nº

Data: 21/02/2023

Endereço: MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE

J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO TRINDADE

CONTRATO Nº: 17/2022

Prazo Contratual: 12 meses

Tempo para Conclusão:

Prazo de Execução: 2 meses

Ordem de Serviço: 15/02/2023

Observações



Tempo Bom



Itens Prejudiciais



Tempo Chuvisco



Paralisação

Anotações da Contratada

FÉRIAS DE CARNAVAL

Anotações da Fiscalização

Técnicos responsáveis (contratada):

ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Engº Civil:

CREA: 271563679-2

Fiscalização:



PROJECT ENGENHARIA LTDA

LIVRO DE OCORRENCIAS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE

Folha nº

Data: 22/02/2023

Endereço: MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE

J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO TRINDADE

CONTRATO Nº: 17/2022

Prazo Contratual: 12 meses

Tempo para Conclusão:

Prazo de Execução: 2 meses

Ordem de Serviço: 15/02/2023

Observações



Tempo Bom



Itens Prejudiciais



Tempo Chuvisco



Paralisação

Anotações da Contratada

QUARTA FEIRA DE CINZAS, Prédio ocupado pela polícia militar, desmobilização das instalações militares. Impossibilitando a execução da obra.

Anotações da Fiscalização

Técnicos responsáveis (contratada):

ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Engº Civil:

CREA: 271563679-2

Fiscalização:

 LIVRO DE OCORRÊNCIAS	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE	
Folha nº _____	
Data: 23/02/2023	
Endereço: MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE	
J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda	
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO TRINDADE	
CONTRATO Nº: 17/2022	
Tempo para Conclusão: _____	
Ordem de Serviço: 15/02/2023	
Observações:	
☒ Tempo Bom	
☐ Tempo Chuvoso	
☐ Itens Prejudiciais	
☐ Paralisação	
Anotações da Contratada:	
Execução da fundação, sapatas dos pilares	
Aguardando definições da secretaria de obras a respeito do projeto de cobertura e definições do formato geométrico dos pilares.	
Execução da armação dos pilares	
Anotações da Fiscalização:	
Técnicos responsáveis (contratada):	
ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS Engº Civil: CREA: 271563679-2	
Fiscalização:	

 LIVRO DE OCORRÊNCIAS	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE	
Folha nº _____	
Data: 24/02/2023	
OBJETO: REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE	
Endereço: MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE	
J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA.	
ADITIVO: ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO TRINDADE	
CONTRATO Nº: 17/2022	
Tempo para Conclusão: _____	
Ordem de Serviço: 15/02/2023	
Observações:	
☐ Tempo Bom	
☒ Tempo Chuvoso	
☐ Itens Prejudiciais	
☐ Paralisação	
Anotações da Contratada:	
Continuidade da Execução da fundação, sapatas dos pilares	
Anotações da Fiscalização:	
Técnicos responsáveis (contratada):	
ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS Engº Civil: CREA: 271563679-2	
Fiscalização:	



PROJECT ENGENHARIA LTDA

LIVRO DE OCORRÊNCIAS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE

Folha nº

Data: 12/07/2022

Endereço: MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO TRINDADE

CONTRATO Nº: 17/2022

Prazo Contratual: 12 meses

Tempo para Conclusão:

Prazo de Execução: 2 meses

Ordem de Serviço: 15/02/2023

Observações



Tempo Bom



Itens Prejudiciais

Tempo Chuvoso

Paralisação

Anotações da Contratada

Continuação da Execução da fundação, sapatas dos pilares

Anotações da Fiscalização

Técnicos responsáveis (contratada):

Fiscalização:

ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Engº Civil:

CREA: 271563679-2



PROJECT ENGENHARIA LTDA

LIVRO DE OCORRÊNCIAS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE

Folha nº

Data: 28/02/2023

Endereço: MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE

J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO TRINDADE

CONTRATO Nº: 17/2022

Prazo Contratual: 12 meses

Tempo para Conclusão:

Prazo de Execução: 2 meses

Ordem de Serviço: 15/02/2023

Observações



Tempo Bom



Itens Prejudiciais

Tempo Chuvoso

Paralisação

Anotações da Contratada

Continuação da Execução da fundação, sapatas dos pilares

Anotações da Fiscalização

Técnicos responsáveis (contratada):

Fiscalização:

ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Engº Civil:

CREA: 271563679-2



PROJECT ENGENHARIA LTDA

LIVRO DE OCORRÊNCIAS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE

Folha nº

Data: 01/03/2023

Endereço: MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE

J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO TRINDADE

CONTRATO Nº: 17/2022

Prazo Contratual: 12 meses

Tempo para Conclusão:

Prazo de Execução: 2 meses

Ordem de Serviço: 15/02/2023

Observações



Tempo Bom

Tempo Chuvoso



Itens Prejudiciais

Paralisação

Anotações da Contratada

Revisão do telhado

Anotações da Fiscalização

Técnicos responsáveis (contratada):

ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Engº Civil:

CREA: 271563679-2

Fiscalização:



PROJECT ENGENHARIA LTDA

LIVRO DE OCORRÊNCIAS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE

Folha nº

Data: 02/03/2023

Endereço: MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE

J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO TRINDADE

CONTRATO Nº: 17/2022

Prazo Contratual: 12 meses

Tempo para Conclusão:

Prazo de Execução: 2 meses

Ordem de Serviço: 15/02/2023

Observações



Tempo Bom

Tempo Chuvoso



Itens Prejudiciais

Paralisação

Anotações da Contratada

Continuidade da Revisão do telhado

Anotações da Fiscalização

Técnicos responsáveis (contratada):

ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Engº Civil:

CREA: 271563679-2

Fiscalização:



LIVRO DE OCORRÊNCIAS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE

Folha nº

Data: 03/03/2023

Endereço: MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE

J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO TRINDADE

Prazo Contratual: 12 meses

CONTRATO Nº: 17/2022

Prazo de Execução: 2 meses

Tempo para Conclusão:

Ordem de Serviço: 15/02/2023

Observações:



Tempo Bom

Tempo Chuvoso



Itens Prejudiciais

Paralisação

Anotações da Contratada

Revisão do telhado e instalação elétrica

Anotações da Fiscalização

Técnicos responsáveis (contratada):

Fiscalização:

ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Engº Civil:

CREA: 271563679-2

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

C.M.C

Nome do Empreendedor
J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia

Endereço
LUAIS ALVES DE OLIVEIRA BISPO DO ROSÁRIO Nº 18

Complemento

Bairro
CENTRO

Cidade
Japaratuba

UF
SE

CNPJ
08.705.674/0001-68

Ramo Atividade

Data Início das Atividades

Observação

PARA LUIZ ALVES DO ROSÁRIO BISPO

Data Emissão

23/01/2023


Data Validade

31/12/2023

IMPORTANTE

Este documento é emitido em nome do Estado de Sergipe, sob o controle da Prefeitura Municipal de Japaratuba. Em caso de cancelamento, mudança de endereço, alteração do ramo de atividade, o empreendedor deverá apresentar a documentação necessária para a atualização da inscrição. O cancelamento da inscrição deverá ser solicitado pelo empreendedor, sob pena de aplicação de multa. A validade deste documento é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão. A autenticação deste documento pode ser verificada no endereço: <http://municipalonline.com.br/se/prefeitura/japaratuba>

CODIGO DE AUTENTICIDADE: 041D0DCE


Mirabel Xavier Santos
Coordenadora da Área de
Fiscalização e Tributação

segunda-feira, 23 de janeiro de 2023



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra
90.012.51342/70

Nome da obra
SERVIÇOS DE REFORMA ESCOLAS PREFEITURA DE PIRAMBU/SE - CONTRATO Nº 17/2022 - J & A PROJECT

Data do cadastramento
10/10/2022 18:48

Origem do cadastramento
e-CAC

ART
Nº SE20220280754

RRT

CIB

Cadastro Imobiliário

Data do início da obra
12/09/2022

CNAE
4120400 Construção de edifícios

Situação da obra

Situação
Ativa

Data
12/09/2022

Endereço

País
BRASIL

Município
PIRAMBU

UF
SE

CEP
49190000

Bairro
CENTRO

Logradouro
OUTROS Praça Nossa Senhora de Lourdes

Número
16

Responsável

Nome
J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ
05.325.864/0001-05

Vínculo
Dono da obra

Data de início da responsabilidade
12/09/2022

Data de término da responsabilidade

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Comercial salas e lojas	Alvenaria	181,04 m²
Reforma	Comercial salas e lojas	Alvenaria	181,04 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra
181,04 m²



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20220280754

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2715636792

Registro: 2715636792SE

Empresa contratada: **J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA**

Registro: 6000003307-SE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE PIRAMBU ESTADO DE SERGIPE**

PRAÇA Praça dos Esportes

Complemento:

Cidade: **PIRAMBU**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

CPF/CNPJ: **13.095.039/0001-81**

Nº: **75**

CEP: **49190000**

Contrato: **28/2021**

Valor: **R\$ 211.419,48**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Calamidade Pública**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA Praça Nossa Senhora de Lurdes

Complemento:

Cidade: **PIRAMBU**

Data de início: **04/04/2022**

Previsão de término: **06/06/2022**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

Nº: **16**

CEP: **49190000**

Coordenadas Geográficas: **10°54'22.54"S, 37°2'13.43"W**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE PIRAMBU ESTADO DE SERGIPE**

CPF/CNPJ: **13.095.039/0001-81**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

1.720,00

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, CONFORME CONTRATO 17/2022, PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE. DEVIDO A MUDANÇA DO SISTEMA DO CREA-SE QUE EXCLUÍO OS CÓDIGOS DE DIVERSOS SERVIÇOS COMO POR EX.: PISOS EM CONCRETO (ALTA RESISTÊNCIA, CERÂMICOS, ETC.)... IMPOSSIBILITANDO ADICIONAR DE FORMA CLARA OS SERVIÇOS CONTRATADOS CONSTANTES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS. NO ENTANTO PARA A CONFERÊNCIA DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS DOS MESMOS, DEVE-SE CONSULTAR A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CURVA ABC DE SERVIÇOS. O QUANTITATIVO INFORMADO NA ATIVIDADE (TOS 1.1.2.1) ALVENARIA, É REFERENTE À ÁREA CONSTRUÍDA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

ABENC/SE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS DE SERGIPE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 995.239.735-68

Local

data

MUNICÍPIO DE PIRAMBU ESTADO DE SERGIPE - CNPJ: 13.095.039/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94**

Registrada em: **29/04/2022**

Valor pago: **R\$ 233,94**

Nosso Número: **8202433379**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2Axd
Impresso em: 02/05/2022 às 12:58:22 por: ip: 131.72.69.119

www.crea-se.org.br

Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br

Fax: XXXX-XXXX



CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Sergipe





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 455727/2022

Emissão: 05/04/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: DA2b9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 05.325.864/0001-05

Registro: 0000003307

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 10/04/2019

Faixa: 2

Objetivo Social Pleno: CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DE QUALQUER TIPO, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS OLÍMPICAS E OUTRAS CONSTRUÇÕES SIMILARES; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; GESTÃO DE ATERROS SANITÁRIOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DO RESÍDUO AMBIENTAL E ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E RODAGENS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; ATIVIDADES DE CONSULTORIA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA; OS SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTE DE TELECOMUNICAÇÕES - SRTI; ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES MOVEIS, PARA PROMOVA A TRANSMISSÃO DE VOZ, DADOS E IMAGEM; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO E DE DIAGRAMAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO DOMÉSTICO OU INDUSTRIAL E DE ÁGUAS PLUVIAIS POR MEIO DE REDES DE COLETORES, TANQUES E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, RODOVIAS, FERROVIAS E PORTOS; USINAS DE COMPOSTAGEM; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL (NÃO ESPECIALIZADA) DE PRÉDIOS DE QUALQUER TIPO: RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, FÁBRICAS, ARMAZÉNS, HOSPITAIS, PRÉDIOS PÚBLICOS E OUTROS PRÉDIOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA CORNO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, LIMPEZA DE RUAS; CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AUTO - ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NÃO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA: AS ATIVIDADES DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL SÃO: CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DE QUALQUER TIPO, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS OLÍMPICAS E OUTRAS CONSTRUÇÕES SIMILARES; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; GESTÃO DE ATERROS SANITÁRIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL E ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E URBANISMO; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E RODAGENS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA CIVIL; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES EM BAIXA TENSÃO; COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO DOMÉSTICO OU INDUSTRIAL E DE ÁGUAS PLUVIAIS POR MEIO DE REDES DE COLETORES, TANQUES E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODESIA; USINAS DE COMPOSTAGEM; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; LIMPEZA DE RUAS; CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AUTO - ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NÃO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS.

Endereço Matriz: RUA A, 75, LOT. ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO, CENTRO, JAPARATUBA, SE, 49960000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 26/05/2003

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000002659EMSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais com

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DA2b9
 Impresso em: 05/04/2022 às 21:06:35 por: adapt, ip: 131.72.69.127





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 455727/2022

Emissão: 05/04/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: DA2b9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

quadro técnico.

- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Registro: 2715638792

CPF: 995.239.735-68

Data Início: 10/04/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Nº 456594/2022

Emissão: 03/05/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 3z3w7

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Registro: 2715636792

CPF: 995.239.735-68

Endereço: RUA RUA (A) CONJUNTO ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO, 75, -, CENTRO, JAPARATUBA, SE, 49960000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 29/07/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE TIRADENTES

Data de Formação: 21/07/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000003307

CNPJ: 05.325.864/0001-05

Data Início: 10/04/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 21.24.54
2206302206

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: J PROJECT ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 2206-3 CONTA: 7.290-7
EFETUADO POR: JOSEANE TORRES MELO

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000007-4 62000385230-2
48071623046-5 82629041393-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23046.8262904-1
Valor Total 762,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB:
C.6FF.190.B3F.FC9.1D3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.03.37
2206302206

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: J PROJECT ENGENHARIA LTDA

AGENCIA: 2206-3 CONTA: 7.290-7

EFETUADO POR: JOSEANE TORRES MELO

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000001-1 31620180230-4
30967418380-3 53258640001-0

Data do pagamento 09/03/2023

CNPJ/CEI/CPF 05325864/0001-05

COMPETENCIA 02/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 150

VENCIMENTO 09/03/2023

VALOR DEPOSITO 131,62

Valor Total 131,62

=====

DOCUMENTO: 030901

AUTENTICACAO SISBB:

C.C9B.CD1.FC4.F3D.E6A



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
05.325.864/0001-05

Razão Social
J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23046.8262904-1

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113642306

Valor Total do Documento

762,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	112,98			112,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	603,74			603,74
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/ARQSENT ESPECIAL	45,28			45,28
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	762,00			762,00

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

16/02/2023 16:10:07

85820000007 4 62000385230 2 48071623046 5 82629041393 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000007 4 62000385230 2 48071623046 5 82629041393 6

CNPJ: 05.325.864/0001-05
Número: 07.16.23046.8262904-1
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 762,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 21.24.54
2206302206

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: J PROJECT ENGENHARIA LTDA

AGENCIA: 2206-3 CONTA: 7.290-7

EFETUADO POR: JOSEANE TORRES MELO

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85820000007-4 62000385230-2
46071623046-5 82629041393-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 17/02/2023

Numero do Documento 07.16.23046.8262904-1

Valor Total 762,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 021701

AUTENTICACAO SISBB:

C.8FF.190.B3F.FC9.1D3

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000016 247401802301 407675200809 532586400010

EMPRESA: J A PROJECT ENGENHARIA LTDA
COMP: 03/2023 COD REC:155 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 05.325.864/0001-05
TOMADOR/OBRA: J A PROJECT ENGENHARIA LTDA FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 05.325.864/0001-05

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
PEDRO DOS SANTOS SILVA		128.00526.76-0	01/02/2021	01				07155
1.559,35	0,00	0,00	122,16			124,74		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.559,35 0,00 0,00 122,16 124,74 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000016 247401802301 407675200809 532586400010

EMPRESA: J A PROJECT ENGENHARIA LTDA
COMP: 03/2023 COD REC:155 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: J A PROJECT ENGENHARIA LTDA N° DE CONTROLE: JtrR85vE69T0000-0
LOGRADOURO: RUA A 75 LOTEAMENTO ARTHUR BISPO DO ROSARIO BAIRRO: CENTRO
CIDADE: JAPARATINGA UF: SE CEP: 49960-000

N° ARQUIVO: JhWTFzTON270000-5
INSCRIÇÃO: 05.325.864/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 05.325.864/0001-05

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	1.559,35	0,00	1.559,35	0,00
TOTAIS:	1	1.559,35	0,00	1.559,35	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: J A PROJECT ENGENHARIA LTDA
COMP: 03/2023 COD REC:155 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: J A PROJECT ENGENHARIA LTDA

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

Nº DE CONTROLE: JrtR85vE69T0000-0

Nº ARQUIVO: JhWTFzTON270000-5

INSCRIÇÃO: 05.325.864/0001-05

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO: 05.325.864/0001-05

LOGRADOURO: RUA A 75 LOTEAMENTO ARTHUR BISPO DO ROSARIO

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE

4120400

CIDADE: JAPARATUBA

UF: SE

CEP: 49960-000

TELEFONE: 0079 3214 3550

CNAE:

4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

62,34

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

122,16

SALÁRIO FAMÍLIA:

59,82

RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00

13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00

COM PRODUÇÃO PJ:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00

COM PRODUÇÃO PF:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00

VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0,00

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

0,00

20 ANOS:

0,00

25 ANOS:

0,00

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

856800000016 247401802301 407675200809 532586400010

EMPRESA: J A PROJECT ENGENHARIA LTDA
COMP: 03/2023 COD REC:155 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EJ1JVWanPU10000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: JhWTFzT0N270000-5
INSCRIÇÃO: 05.325.864/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA A 75 LOTEAMENTO ARTHUR BISPO DO ROSARIO
CIDADE: JAPARATUBA

UF: SE CEP: 49960-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	1.559,35	0,00	1.559,35	0,00
TOTAIS:	1	1.559,35	0,00	1.559,35	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000016 247401802301 407675200809 532586400010

EMPRESA: J A PROJECT ENGENHARIA LTDA
COMP: 03/2023 COD REC:155 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EJ1JVWanPU10000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: JhWTFzTON270000-5
INSCRIÇÃO: 05.325.864/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA A 75 LOTEAMENTO ARTHUR BISPO DO ROSARIO
CIDADE: JAPARATUBA UF: SE CEP: 49960-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREFONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 1.559,35
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
124,74	0,00	0,00	0,00	124,74

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: J A PROJECT ENGENHARIA LTDA
COMP: 03/2023 COD REC:155 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EJ1JVWAnPU10000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: JhWTFzTON270000-5
INSCRIÇÃO: 05.325.864/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA A 75 LOTEAMENTO ARTHUR BISPO DO ROSARIO
CIDADE: JAPARATUBA UF: SE

CEP: 49960-000

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0079 3214 3550

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	62,34	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	122,16
SALÁRIO FAMÍLIA:	59,82	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800000016 247401802301 407675200809 532586400010

EMPRESA: J A PROJECT ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 05.325.864/0001-05

Nº ARQUIVO: JhWTFzTON270000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES:

SIMPLES: 2

ALIQ RAT: 0,0

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 0,00

Nº CONTROLE: EJ1JVWAnPU10000-0

COD REC: 155

COMP: 03/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13º SALÁRIO	1.559,35
REM BASE CALC 13º SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	122,16
VAL DEVIDO PREV SOC	62,34
 TOTAL TRABALHADORES	 1

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	1.559,35
REM 13º SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	124,74
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAL A RECOLHER

124,74

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800000016 247401802301 407675200809 532586400010

EMPRESA: J A PROJECT ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 05.325.864/0001-05

Nº ARQUIVO: JhWTFzTON270000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES:

SIMPLES: 2

ALIQ RAT: 0,0

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 0,00

Nº CONTROLE: EJ1JVwAnPU10000-0

COD REC: 155 COMP: 03/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	1.559,35	REM SEM 13º SALÁRIO	1.559,35
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	122,16	DEPÓSITO	124,74
VAL DEVIDO PREV SOC	62,34	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1
		TOTAL A RECOLHER	124,74



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/03/2023 - 10:22:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME J A PROJECT ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0079) 32143550
03-PPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 1.559,35	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.325.864/0001-05	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 124,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 124,74
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858800000016 247401802301 407675200809 532586400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/03/2023 - 10:22:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME J A PROJECT ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0079) 32143550
03-PPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 1.559,35	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.325.864/0001-05	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 124,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 124,74
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858800000016 247401802301 407675200809 532586400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.46.30
2206302206

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: J PROJECT ENGENHARIA LTDA

AGENCIA: 2206-3 CONTA: 7.290-7

EFETUADO POR: JOSEANE TORRES MELO

=====
Convenio FCTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barreiras 858800000001-6 24740180230-1
40767520080-9 53258640001-0

Data do pagamento 21/03/2023

CNPJ/CEI/CPF 05325864/0001-05

COMPETENCIA 03/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 155

VENCIMENTO 07/04/2023

VALOR DEPOSITO 124,74

Valor Total 124,74
=====

DOCUMENTO: 032101

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
05.325.864/0001-05

Razão Social
J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23046.8262904-1

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113642306

Valor Total do Documento

762,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	112,98			112,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	603,74			603,74
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	45,28			45,28
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	762,00			762,00

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

15/02/2023 15:10:07

85820000007 4 62000385230 2 48071623046 5 82629041393 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000007 4

62000385230 2

48071623046 5

82629041393 6

CNPJ: 05.325.864/0001-05

Número: 07.16.23046.8262904-1

Pagar até: 17/02/2023

Valor: 762,00

Pague com o PIX





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.325.864/0001-05

Certidão nº: 360652/2023

Expedição: 04/01/2023, às 13:07:03

Validade: 03/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.325.864/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 91500/2023

Identificação do Contribuinte: 05.325.864/0001-05
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **05.325.864/0001-05** está regular com os recolhimentos de ICMS, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **05.325.864/0001-05** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

Declaração emitida em **06/03/2023 07:21:03**, válida até **05/04/2023** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 6 de Março de 2023

Autenticação: 2023030620236QX

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 91497 / 2023

Identificação do Contribuinte: 05.325.864/0001-05

Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **05.325.864/0001-05** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **05.325.864/0001-05** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **06/03/2023**, válida até **05/04/2023** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 2023030627WEIJ



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.325.864/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:39:19 do dia 21/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/06/2023.

Código de controle da certidão: **F9DC.0679.859B.BB14**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Japaratuba

Certidão Nº
2272023

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

C.M.C
0533

Em cumprimento à solicitação do requerente, com as características acima e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito, que mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte.

CONTRIBUINTE

Código	Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ
3461	J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA	05.325.864/0001-05
Endereço	Complemento	
LOT RUA A LOT ARTHUR BISPO DO ROSARIO Nº 75		
Bairro	Cidade	UF
CENTRO	Japaratuba	SE

Data Emissão

07/03/2023

Data Validade

06/05/2023

IMPORTANTE

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<http://municipioonline.com.br/se/prefeitura/japaratuba>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: A22AE800

terça-feira, 7 de março de 2023

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Japaratuba

Certidão Nº
2272023

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

C.M.C
0533

Em cumprimento à solicitação do requerente, com as características acima e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito, que mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte.

CONTRIBUINTE

Código	Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ
3461	J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA	05.325.864/0001-05
Endereço	Complemento	
LOT RUA A LOT ARTHUR BISPO DO ROSARIO Nº 75		
Bairro	Cidade	UF
CENTRO	Japaratuba	SE

Data Emissão

07/03/2023

Data Validade

06/05/2023

IMPORTANTE

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<http://municipioonline.com.br/se/prefeitura/japaratuba>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: A22AE800

terça-feira, 7 de março de 2023

**CAIXA**

Atividade, Meio Ambiente

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 05.325.864/0001-05
Razão Social: J A PROJECT E ENGENHARIA LTDA
Endereço: R A 75 LOT ARTHUR B DO ROS / CENTRO / JAPARATUBA / SE / 49960-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/02/2023 a 24/03/2023

Certificação Número: 2023022301410646660502

Informação obtida em 06/03/2023 07:24:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
