
20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:01
220602206 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PF MN PIRAMBU FDO ESP PEA
AGENCIA: 2206-3 CONTA: 136.072-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	552.206.000.110.000
VALOR TOTAL	153.946,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS MARTINS ROCHA - ME
AGENCIA: 2206-3 CONTA: 110.000-9
NR. DOCUMENTO 552.206.000.136.072
=====

NR. AUTENTICACAO	E.139.AF9.E13.7BA.87E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.

PAGO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PF MN PIRAMBU FDO ESP PEA
Agência 2206-3
Conta corrente 136072-8

Creditado

Nome MARCOS MARTINS ROCHA - ME
Agência 2206-3
Conta corrente 110000-9
Valor 153.946,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB826408 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO	20/06/2024 12:04:18
	JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA	20/06/2024 12:14:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.



Entre contas correntes

G3322012002427791
20/06/2024 12:04:16

Debitado

Nome	PF MN PIRAMBU FDO ESP PEA
Agência	2206-3
Conta corrente	136072-8

Creditado

Nome	MARCOS MARTINS ROCHA - ME
Agência	2206-3
Conta corrente	110000-9
Valor	153.946,64
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 335636188.

Usuário: JB826408 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

JUNHO/2024

Nota de Liquidação: 0619131

Fonte: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Data: 19/06/2024

FORNECEDOR

Nome:

MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF:

15190486000145

Endereço:

RUA GETULIO VARGAS, 34

Compl:

Bairro:

CENTRO

Cidade:

Japaratuba

UF:

SE

E-mail:

1@

Telefone:

(79)3213-0564

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

001 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

22063

Operação:

Conta:

1100009

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:

0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Função:

15 Urbanismo

SubFunção:

451 Infraestrutura Urbana

Programa:

0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Ação:

1055 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

Natureza Despesa:

44905100 Obras e Instalações

SubElemento:

44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo

Fonte:

17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Marcador:

17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Centro Custo:

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0402002	02/04/2024	26.674,94	26.674,94	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

N.E 0201016 CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023 E CONTRATO Nº 22/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

PARTE DA NOTA FISCAL 021/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023 E CONTRATO Nº 22/2024.

Documento	Valor
Nota Fiscal (21 / Série: A / UF: SE / Emissão: 10/06/2024)	26.674,94

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	26.674,94

VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Retido:

0,00

Total Liquido:

26.674,94

Data: 19/06/2024

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

CARLAS ANDREA DOS SANTOS NUNES SOUZA

ENCARREGADO DE EMPENHO Mat.0001426



Nº Processo
0000526

Nº Fila
247

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

TERMO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 15.190.486/0001-45

Nome: MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA GETULIO VARGAS

Bairro: CENTRO

E-mail: 1@

Compl:

Cidade: Japaratuba

UF: SE

Telefone: (79)3213-0564

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Conta:

EMPENHO	EMIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	FONTE
0402002	02/04/2024	1055.44905100-17200000	Global	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FED - Lei 9.479/1997

HISTÓRICO DO EMPENHO

N.E 0201016 CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023 E CONTRATO Nº 22/2024.

Documentação	
Nota Fiscal	21
Valor	R\$ 26.674,94
Emissão	10/06/2024
Horário de Entrega	13/06/2024 10:11:02

Para acompanhar o andamento do seu processo na fila pública, acesse o link abaixo:

<http://www.municipoonline.com.br/se/prefeitura/pirambu/fornecedor/filapagamento>

Cadastrado por: Santiago Santos Gois



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento Tributário - Praça 16 de Outubro, Nº 135, Centro - Carmópolis/SE, CEP: 49.7490-000 Telefone: (79) 3277-1210

Nota: 2024000

00000021

Código Verificação
AINM-HEYI



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

10/06/2024 05:59:46

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

06/2024

Exigibilidade do ISS

Exigível em Pirambu

Município de Prestação do Serviço

Pirambu - SE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

Nome Fantasia

MARTINS ENGENHARIA

Email

marcos@martinslocserv.com.br

CPF/CNPJ

15.190.486/0001-45

Inscrição Municipal

200052591

Inscrição Estadual

271630531

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 99988-9649

Endereço

RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS, SN, Santa Barbara - CEP: 49740-000 - Carmópolis - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

prefeitura municipal pirambu

CPF/CNPJ

13.095.039/0001-81

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3276-1203

E-mail

pirambu@pirambu.com.br

Endereço

(Localidade), 16, praça nossa senhora de lurdas - Não informado - CEP: 49190-000 - Pirambu - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4399103

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO VALOR TOTAL DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOC. NO CONJ. REINALDO MOURA E CONJ. LORIVAL BOMFIM - PIRAMBU/SE. CONTRATO MUNICIPAL Nº 04/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023.

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2024 A 10/06/2024.

PRAÇA LOURIVAL BOMFIM- R\$ 31.033,90
PRAÇA LOURIVAL BOMFIM MENOR - R\$ 18.024,30
PRAÇA REINALDO MOURA - R\$ 110.471,99

Material 60%

Mão de Obra 40%

DADOS BANCARIOS:

BANCO DO BRASIL

AG: 2206-3

CONTA CORRENTE: 110.000-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
DECLARO QUE

☒ Os serviços foram prestados
☐ Os produtos foram entregues
☐ A obra foi executada

Data: 19/06/2024

Assinatura do Responsável
Carimbo da Prefeitura Municipal de Pirambu

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
1.036,95	4.785,91	0,00	2.392,95	1.595,30	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
159.530,19	95.718,10	0,00	63.812,09	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
3.190,60	*****	0,00	149.719,08	159.530,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 21.456,81 Federal e R\$ 7.976,51 Municipal. Fonte: IBPT [691A69]

Substitui nota 2024000000000019 de 07/06/2024

Visualizado em: 10/06/2024 05:59:45

Para validação desta NFS-e acesse: <http://carmopolisse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

RECEBIDO

Em 12/06/24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
CONTROLADORIA MUNICIPAL

CHECK LIST

PARA PAGAMENTO DE OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA

Processo nº: 245, 246, 247, 248, 249, 250 Vigência: 22/01/24 A 22/01/25
Empresa Contratada: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA
Resumo do objeto: REFORMA DE PRAÇAS
Fonte de Recurso: 17200000
Medição: 3ª – 01/04/24 A 10/06/24

ITENS	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Nota Fiscal contendo Nº do empenho/Ano, Modalidade – Número/Ano da Licitação e Nº do Contrato/Ano.	X		DATA 10/06/24
ORDEM DE SERVIÇOS		X	
Planilha de medição da obra, assinado pelo Engenheiro responsável e fiscal	X		
REGISTRO FOTOGRÁFICO	X		
RELATÓRIO DIÁRIO DA OBRA	X		
CERTIDÃO DO CREA - PESSOA FÍSICA		X	
CERTIDÃO DO CREA - PESSOA JURÍDICA		X	ok
Cópia do comprovante de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART DE EXECUÇÃO	X		
Cópia do comprovante de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART DE FISCALIZAÇÃO		X	OK
Certidão de Regularidade do FGTS	X		24/05 A 22/06/2024
Certidão Negativa de Tributos Municipais	X		06/06 A 05/08/2024
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais e Dívida Ativa da União	X		20/05 A 16/11/2024
Certidão Negativa de Tributos Estaduais	X		03/06 A 03/07/2024
Certidão de Regularidade Trabalhista	X		22/02 A 20/08/2024
Extrato de Optante ou de Não Optante pelo Simples	X		
Cadastro Nacional de Obras - CNO	X		
Recolhimento do INSS relativo aos funcionários (Guia da Previdência Social – (GPS).	X		
Recolhimento do FGTS relativo aos funcionários (Guia de Recolhimento do FGTS – (GRF).	X		

VALOR DO CONTRATO + ADITIVO	MEDIÇÃO	VALOR	SALDO
370.821,53	1ª		
	2ª		
	3ª	159.530,19	32.468,15

Katia Sirlene Cardoso dos Santos
Secretária de Controle Interno
Decreto: 05/2021


Pirambu, 13/06/2024.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BONFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBUISE.										BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 22/2023	
MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA										B.M.Nº: 03				ORDEM DE SERVIÇO Nº	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU										Período: 01/04/2024 A 10/06/2024				Data da medição: 10/08/2024	
03 MESES+ 03 MESES(ADITIVO)															
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades				Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)			% Medido				
			Contratada+ Aditivo	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada Anterior		Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir					
01	PRAÇA MAIOR LOURIVAL BONFIM														
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES														
01.01.001	Placa de obra em laje com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metal 20 x 20cm e escoramento, Instalação - Rev.02 - 09/2021	un	1,00	1,00	0,00	0,00	488,63	101.800,42	61.974,80	31.033,90	93.008,70	8.791,72	91,36		
01.01.002	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	368,20	368,20	0,00	368,20	11,56	6.921,40	6.921,40	0,00	488,63	0,00	100,00		
01.01.003	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	368,20	368,20	0,00	368,20	0,77	283,51	283,51	0,00	4.256,39	0,00	100,00		
01.01.004	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev.01	un	1,00	1,00	0,00	0,00	1.892,86	1.892,86	1.892,86	0,00	283,51	0,00	100,00		
01.02	PAVIMENTAÇÃO														
01.02.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	368,20	184,10	184,10	368,20	28,05	42.355,87	33.585,10	5.164,01	38.729,10	3.626,77	91,44		
01.02.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	368,20	368,20	0,00	368,20	50,16	18.468,91	18.468,91	0,00	18.468,91	0,00	100,00		
01.02.003	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	368,20	0,00	0,00	0,00	9,85	3.626,77	0,00	0,00	0,00	3.626,77	0,00		
01.02.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00	1,00	0,00	0,00	451,03	451,03	451,03	0,00	451,03	0,00	100,00		
01.02.005	Colchão de areia	m3	73,60	73,60	0,00	73,60	128,82	9.481,15	9.481,15	0,00	9.481,15	0,00	100,00		
01.03	PAISAGISMO														
01.03.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	40,15	40,15	0,00	40,15	22,77	914,22	914,22	0,00	914,22	0,00	100,00		
01.04	DIVERSOS														
01.04.001	Construção em aço inox, esquadro, d=1 1/2"	m	8,74	0,00	0,00	0,00	87,12	761,43	0,00	0,00	15.152,49	1.934,16	88,68		
01.04.002	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev.01	un	1,00	1,00	0,00	0,00	2.565,57	2.565,57	2.565,57	0,00	0,00	0,00	100,00		
01.04.003	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. g=1 1/2". Sergipark ou similar	Un	1,00	1,00	0,00	0,00	868,08	868,08	868,08	0,00	868,08	0,00	100,00		
01.04.004	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	1,00	1,00	0,00	0,00	1.112,40	1.112,40	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00	100,00		
01.04.005	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. g=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar	Un	1,00	1,00	0,00	0,00	1.112,40	1.112,40	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00	100,00		
01.04.006	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem enosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	23,13	23,13	0,00	23,13	212,40	4.912,81	4.912,81	0,00	4.912,81	0,00	100,00		
01.04.007	Fornecimento de Luminária 04 pétales em Led, iluminação pública, 180w, 4000K, 220v, e suporte em tubo aço galv. com Anteparo, da Ilumalco, mod LPL Ares ou similar	un	1,00	1,00	0,00	0,00	4.581,23	4.581,23	4.581,23	0,00	4.581,23	0,00	100,00		
01.04.008	Lixeiras em eucalipto perfurado e autoclavado 0,45m x 0,45m x 0,53m	un	3,00	0,00	0,00	0,00	390,91	1.172,73	0,00	0,00	0,00	1.172,73	0,00		
01.05	QUIOSQUE														
01.05.001	Concreto Armado fck=21 (MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,65	0,00	0,65	0,65	2.638,44	1.714,99	0,00	1.714,99	1.714,99	0,00	100,00		
01.05.002	Pilar e vigas de madeira, seção 10x10cm a 20x20cm, em massaranduba, angêlo ou madeira de lei	m3	0,69	0,00	0,69	0,69	4.144,93	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	100,00		
01.05.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	16,96	0,00	16,96	16,96	17,79	301,72	0,00	301,72	301,72	0,00	100,00		

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

Engenheiro Civil
CREA-SE 27179662-2

Obra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBUÍSE.										BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 22/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº		MARTINS Locação e Serviços	
Contratada: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA										B.M.Nº: 03		Período: 01/04/2024 A 10/08/2024				Data da medição: 10/08/2024	
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU										03 MESES+ 03 MESES(ADITIVO)							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades				Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)				% Medido					
			Contratada+ Aditivo	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Saldo a medir	Contratado + Contrato	Acumulado Anterior	Do Período		Acumulado até o Período	Saldo a medir			
01.05.004	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 6m a 8 m	un	1,00	0,00	1,00	1,00	1.337,27	1.337,27	0,00	1.337,27	1.337,27	0,00	100,00				
01.05.005	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	16,00	0,00	16,00	16,00	53,69	859,04	0,00	859,04	859,04	0,00	100,00				
01.05.006	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusiva peças principais	m2	25,00	0,00	25,00	25,00	112,13	2.803,25	0,00	2.803,25	2.803,25	0,00	100,00				
01.05.007	Telhamento com tela cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabalanha ou similar - Rev.02	m2	25,00	0,00	25,00	25,00	60,77	1.519,25	0,00	1.519,25	1.519,25	0,00	100,00				
01.05.008	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw.- Rev.01	un	1,00	0,00	1,00	1,00	2.119,81	2.119,81	0,00	2.119,81	2.119,81	0,00	100,00				
01.05.009	Eletróduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	25,00	0,00	25,00	25,00	15,10	377,50	0,00	377,50	377,50	0,00	100,00				
01.05.010	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/750v / 70°C	m	130,00	0,00	130,00	130,00	12,46	1.619,80	0,00	1.619,80	1.619,80	0,00	100,00				
01.05.011	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusão disjuntores	un	1,00	0,00	1,00	1,00	125,43	125,43	0,00	125,43	125,43	0,00	0,00				
01.05.012	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5kA, ref.: Siemens 5.SX1 ou similar	un	1,00	0,00	1,00	1,00	20,79	20,79	0,00	20,79	20,79	0,00	0,00				
01.05.013	Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto	pt	2,00	0,00	2,00	2,00	69,78	139,56	0,00	139,56	139,56	0,00	0,00				
01.05.014	Ponto de interruptor 01 seção simples c/placa, com canalizata plástica c/diâmetro 20x10mm	pt	1,00	0,00	1,00	1,00	288,86	288,86	0,00	288,86	288,86	0,00	0,00				
01.05.015	Luminária fluorescente tubular 2 x 20 w / 127 v, completa	un	2,00	0,00	2,00	2,00	160,59	321,18	0,00	321,18	321,18	0,00	0,00				
01.05.016	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, 2 bancos em concreto armado (semi circular), com pintura acrílica.	un	1,00	0,00	1,00	1,00	1.291,52	1.291,52	0,00	1.291,52	1.291,52	0,00	0,00				
01.06	CANTEIRO																
01.06.001	Melo-flo de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	100,45	100,45	0,00	100,45	32,87	3.301,79	3.301,79	0,00	3.301,79	466,09	100,00				
01.06.002	Pintura de melo flo (calçadão)	m	100,45	0,00	0,00	0,00	4,64	466,09	0,00	466,09	466,09	0,00	0,00				
01.07	SERVIÇOS FINAIS																
01.07.001	Marco Inaugural - Rev. 01	un	1,00	0,00	1,00	1,00	677,66	677,66	0,00	677,66	677,66	307,16	100,00				
01.07.002	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	m2	0,35	0,00	0,00	0,00	877,61	307,16	0,00	307,16	307,16	0,00	0,00				
01.08	ADITIVO																
01.08.001	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento	Un	1,00	0,00	1,00	1,00	2.107,58	2.107,58	0,00	2.107,58	2.107,58	0,00	0,00				
01.08.002	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,8 m de solo (não inclui fornecimento), at. 11/2019	un	1,00	0,00	1,00	1,00	1.059,02	1.059,02	0,00	1.059,02	1.059,02	0,00	100,00				
01.08.003	Caixa pré moldada em concreto c/ampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energia	un	1,00	0,00	1,00	1,00	18,07	18,07	0,00	18,07	18,07	0,00	100,00				
01.08.004	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	3,00	0,00	3,00	3,00	149,34	448,02	0,00	448,02	448,02	0,00	100,00				
01.08.005	Eletróduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	36,00	0,00	36,00	36,00	16,15	581,40	0,00	581,40	581,40	0,00	100,00				
01.08.006	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusão disjuntores	un	1,00	0,00	1,00	1,00	133,99	133,99	0,00	133,99	133,99	0,00	0,00				
01.08.007	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev.01	m2	45,90	0,00	45,90	45,90	24,17	1.109,40	0,00	1.109,40	1.109,40	0,00	100,00				
01.08.008	Demolição de melo	m	45,90	0,00	45,90	45,90	9,28	425,95	0,00	425,95	425,95	0,00	100,00				


 Dinesh Kumar
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 271797631-2

Martins Engenharia
 Dinesh Kumar
 Engenheiro Civil
 CREA: 270097088-8

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTA MUNICÍPIO DE PIRAMBUISE.										BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 22/2023		ORDEN DE SERVIÇO Nº		Data da medição: 10/08/2024									
MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA										B.M.Nº: 03				Período: 01/04/2024 À 10/08/2024													
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU										Preço Unit. (R\$)				Contratado + Contrato		Acumulado Anterior		Do Período		Acumulado até o Período		Saldo a medir		% Medido			
03 MESES+ 03 MESES(ADITIVO)										Quantidades				Und		Contratada+ Aditivo		Acumulada Anterior		Do Período		Acumulada até o Período					
Item	Discriminação dos Serviços				Und																						
02.05	CANTEIRO																										
02.05.001	Melo-flo de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3				m	63,53				63,53		0,00		63,53		0,00		0,00		2.088,23		294,78		87,63			
02.05.002	Pintura de melo flo (caleção)				m	63,53				0,00		0,00		63,53		0,00		4,64		294,78		0,00		0,00			
02.08	SERVIÇOS FINAIS																										
02.06.001	Marco Inaugural - Rev. 01				Un	1,00				0,00		1,00		0,00		0,00		677,66		677,66		307,16		68,81			
02.06.002	Placa em acrílico branco lêsoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobrecolado				m2	0,35				0,00		0,00		0,35		0,00		877,61		307,16		0,00		0,00			
02.07	RECUPERAÇÃO DE TALUDE																										
02.07.001	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora				m2	127,76				127,76		0,00		127,76		0,12		15,33		2.924,43		15,33		0,00			
02.07.002	Grana esmeralda em placas, fornecimento e planito				m2	127,76				127,76		0,00		127,76		22,77		2.909,10		2.909,10		0,00		0,00			
02.08	ADITIVO																										
02.08.001	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev.01				un	1,00				0,00		1,00		0,00		2.119,81		2.119,81		2.119,81		0,00		0,00			
02.08.002	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento				Un	1,00				0,00		1,00		0,00		2.107,58		2.107,58		2.107,58		0,00		0,00			
02.08.003	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,8 m de solo (não inclui fornecimento), af. 11/2019				un	1,00				0,00		1,00		0,00		1.059,02		1.059,02		1.059,02		0,00		100,00			
02.08.004	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m				un	2,00				0,00		2,00		0,00		149,34		298,68		298,68		0,00		0,00			
02.08.005	Eletróduto de pvc rígido rosçável, diâm = 32mm (1")				m	20,00				0,00		20,00		16,15		323,95		322,95		322,95		0,00		99,98			
02.08.006	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°C				m	75,00				0,00		75,00		0,00		12,46		934,50		934,50		0,00		0,00			
02.08.007	Demolição de melo-flo granítico ou pre-moldado				m	61,50				0,00		61,50		9,28		570,72		570,72		570,72		0,00		0,00			
02.08.008	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, com reaproveitamento, af. 09/2023				m3	12,30				0,00		12,30		0,00		114,43		1.407,45		1.407,45		0,04		0,00			
02.08.009	Remoção de banco de concreto pré-moldado				un	4,00				0,00		4,00		0,00		17,99		71,96		71,96		0,00		0,00			
02.08.010	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,70 x 0,70 x 0,80m				un	1,00				0,00		1,00		0,00		585,05		585,05		585,05		0,00		0,00			
02.08.011	Concreto magro para lastro, traço 1:4:5:4:5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L af. 05/2021				m3	0,22				0,00		0,22		0,00		411,23		90,47		90,47		0,00		0,00			
02.08.012	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08				m2	14,50				0,00		14,50		0,00		43,59		632,05		632,04		0,01		0,00			
02.08.013	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015				m2	29,00				0,00		29,00		0,00		6,47		187,63		187,63		0,00		0,00			
02.08.014	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm				m2	29,00				0,00		29,00		0,00		33,21		963,10		963,10		0,00		0,00			
02.08.015	Eletróduto de pvc rígido rosçável, diâm = 25mm (3/4")				m	6,00				0,00		6,00		0,00		12,59		75,54		75,54		0,00		0,00			
02.08.016	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação, af. 10/2020				un	1,00				0,00		0,00		0,00		68,10		0,00		0,00		68,10		0,00			
02.08.017	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barmamento, padrão DIN, exclusive disjuntores				un	1,00				0,00		0,00		0,00		133,99		133,99		0,00		133,99		0,00			
02.08.018	Lona plástica preta				m2	253,61				0,00		253,61		0,00		5,28		1.339,07		1.339,07		0,00		0,00			
03	PRAÇA REINALDO MOURA																										
03.01	SERVIÇOS PRELIMINARES																										
03.01.001	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metal 20 x 20cm e escoramento, Instalação - Rev.02 - 09/2021				un	1,00				0,00		1,00		0,00		488,64		488,64		488,64		0,00		0,00			
03.01.002	Locação de praças com piquetes de madeira				m2	738,75				738,75		0,00		738,75		0,77		568,84		568,84		0,00		0,00			

Martins Engenharia
Dinesh/Kumar
Engenheiro Civil
CRFA: 270097088-8

Obra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BONFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBUSE.				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 22/2023 ORDEN DE SERVIÇO Nº				MARTINS Locação e Serviços	
Contratada: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA				B.M.Nº: 03				Data da medição: 10/08/2024					
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU				Período: 01/04/2024 A 10/08/2024									
Prazo: 03 MESES+ 03 MESES(ADITIVO)				Valores (R\$)									
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada+ Aditivo	Quantidades	Preço Unit. (R\$)	Contratado + Contrato	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido		
				Acumulada Anterior	Do Período								
03.05.009	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 25mm (3/4")	m	35,00	0,00	25,00	10,00	0,00	377,50	377,50	151,00	71,43		
03.05.010	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450V/750V/70°C	m	280,00	0,00	75,00	205,00	0,00	934,50	934,50	2.554,30	28,79		
03.05.011	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	125,43	0,00		
03.05.012	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5kA, rel.: Siemens S SX1 ou similar.	un	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00		
03.05.013	Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto	pt	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	139,56	0,00		
03.05.014	Ponto de interruptor 01 seção simples c/placa, com canalização plástica invisível 20x10mm	pt	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	288,86	0,00		
03.05.015	Luminária fluorescente tubular 2 x 20 w / 127 v, completa	un	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	321,18	0,00		
03.05.016	Mesa c/ tempo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, 2 bancos em concreto armado (semi-circular), com pintura acrílica.	un	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.291,52	0,00		
03.06	CANTEIRO												
03.06.001	Melhoria de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	121,20	0,00	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	562,37	0,00		
03.06.002	Pintura de melo fio (relação)	m	121,20	0,00	0,00	121,20	0,00	0,00	0,00	3.983,84	87,63		
03.07	SERVIÇOS FINAIS												
03.07.001	Marco Inaugural - Rev. 01	un	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,66	0,00		
03.07.002	Placa em acrílico branco lileoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	m2	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	307,16	0,00		
03.08	ADITIVO												
03.08.001	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento	un	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,58	0,00		
03.08.002	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,8 m de solo (não inclui fornecimento), af. 11/2019	un	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.704,37	98,77		
03.08.003	Calha de passagem em alternância de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.322,74	100,00		
03.08.004	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 32mm (1")	m	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,06	100,00		
03.08.005	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	746,70	100,00		
03.08.006	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	un	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1.453,50	100,00		
03.08.007	Avenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saço cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Condição mecânica e transporte	m3	10,57	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,57	100,00		
03.08.008	Lona plástica preta	m2	903,75	0,00	903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,80	100,00		
TOTAL				903,75	903,75	903,75	0,00	43,02%	R\$ 178.823,02	R\$ 338.353,21	91,24%		
PORCENTAGEM				100,00%				43,02%	R\$ 338.353,21	R\$ 32.488,15	8,76%		
				APROVADO PARA PAGAMENTO									
				ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.									
				DATA:									
				Valor Aprovado:									
				Emitir Nota Fiscal:									
				R\$ 169.530,19									

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8
MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA
 Eng Civil Dinesh Kumar - CREA 270097088-8
 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 472068/2024

Emissão: 10/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: Ax6DZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: DINESH KUMAR

Registro: 2700970888

CPF: 267.***.***-49

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/09/2002

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE -UFS

Data de Formação: 18/10/1996

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Registro: 0000166570

CNPJ: 13.025.702/0001-71

Data Início: 31/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

Registro: 0000162345

CNPJ: 15.190.486/0001-45

Data Início: 12/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MARTINS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Registro: 0000216640

CNPJ: 49.179.259/0001-30

Data Início: 08/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0000148067

CNPJ: 29.889.275/0001-00

Data Início: 01/06/2023





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 472068/2024

Emissão: 10/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: Ax6DZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Carmópolis/SE, 09 de junho de 2024.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
ESTADO DE SERGIPE

Referente: Contrato nº 022/2023.

Objeto: Reforma de Praças localizadas no Conjunto Reinaldo Moura e Conjunto Lourival Bomfim na sede do município de Pirambu/SE


OFÍCIO ENTREGA DE DOCUMENTOS

Senhor (a) Presidente:

Venho por meio deste ofício, encaminhar os documentos solicitados para a medição do **Boletim de medição nº03 (Período 01/04/2024 à 10/06/2024)** referente ao contrato nº 22/2023, Prestação de Serviços na Reforma de Praças localizadas no Conjunto Reinaldo Moura e Conjunto Lourival Bomfim na sede do município de Pirambu/SE

Os documentos em anexo são:

- Nota Fiscal de Serviço;
- Boletim de Medição;
- Relatório Fotográfico;
- Memorial de Cálculo;
- Relatório diário de obra;
- CNO;
- ART da Obra;
- Certidão Federal;
- Certidão Estadual;
- Certidão Municipal;
- Certidão Trabalhista;
- FGTS.


Marcos Martins da Rocha
Sócio Administrador
Rg. 3.324.276-3 SSP/SE
CPF: 015.735.205-60

Recebido por: _____


MARTINS ENGENHARIA – CNPJ: 15.190.486/0001-45

 Rua José Antônio dos Santos, S/N, Galpão – Bairro Antônio Barreto Teles – Carmópolis - SE

 (79) 99971-1728 / 99988-9649

 tins@martinslocserv.com.br



RECEBIDO
Em 12/06/24


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BONFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBUISE.										BOLETIM DE MEDIÇÃO			CONTRATO Nº 22/2023		MARTINS Locação e Serviços	
MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA										B.M.Nº: 03			ORDEM DE SERVIÇO Nº		Data da medição: 10/06/2024	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU										Período: 01/04/2024 A 10/06/2024						
03 MESES+ 03 MESES(ADITIVO)																
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades				Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)				% Medido				
			Contratada+ Aditivo	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Saldo a medir	Contratado + Contrato	Acumulado Anterior	Do Período		Acumulado até o Período	Saldo a medir		
01	PRAÇA MAIOR LOURIVAL BONFIM															
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES															
01.01.001	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoreamento, instalada - Rev.02 - 09/2021	un	1,00	1,00	0,00	1,00	488,63	488,63	488,63	0,00	488,63	0,00	0,00	100,00	91,36	100,00
01.01.002	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	368,20	368,20	0,00	368,20	11,56	4.256,39	4.256,39	0,00	4.256,39	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
01.01.003	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	368,20	368,20	0,00	368,20	0,77	283,51	283,51	0,00	283,51	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
01.01.004	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev.01	un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.892,86	1.892,86	1.892,86	0,00	1.892,86	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
01.02	PAVIMENTAÇÃO															
01.02.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	368,20	184,10	184,10	368,20	28,05	10.328,01	5.164,01	5.164,01	38.729,10	10.328,01	0,00	100,00	91,44	100,00
01.02.002	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - Ites usos	m2	368,20	368,20	0,00	368,20	50,16	18.468,91	18.468,91	0,00	18.468,91	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
01.02.003	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	368,20	0,00	0,00	0,00	9,85	3.626,77	0,00	0,00	3.626,77	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01.02.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00	1,00	0,00	1,00	451,03	451,03	451,03	0,00	451,03	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
01.02.005	Colchão de areia	m3	73,60	73,60	0,00	73,60	128,82	9.481,15	9.481,15	0,00	9.481,15	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
01.03	PAISAGISMO															
01.03.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	40,15	40,15	0,00	40,15	22,77	914,22	914,22	0,00	914,22	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
01.04	DIVERSOS															
01.04.001	Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2"	m	8,74	0,00	0,00	0,00	87,12	761,43	0,00	0,00	761,43	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01.04.002	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev.01	un	1,00	1,00	0,00	1,00	2.565,57	2.565,57	2.565,57	0,00	2.565,57	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
01.04.003	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv, ø=1 1/2", Sergipark ou similar	Un	1,00	1,00	0,00	1,00	868,08	868,08	868,08	0,00	868,08	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
01.04.004	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.112,40	1.112,40	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
01.04.005	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv, ø=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar	Un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.112,40	1.112,40	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
01.04.006	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	23,13	23,13	0,00	23,13	212,40	4.912,81	4.912,81	0,00	4.912,81	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
01.04.007	Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, iluminação pública, 180w, 4000K, 220v, e suporte em tubo aço galv, com Anteparo, da Ilumatic, mod LPL Ares ou similar	un	1,00	1,00	0,00	1,00	4.581,23	4.581,23	4.581,23	0,00	4.581,23	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
01.04.008	Lixeiras em eucalipto perfurado e autoclavado 0,45m x 0,45m x 0,53m	un	3,00	0,00	0,00	0,00	390,91	1.172,73	0,00	0,00	1.172,73	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01.05	QUIOSQUE															
01.05.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado(resinado 12mm,105 usos)	m3	0,65	0,00	0,65	0,65	2.638,44	1.714,99	0,00	1.714,99	13.392,82	1.714,99	0,00	100,00	0,00	100,00
01.05.002	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelim ou madeira de lei	m3	0,69	0,00	0,69	0,69	4.144,93	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01.05.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	16,96	0,00	16,96	16,96	17,79	301,72	0,00	301,72	301,72	301,72	0,00	100,00	0,00	100,00

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
 Engenheiro Civil
 CREA: 270097088-8

Engenheiro Civil
 CREA-SE 27179764-2

Obra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BONFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU.

Contratada: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

Prazo: 03 MESES+ 03 MESES(ADITIVO)

BOLETIM DE MEDIÇÃO

B.M.Nº: 03

Período: 01/04/2024 À 10/06/2024

CONTRATO Nº 22/2023

ORDEN DE SERVIÇO Nº



Data da medição: 10/06/2024

Quantidades															Valores (R\$)					% Medido
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada+ Aditivo	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado + Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir							
01	PRAÇA MAIOR LOURIVAL BONFIM																			
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES																			
01.01.001	Placa de obra em Iona com impresso digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escamamento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	488,63	101.800,42	61.974,80	31.033,90	93.008,70	8.791,72	91,36						
01.01.002	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	368,20	368,20	0,00	368,20	0,00	11,56	4.256,39	4.256,39	0,00	4.256,39	0,00	100,00						
01.01.003	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	368,20	368,20	0,00	368,20	0,00	0,77	283,51	283,51	0,00	283,51	0,00	100,00						
01.01.004	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1.892,86	1.892,86	1.892,86	0,00	1.892,86	0,00	100,00						
01.02	PAVIMENTAÇÃO																			
01.02.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	368,20	184,10	184,10	368,20	0,00	28,05	10.328,01	5.164,01	5.164,01	10.328,01	0,00	100,00						
01.02.002	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - Ites. Usos	m2	368,20	368,20	0,00	368,20	0,00	50,16	18.468,91	18.468,91	0,00	18.468,91	0,00	100,00						
01.02.003	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	368,20	0,00	0,00	368,20	0,00	9,85	3.626,77	0,00	0,00	0,00	3.626,77	0,00						
01.02.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	451,03	451,03	451,03	0,00	451,03	0,00	100,00						
01.02.005	Colchão de areia	m3	73,60	73,60	0,00	73,60	0,00	128,82	9.481,15	9.481,15	0,00	9.481,15	0,00	100,00						
01.03	PAISAGISMO																			
01.03.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	40,15	40,15	0,00	40,15	0,00	22,77	914,22	914,22	0,00	914,22	0,00	100,00						
01.04	DIVERSOS																			
01.04.001	Concreto em aço inox, escovado, d=1 1/2"	m	8,74	0,00	0,00	8,74	0,00	87,12	761,43	0,00	0,00	0,00	761,43	0,00						
01.04.002	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2.565,57	2.565,57	2.565,57	0,00	2.565,57	0,00	100,00						
01.04.003	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv, a=1 1/2", Serigrafik ou similar	Un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	868,08	868,08	868,08	0,00	868,08	0,00	100,00						
01.04.004	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Serigrafik ou similar	Un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1.112,40	1.112,40	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00	100,00						
01.04.005	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv, e=2", conjunto com 03 unidades, Serigrafik ou similar	Un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1.112,40	1.112,40	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00	100,00						
01.04.006	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	23,13	23,13	0,00	23,13	0,00	212,40	4.912,81	4.912,81	0,00	4.912,81	0,00	100,00						
01.04.007	Fornecimento de Luminária 04 pétales em Led, iluminação pública, 180w, 4000K, 220v, e suporte em tubo aço galv, com Anteparo, da Illumatic, mod LPI, Aves ou similar	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	4.581,23	4.581,23	4.581,23	0,00	4.581,23	0,00	100,00						
01.04.008	Lixeiras em esmalte perfurado e autoclavado 0,45m x 0,45m x 0,53m	un	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	390,91	1.172,73	0,00	0,00	0,00	1.172,73	0,00						
01.05	QUISQUE																			
01.05.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado, resinado, 12mm (05 usos)	m3	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	2.638,44	1.714,99	0,00	1.714,99	1.714,99	0,00	100,00						
01.05.002	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelim ou madeira de lei	m3	0,69	0,00	0,69	0,69	0,00	4.144,93	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	100,00						
01.05.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	16,96	0,00	16,96	16,96	0,00	17,79	301,72	0,00	0,00	0,00	301,72	0,00						

Assinatura do Engenheiro Civil
CREA-SE 271797661-2

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBUÍSE.										BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 22/2023		ORDEM DE SERVIÇO Nº		MARTINS Locação e Serviços	
MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA										B.M.Nº: 03				Período: 01/04/2024 A 10/06/2024		Data da medição: 10/06/2024			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU 03 MESES+ 03 MESES(ADITIVO)										Valores (R\$)									
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades				Contratada+ Aditivo	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado + Contrato	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	% Medido		
01.05.004	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 6m a 8 m	un		0,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1.337,27	1.337,27	0,00	1.337,27	1.337,27	0,00	100,00		
01.05.005	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m		0,00	16,00		16,00	0,00	16,00	0,00	53,69	859,04	0,00	859,04	859,04	0,00	100,00		
01.05.006	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2		0,00	25,00		25,00	0,00	25,00	0,00	112,13	2.803,25	0,00	2.803,25	2.803,25	0,00	100,00		
01.05.007	Teiamento com tela cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, itabaianinha ou similar - Rev.02	m2		0,00	25,00		25,00	0,00	25,00	0,00	60,77	1.519,25	0,00	1.519,25	1.519,25	0,00	100,00		
01.05.008	Entrada de energia elétrica básica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev.01	un		1,00	0,00		0,00	1,00	1,00	0,00	2.119,81	2.119,81	2.119,81	0,00	2.119,81	0,00	100,00		
01.05.009	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 25mm (3/4")	m		0,00	25,00		25,00	0,00	25,00	0,00	15,10	377,50	0,00	377,50	377,50	0,00	100,00		
01.05.010	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450V/750V/70°C	m		0,00	130,00		130,00	0,00	130,00	0,00	12,46	1.619,80	0,00	1.619,80	1.619,80	0,00	100,00		
01.05.011	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	125,43	125,43	0,00	0,00	0,00	125,43	0,00		
01.05.012	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5.SX1 ou similar	un		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	20,79	20,79	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00		
01.05.013	Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto	pt		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2,00	69,78	139,56	0,00	0,00	0,00	139,56	0,00		
01.05.014	Ponto de interruptor 01 seção simples c/placa, com canalleta plástica crivosa 20x10mm	pt		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	288,86	288,86	0,00	0,00	0,00	288,86	0,00		
01.05.015	Luminária fluorescente tubular 2 x 20 w / 127 v, completa	un		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2,00	160,59	321,18	0,00	0,00	0,00	321,18	0,00		
01.05.016	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, 2 bancos em concreto armado (semi circular), com pintura acrílica.	un		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	1.291,52	1.291,52	0,00	0,00	0,00	1.291,52	0,00		
01.06	CANTEIRO																		
01.06.001	Melo-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m		100,45	0,00		100,45	0,00	100,45	0,00	32,87	3.301,79	3.301,79	3.301,79	0,00	3.301,79	0,00		
01.06.002	Pintura de melo fio (calção)	m		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,45	4,64	466,09	0,00	0,00	0,00	466,09	0,00		
01.07	SERVIÇOS FINAIS																		
01.07.001	Marco Inaugural - Rev. 01	un		0,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	677,66	677,66	0,00	0,00	677,66	677,66	0,00		
01.07.002	Placa em acrílico branco litooso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	m2		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,35	877,61	307,16	0,00	0,00	0,00	307,16	0,00		
01.08	ADITIVO																		
01.08.001	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento	un		0,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	2.107,58	2.107,58	0,00	0,00	2.107,58	2.107,58	0,00		
01.08.002	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,8 m de solo (não inclui fornecimento), af. 11/2019	un		0,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1.059,02	1.059,02	0,00	0,00	1.059,02	1.059,02	0,00		
01.08.003	Caixa pré moldada em concreto c/ampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un		0,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	18,07	18,07	0,00	0,00	18,07	18,07	0,00		
01.08.004	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un		0,00	3,00		3,00	0,00	3,00	0,00	149,34	448,02	0,00	0,00	448,02	448,02	0,00		
01.08.005	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 32mm (1")	m		0,00	36,00		36,00	0,00	36,00	0,00	16,15	581,40	0,00	0,00	581,40	581,40	0,00		
01.08.006	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	133,99	133,99	0,00	0,00	0,00	133,99	0,00		
01.08.007	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev.01	m2		0,00	45,90		45,90	0,00	45,90	0,00	24,17	1.109,40	0,00	0,00	1.109,40	1.109,40	0,00		
01.08.008	Demolição de meio	m		0,00	45,90		45,90	0,00	45,90	0,00	9,28	425,95	0,00	0,00	425,95	425,95	0,00		

MARTINS Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA-SE 21797661.2

MARTINS Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBUÍSE.										BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 22/2023		MARTINS		Locação e Serviços	
MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA										B.M.Nº: 03				ORDEN DE SERVIÇO Nº					
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU										Período: 01/04/2024 A 10/06/2024				Data da medição: 10/06/2024					
03 MESES+ 03 MESES(ADITIVO)										Valores (R\$)									
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada+ Aditivo	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado + Contrato	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	% Medido					
02.05	CANTEIRO																		
02.05.001	Melo-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	63,53	63,53	0,00	63,53	0,00	32,87	2.383,01	2.088,23	0,00	2.088,23	294,78	87,63					
02.05.002	Pinura de meio fio (calação)	m	63,53	0,00	0,00	0,00	63,53	4,64	294,78	0,00	0,00	0,00	294,78	100,00					
02.06	SERVIÇOS FINAIS																		
02.06.001	Marco inaugural - Rev. 01	Un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	677,66	984,82	0,00	677,66	677,66	0,00	100,00					
02.06.002	Placa em acrílico branco lático dupla, tipo sanduíche, com aplicação de adesivo sobreposto	m2	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	877,61	2.924,43	2.924,43	0,00	2.924,43	0,00	100,00					
02.07	RECUPERAÇÃO DE TALUDE																		
02.07.001	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m2	127,76	127,76	0,00	127,76	0,00	0,12	15,33	15,33	0,00	15,33	0,00	100,00					
02.07.002	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	127,76	127,76	0,00	127,76	0,00	22,77	2.909,10	2.909,10	0,00	2.909,10	0,00	100,00					
02.08	ADITIVO																		
02.08.001	Entrada de energia elétrica básica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev.01	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2.119,81	2.119,81	0,00	2.119,81	2.119,81	0,00	100,00					
02.08.002	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento	Un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2.107,58	2.107,58	0,00	2.107,58	2.107,58	0,00	100,00					
02.08.003	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,8 m de solo (não inclui fornecimento). af. 11/2019	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1.059,02	1.059,02	0,00	1.059,02	1.059,02	0,00	100,00					
02.08.004	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	149,34	298,68	0,00	298,68	298,68	0,00	100,00					
02.08.005	Eletroduto de pvc rígido riscável, diâm = 32mm (1")	m	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	16,15	323,00	0,00	322,95	322,95	0,00	99,98					
02.08.006	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	12,46	934,50	0,00	934,50	934,50	0,00	100,00					
02.08.007	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	9,28	570,72	0,00	570,72	570,72	0,00	100,00					
02.08.008	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, com reaproveitamento. af. 09/2023	m3	12,30	0,00	12,30	12,30	0,00	114,43	1.407,49	0,00	1.407,45	1.407,45	0,04	100,00					
02.08.009	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	17,99	71,96	0,00	71,96	71,96	0,00	100,00					
02.08.010	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,70 x 0,70 x 0,80m	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	585,05	585,05	0,00	585,05	585,05	0,00	100,00					
02.08.011	Concreto magro para lastro, traço 1:4:5,4:5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. af. 05/2021	m3	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	411,23	90,47	0,00	90,47	90,47	0,00	100,00					
02.08.012	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	43,59	632,05	0,00	632,04	632,04	0,01	100,00					
02.08.013	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	6,47	187,63	0,00	187,63	187,63	0,00	100,00					
02.08.014	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	33,21	963,10	0,00	963,10	963,10	0,00	100,00					
02.08.015	Eletroduto de pvc rígido riscável, diâm = 25mm (3/4")	m	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	12,59	75,54	0,00	75,54	75,54	0,00	100,00					
02.08.016	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	68,10	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00					
02.08.017	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	133,99	133,99	0,00	0,00	0,00	133,99	0,00					
02.08.018	Lona plástica preta	m2	253,61	0,00	253,61	253,61	0,00	5,28	1.339,07	0,00	1.339,07	1.339,07	0,00	100,00					
03	PRAÇA REINALDO MOURA																		
03.01	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
03.01.001	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev.02 - 09/2021	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	488,64	488,64	488,64	0,00	488,64	488,64	0,00					
03.01.002	Locação de praças com picquetes de madeira	m2	738,75	738,75	0,00	738,75	0,00	0,77	568,84	568,84	0,00	568,84	568,84	0,00					

MEMORIA DE CÁLCULO - BM 03 CT+ ADITIVO

PERÍODO (01/04/2024 - 10/06/2024)

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.	
CONTRATADA:	MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	
CONTRATO Nº:	22/2023	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Discriminação dos Serviços	UND	COMP.	LARG.	PROF/ALT	TAXA	PARCIAL	TOTAL
02.02	PAVIMENTAÇÃO							
02.03	PAISAGISMO							
02.04	DIVERSOS							
02.04.003	Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/iluminação pública, 180w, 4000k, 220v, e suporte em tubo aço galv, com Anteparo, da Ilumatic, mod LPL Ares ou similar	un						1,00
02.06.001	Marco inaugural - Rev. 01	Un						1,00
02.07	RECUPERAÇÃO DE TALUDE							
02.08	ADITIVO							
02.08.001	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un						1,00
02.08.002	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento	Un						1,00
02.08.003	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,8 m de solo (não inclui fornecimento). af_11/2019	un						1,00
02.08.004	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un						2,00
02.08.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m						20,00
02.08.006	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m						75,00
02.08.007	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m						61,50
02.08.008	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, com reaproveitamento. af_09/2023	m3						12,30
02.08.009	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un						4,00
02.08.010	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,70 x 0,70 x 0,80m	un						1,00
02.08.011	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3						0,22
02.08.012	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2						14,50
02.08.013	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2						29,00
02.08.014	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2						29,00
02.08.015	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m						6,00
02.08.018	Lona plástica preta	m2						253,61
03	PRAÇA REINALDO MOURA							
03.02	PAVIMENTAÇÃO							
03.02.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2						534,37
03.02.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2						534,37
03.02.005	Colchão de areia	m3						41,25
03.03	PAISAGISMO							
03.03.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2						26,58
03.04	DIVERSOS							
03.04.005	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m						89,00
03.04.006	Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/iluminação pública, 180w, 4000k, 220v, e suporte em tubo aço galv, com Anteparo, da Ilumatic, mod LPL Ares ou similar	un						2,00
03.05	QUIOSQUE							
03.05.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3						0,50

MEMORIA DE CÁLCULO - BM 03 CT+ ADITIVO

PERÍODO (01/04/2024 - 10/06/2024)

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.	
CONTRATADA:	MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	
CONTRATO Nº:	22/2023	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

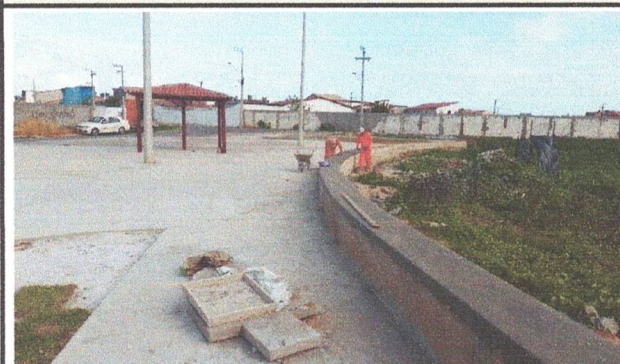
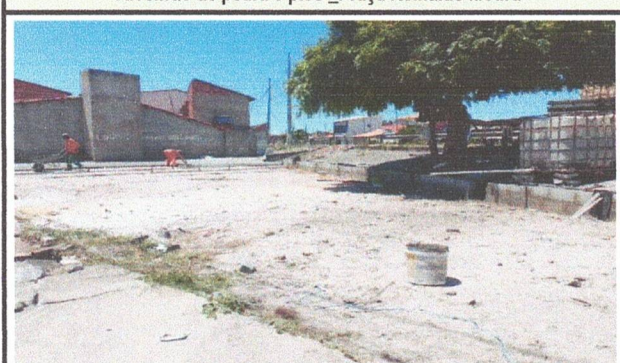
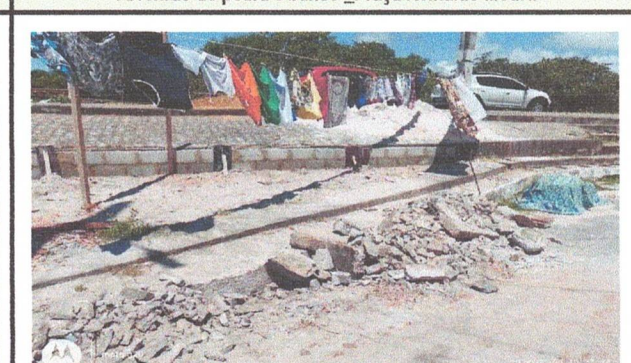
Item	Discriminação dos Serviços	UND	COMP.	LARG.	PROF/ALT	TAXA	PARCIAL	TOTAL
03.05.002	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelim ou madeira de lei	m3						0,69
03.05.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2						16,96
03.05.004	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 6m a 8 m	un						1,00
03.05.005	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m						16,00
03.05.006	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2						25,00
03.05.007	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02	m2						25,00
03.05.008	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un						0,00
03.05.009	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m						25,00
03.05.010	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m						75,00
03.06	CANTEIRO							
03.06.001	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m						121,20
03.06.002	Pintura de meio fio (caliação)	m						
03.07	SERVIÇOS FINAIS							
03.07.001	Marco inaugural - Rev. 01	Un						1,00
03.07.002	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	m2						
03.08	ADITIVO							
03.08.001	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento	Un						3,00
03.08.002	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,8 m de solo (não inclui fornecimento). af_11/2019	un						3,00
03.08.003	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un						5,00
03.08.004	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m						90,00
03.08.007	Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3						10,57
03.08.008	Lona plástica preta	m2						903,75

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil

CREA: 270097088-8

MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

Engº Civil Dinesh Kumar - CREA 270097088-8

Obra:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.	
Contratada:	MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
BM: 03 (CT +ADTV)	Período : 01/04/2024 à 10/06/2024	CONTRATO Nº 22/2023
		
IMPLANTAÇÃO DE POSTES - Praça REINALDO MOURA	Lona_ Piso em concreto _Praça REINALDO MOURA	
		
Banco em alvenaria e piso (aditivo) _ Praça REINALDO MOURA	Piso em concreto _ Praça REINALDO MOURA	
		
Alvenrao de pedra e piso _Praça Reinaldo Moura	Alvenrao de pedra e banco _Praça Reinaldo Moura	
		
ADITIVO - MURETA EM AL. BLOCOS_PRAÇA L. BOMFIM MAIOR	DEMOLIÇÕES -PASSEIO E CONFEC. MURETA	

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
 Engenheiro Civil
 CREA: 270097088-8

[Handwritten signature]
 Engenheiro Civil
 CREA: 270097088-8



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

JUNHO/2024

Nota de Liquidação: 0619132

Fonte: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Data: 19/06/2024

FORNECEDOR

Nome: MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF: 15190486000145

Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 34

Compl:

Bairro: CENTRO

Cidade: Japaratuba

UF: SE

E-mail: 1@

Telefone: (79)3213-0564

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 22063

Operação:

Conta: 1100009

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Função: 15 Urbanismo

SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana

Programa: 0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Ação: 1055 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações

SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo

Fonte: 17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Marcador: 17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Centro Custo:

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0201014	01/02/2024	73.279,55	73.279,55	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO REINALDO MOURA DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023 E CONTRATO Nº 22/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

PARTE DA NOTA FISCAL 0021/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO REINALDO MOURA DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023 E CONTRATO Nº 22/2024.

Documento	Valor
Nota Fiscal (21 / Série: A / UF: SE / Emissão: 10/06/2024)	73.279,55

SUBEVENTO	Conta Débito	Conta Crédito	Valor
15 - OBRAS E INSTALAÇÕES	123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	73.279,55
	Retenção		Valor
	21881010403-Imposto de Renda - Outros rendimentos		2.392,95
	21881010801-Iss		3.190,60

SETENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	5.583,55
Total Liquido:	67.696,00



Nº Processo
0000524

Nº Fila
245

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

TERMO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 15.190.486/0001-45

Nome: MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA GETULIO VARGAS

Bairro: CENTRO

E-mail: 1@

Compl:

Cidade: Japaratuba

Telefone: (79)3213-0564

UF: SE

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência: 22063

Conta: 1100009

EMPENHO	EMIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	FONTE
0201014	01/02/2024	1055.44905100-17200000	Global	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FED - Lei 9.478/1997

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO REINALDO MOURA DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023 E CONTRATO Nº 22/2024.

Documentação

Nota Fiscal	21
Valor	R\$ 73.279,55
Emissão	10/06/2024
Horário de Entrega	13/06/2024 09:57:59

Para acompanhar o andamento do seu processo na fila pública, acesse o link abaixo:

<http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pirambu/fornecedor/filapagamento>

Cadastrado por: Santiago Santos Gois



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento Tributário - Praça 16 de Outubro, Nº 135, Centro - Carmópolis/SE, CEP: 49.7490-000 Telefone: (79) 3277-1210

Nota: 2024000

00000021

Código Verificação

AINM-HEYI



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
10/06/2024 05:59:46
Reg. Especial Tributação
Nenhum

Período de Competência
06/2024
Exigibilidade do ISS
Exigível em Pirambu

Município de Prestação do Serviço
Pirambu - SE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

Nome Fantasia

MARTINS ENGENHARIA

Email

marcos@martinslocserv.com.br

CPF/CNPJ

15.190.486/0001-45

Inscrição Municipal

200052591

Inscrição Estadual

271630531

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 99988-9649

Endereço

RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS, SN, Santa Barbara - CEP: 49740-000 - Carmópolis - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

prefeitura municipal pirambu

CPF/CNPJ

13.095.039/0001-81

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3276-1203

E-mail

pirambu@pirambu.com.br

Endereço

(Localidade), 16, praça nossa senhora de lurdas - Não informado - CEP: 49190-000 - Pirambu - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4399103

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO VALOR TOTAL DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOC. NO CONJ. REINALDO MOURA E CONJ. LORIVAL BOMFIM - PIRAMBU/SE. CONTRATO MUNICIPAL Nº 04/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023.

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2024 A 10/06/2024.

PRAÇA LOURIVAL BONFIM- R\$ 31.033,90
PRAÇA LOURIVAL BONFIM MENOR - R\$ 18.024,30
PRAÇA REINALDO MOURA - R\$ 110.471,99

Material 60%

Mão de Obra 40%

DADOS BANCARIOS:

BANCO DO BRASIL

AG: 2206-3

CONTA CORRENTE: 110.000-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
DECLARO QUE

- ☒ Os serviços foram prestados
☐ Os produtos foram entregues
☐ A obra foi executada

Data: 19/06/2024

[Handwritten signature]

[Handwritten stamp: RECEBIDO, 19/06/2024, CREA-SE 271797031-2]

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
1.036,95	4.785,91	0,00	2.392,95	1.595,30	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
159.530,19	95.718,10	0,00	63.812,09	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
3.190,60	*****	0,00	149.719,08	159.530,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R\$ 21.456,81 Federal e R\$ 7.976,51 Municipal. Fonte: IBPT [691A69]
Substitui nota 202400000000019 de 07/06/2024

Visualizado em: 10/06/2024 05:59:45
Para validação desta NFSe acesse: <http://carmopolisse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

RECEBIDO

Em 19/06/24

[Handwritten signature]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 472068/2024
Emissão: 10/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: Ax6DZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: DINESH KUMAR

Registro: 2700970888

CPF: 267.***.***-49

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/09/2002

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS

Data de Formação: 18/10/1996

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Registro: 0000166570

CNPJ: 13.025.702/0001-71

Data Início: 31/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

Registro: 0000162345

CNPJ: 15.190.486/0001-45

Data Início: 12/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MARTINS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Registro: 0000216640

CNPJ: 49.179.259/0001-30

Data Início: 08/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0000148067

CNPJ: 29.889.275/0001-00

Data Início: 01/06/2023





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 472068/2024

Emissão: 10/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: Ax6DZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

JUNHO/2024

Nota de Liquidação: 0619133

Fonte: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Data: 19/06/2024

FORNECEDOR

Nome:

MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF:

15190486000145

Endereço:

RUA GETULIO VARGAS, 34

Compl:

Bairro:

CENTRO

Cidade:

Japaratuba

UF:

SE

E-mail:

1@

Telefone:

(79)3213-0564

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

001 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

22063

Operação:

Conta:

1100009

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:

0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Função:

15 Urbanismo

SubFunção:

451 Infraestrutura Urbana

Programa:

0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Ação:

1055 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

Natureza Despesa:

44905100 Obras e Instalações

SubElemento:

44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo

Fonte:

17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Marcador:

17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Centro Custo:

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0402001	02/04/2024	10.437,66	10.437,66	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

N.E 0201015 CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM (MENOR) DESTA MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023 E CONTRATO Nº 22/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

PARTE DA NOTA FISCAL 021/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM (MENOR) DESTA MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023 E CONTRATO Nº 22/2024.

Documento	Valor
Nota Fiscal (21 / Série: A / UF: SE / Emissão: 10/06/2024)	10.437,66

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	10.437,66

DEZ MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS	Total Retido: 0,00
	Total Liquido: 10.437,66

Data: 19/06/2024

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

CARLAS ANDREA DOS SANTOS NUNES
SOUZA

ENCARREGADO DE EMPENHO Mat.0001426

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 1 de 1



Nº Processo
0000528

Nº Fila
249

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

TERMO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 15.190.486/0001-45

Nome: MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA GETULIO VARGAS

Bairro: CENTRO

E-mail: 1@

Compl:

Cidade: Japarutuba

Telefone: (79)3213-0564

UF: SE

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência: 22063

Conta: 1100009

EMPENHO	EMIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	FONTE
0402001	02/04/2024	1055.44905100-17200000	Global	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FED. Lei 9.478/1997

HISTÓRICO DO EMPENHO

N.E 0201015 CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM (MENOR) DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023 E CONTRATO Nº 22/2024.

Documentação

Nota Fiscal	21
Valor	R\$ 10.437,66
Emissão	10/06/2024
Horário de Entrega	13/06/2024 10:19:11

Para acompanhar o andamento do seu processo na fila pública, acesse o link abaixo:

<http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pirambu/fornecedor/filapagamento>

Cadastrado por: Santiago Santos Gois



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento Tributário - Praça 16 de Outubro, Nº 135, Centro - Carmópolis/SE, CEP: 49.7490-000 Telefone: (79) 3277-1210

Nota: 2024000

00000021

Código Verificação
AINM-HEYI



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

10/06/2024 05:59:46

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

06/2024

Exigibilidade do ISS

Exigível em Pirambu

Município de Prestação do Serviço

Pirambu - SE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

Nome Fantasia

MARTINS ENGENHARIA

CPF/CNPJ

15.190.486/0001-45

Inscrição Municipal

200052591

Inscrição Estadual

271630531

Simples Nacional

Não

Email

marcos@martinslocserv.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 99988-9649

Endereço

RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS, SN, Santa Barbara - CEP: 49740-000 - Carmópolis - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

prefeitura municipal pirambu

CPF/CNPJ

13.095.039/0001-81

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3276-1203

E-mail

pirambu@pirambu.com.br

Endereço

(Localidade), 16, praça nossa senhora de lurdes - Não informado - CEP: 49190-000 - Pirambu - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4399103

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO VALOR TOTAL DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LÓC. NO CONJ. REINALDO MOURA E CONJ. LORIVAL BOMFIM - PIRAMBU/SE. CONTRATO MUNICIPAL Nº 04/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023.

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2024 A 10/06/2024.

PRAÇA LOURIVAL BOMFIM- R\$ 31.033,90

PRAÇA LOURIVAL BOMFIM MENOR - R\$ 18.024,30

PRAÇA REINALDO MOURA - R\$ 110.471,99

Material 60%

Mão de Obra 40%

DADOS BANCARIOS:

BANCO DO BRASIL

AG: 2206-3

CONTA CORRENTE: 110.000-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
DECLARO QUE

☒ Os serviços foram prestados
☐ Os produtos foram entregues
☐ A obra foi executada

Data: 19/06/2024

Assinatura do Tomador
Data: 19/06/2024
CPF: 13.095.039/0001-81

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
1.036,95	4.785,91	0,00	2.392,95	1.595,30	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
159.530,19	95.718,10	0,00	63.812,09	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
3.190,60	*****	0,00	149.719,08	159.530,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 21.456,81 Federal e R\$ 7.976,51 Municipal. Fonte: IBPT [691A69]

Substitui nota 202400000000019 de 07/06/2024

Visualizado em: 10/06/2024 05:59:45

Para validação desta NFSe acesse: <http://carmopolisse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

RECEBIDO
Em 19/06/2024
Assinatura

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		Data da medição: 10/08/2024											
Prazo: 03 MESES+ 03 MESES(ADITIVO)		Período: 01/04/2024 A 10/08/2024											
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada+ Aditivo	Quantidades			Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)				% Medido	
				Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Saldo a medir	Contratado + Contrato	Acumulado Anterior	Do Período		Acumulado até o Período
01	PRAÇA MAIOR LOURIVAL BONFIM												
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES												
01.01.001	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, Instalada - Rev.02 - 09/2021	un	1,00	1,00	0,00	0,00	488,63	488,63	488,63	0,00	488,63	0,00	100,00
01.01.002	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto e/ou reaproveitamento	m2	368,20	368,20	0,00	368,20	11,56	4.256,39	4.256,39	0,00	4.256,39	0,00	100,00
01.01.003	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	368,20	368,20	0,00	368,20	0,77	283,51	283,51	0,00	283,51	0,00	100,00
01.01.004	Entrada de energia elétrica trifásica demandada entre 0 e 15,2 kw - Rev.01	un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.892,86	1.892,86	1.892,86	0,00	1.892,86	0,00	100,00
01.02	PAVIMENTAÇÃO												
01.02.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 5cm	m2	368,20	184,10	0,00	368,20	28,05	10.328,01	5.164,01	0,00	18.468,91	0,00	100,00
01.02.002	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - Ites Usos	m2	368,20	368,20	0,00	368,20	50,16	18.468,91	18.468,91	0,00	18.468,91	0,00	100,00
01.02.003	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	368,20	0,00	0,00	0,00	9,85	3.626,77	0,00	0,00	3.626,77	0,00	0,00
01.02.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	un	1,00	1,00	0,00	1,00	451,03	451,03	451,03	0,00	451,03	0,00	100,00
01.02.005	Colchão de areia	m3	73,60	73,60	0,00	73,60	128,82	9.481,15	9.481,15	0,00	9.481,15	0,00	100,00
01.03	PAISAGISMO												
01.03.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	40,15	40,15	0,00	40,15	22,77	914,22	914,22	0,00	914,22	0,00	100,00
01.04	DIVERSOS												
01.04.001	Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2"	m	8,74	0,00	0,00	0,00	87,12	761,43	0,00	0,00	761,43	0,00	0,00
01.04.002	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1,00	0,00	1,00	2.565,57	2.565,57	2.565,57	0,00	2.565,57	0,00	100,00
01.04.003	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2". Sergipark ou similar	Un	1,00	1,00	0,00	1,00	868,08	868,08	868,08	0,00	868,08	0,00	100,00
01.04.004	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.112,40	1.112,40	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00	100,00
01.04.005	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar	Un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.112,40	1.112,40	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00	100,00
01.04.006	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	23,13	23,13	0,00	23,13	212,40	4.912,81	4.912,81	0,00	4.912,81	0,00	100,00
01.04.007	Fornecimento de Luminária 04 pêtalas em Led, iluminação pública, 180w, 4000K, 220v, e suporte em tubo aço galv, com Anteparo, da Illumatic, mod LPL Ares ou similar	un	1,00	1,00	0,00	1,00	4.581,23	4.581,23	4.581,23	0,00	4.581,23	0,00	100,00
01.04.008	Livrais em eucalipto perfurado e autoclavado 0,45m x 0,45m x 0,53m	un	3,00	0,00	0,00	0,00	390,91	1.172,73	0,00	0,00	1.172,73	0,00	0,00
01.05	QUIOSQUE												
01.05.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, aderido e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,65	0,00	0,00	0,65	2.638,44	1.714,99	0,00	0,00	1.714,99	0,00	100,00
01.05.002	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelim ou madeira de lei	m3	0,69	0,00	0,00	0,69	4.144,93	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	100,00
01.05.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	16,96	0,00	0,00	16,96	17,79	301,72	0,00	301,72	301,72	0,00	100,00

Martins Engenharia
Rafael Kumar

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

CREATED BY 271797642

Obra:

Contratada:

Contratante:

Prazo:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRACAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBUÍSE.

MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBUÍ

03 MESES+ 03 MESES(ADITIVO)

CONTRATO Nº 22/2023

ORDEN DE SERVIÇO Nº

Data da medição: 10/08/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO

B.M.Nº: 03

Período: 01/04/2024 À 10/08/2024

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades				Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)			% Medido
			Contratada+ Aditivo	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado + Contrato	Acumulado Anterior	Do Período	
01.05.004	Mediamento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 6m a 8 m	un	1,00	0,00	1,00	1,00	1.337,27	1.337,27	0,00	1.337,27	100,00
01.05.005	Mediamento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	16,00	0,00	16,00	16,00	53,69	859,04	0,00	859,04	100,00
01.05.006	Mediamento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	25,00	0,00	25,00	25,00	112,13	2.803,25	0,00	2.803,25	100,00
01.05.007	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, laticianha ou similar - Rev 02	m2	25,00	0,00	25,00	25,00	60,77	1.519,25	0,00	1.519,25	100,00
01.05.008	Entrada de energia elétrica básica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	1,00	0,00	1,00	2.119,81	2.119,81	2.119,81	0,00	100,00
01.05.009	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	25,00	0,00	25,00	25,00	15,10	377,50	0,00	377,50	100,00
01.05.010	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450V/750V/70°C	m	130,00	0,00	130,00	130,00	12,46	1.619,80	0,00	1.619,80	100,00
01.05.011	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	125,43	125,43	0,00	125,43	0,00
01.05.012	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5kA, rel. Siemens 5 SX1 ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	20,79	20,79	0,00	20,79	0,00
01.05.013	Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto	pt	2,00	0,00	0,00	0,00	69,78	139,56	0,00	139,56	0,00
01.05.014	Ponto de interruptor 01 seção simples c/placa, com canalata plástica divisória 20x10mm	pt	1,00	0,00	0,00	0,00	288,86	288,86	0,00	288,86	0,00
01.05.015	Luminária fluorescente tubular 2 x 20 w / 127 V, completa	un	2,00	0,00	0,00	0,00	160,59	321,18	0,00	321,18	0,00
01.05.016	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, 2 bancos em concreto armado (sentil circular), com pintura acrílica	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1.291,52	1.291,52	0,00	1.291,52	0,00
01.06	CANTEIRO							3.767,88	3.301,79	0,00	100,00
01.06.001	Melo-flo de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	100,45	100,45	0,00	100,45	32,87	3.301,79	3.301,79	0,00	100,00
01.06.002	Pintura de melo flo (catção)	m	100,45	0,00	0,00	0,00	4,64	466,09	0,00	466,09	0,00
01.07	SERVICIOS FINAIS							994,92	0,00	977,66	100,00
01.07.001	Marco Inaugural - Rev. 01	un	1,00	0,00	1,00	1,00	677,66	677,66	0,00	677,66	100,00
01.07.002	Placa em acrílico branco lileoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	m2	0,35	0,00	0,00	0,00	877,61	307,16	0,00	307,16	0,00
01.08	ADITIVO							12.069,61	0,00	11.799,42	97,76
01.08.001	Poste circular de concreto 12/200 - Fomecimento	un	1,00	0,00	1,00	1,00	2.107,58	2.107,58	0,00	2.107,58	100,00
01.08.002	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,8 m de solo (não inclui fôrmeamento), al. 11/2019	un	1,00	0,00	1,00	1,00	1.059,02	1.059,02	0,00	1.059,02	100,00
01.08.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	1,00	1,00	18,07	18,07	0,00	18,07	100,00
01.08.004	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	3,00	0,00	3,00	3,00	149,34	448,02	0,00	448,02	100,00
01.08.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	36,00	0,00	36,00	36,00	16,15	581,40	0,00	581,40	100,00
01.08.006	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	133,99	133,99	0,00	133,99	0,00
01.08.007	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	45,90	0,00	45,90	45,90	24,17	1.109,40	0,00	1.109,40	100,00
01.08.008	Demolição de melo	m	45,90	0,00	45,90	45,90	9,28	425,95	0,00	425,95	100,00

MARTINS

Locação e Serviços

CREA-SE 21175163-8

Dinesh Kumar

Engenheiro Civil

CREA: 270097088-8

Obra: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.**

Contratada: **MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU**

Prazo: **03 MESES+ 03 MESES(ADITIVO)**

BOLETIM DE MEDIÇÃO										CONTRATO Nº 22/2023		ORDEM DE SERVIÇO Nº		Data da medição: 10/08/2024		
B.M. Nº: 03										Período: 01/04/2024 À 10/08/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)				% Medido			
			Contratada+ Aditivo	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado + Contrato	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saldo a medir		
01.08.009	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, com reaproveitamento. af. 09/2023	m3	2,93	0,00	2,93	2,93	0,00	114,43	335,28	0,00	335,28	0,00	335,28	0,00	100,00	
01.08.010	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x38cm, a= 0,08m, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	63,69	1.241,95	0,00	1.241,95	0,00	1.241,95	0,00	100,00	
01.08.011	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Rev.08/2015	m2	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	6,47	188,28	0,00	188,28	0,00	188,28	0,00	100,00	
01.08.012	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	35,81	1.042,02	0,00	1.042,02	0,00	1.042,02	0,00	100,00	
01.08.013	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,33	0,00	1,33	1,33	0,00	575,80	765,82	0,00	765,82	0,00	765,82	0,00	100,00	
01.08.014	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	59,17	532,53	0,00	532,53	0,00	532,53	0,00	100,00	
01.08.015	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	68,10	136,20	0,00	136,20	0,00	136,20	0,00	100,00	
01.08.016	Lona plástica preta	m2	368,20	0,00	368,20	368,20	0,00	5,28	1.944,10	0,00	1.944,10	0,00	1.944,10	0,00	100,00	
02	PRACA MENOR LOURIVAL BONFIM															
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES															
02.01.001	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev.02 - 09/2021	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	488,65	488,65	0,00	488,65	0,00	488,65	0,00	100,00	
02.01.002	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto af. 09/2021	m2	253,61	253,61	0,00	253,61	0,00	11,56	2.931,73	2.931,73	0,00	2.931,73	0,00	2.931,73	0,00	100,00
02.01.003	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,77	200,20	200,20	0,00	200,20	0,00	200,20	0,00	100,00
02.01.004	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev.01	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1.892,86	1.892,86	1.892,86	0,00	1.892,86	0,00	1.892,86	0,00	100,00
02.02	PAVIMENTAÇÃO															
02.02.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	253,61	253,61	0,00	253,61	0,00	28,05	7.113,76	7.113,76	0,00	7.113,76	0,00	7.113,76	0,00	100,00
02.02.002	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - Ites usos	m2	253,61	253,61	0,00	253,61	0,00	50,16	12.721,08	12.721,08	0,00	12.721,08	0,00	12.721,08	0,00	100,00
02.02.003	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	253,61	0,00	0,00	0,00	253,61	9,85	2.498,06	0,00	0,00	0,00	2.498,06	0,00	0,00	
02.02.004	Rampa padião para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	un	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	451,03	902,06	902,06	0,00	902,06	0,00	902,06	0,00	100,00
02.02.005	Colchão de areia	m3	50,72	50,72	0,00	50,72	0,00	128,82	6.533,75	6.533,75	0,00	6.533,75	0,00	6.533,75	0,00	100,00
02.02.006	Composição paramétrica para execução de escada em concreto armado, moldada in loco, fck = 25 mpa. af. 11/2022	m3	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5.225,70	5.225,70	5.225,70	0,00	5.225,70	0,00	5.225,70	0,00	100,00
02.03	PAISAGISMO															
02.03.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	12,60	12,60	0,00	12,60	0,00	22,77	286,90	286,90	0,00	286,90	0,00	286,90	0,00	100,00
02.04	DIVERSOS															
02.04.001	Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2"	m	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40	87,12	906,05	3.003,34	4.581,23	0,00	7.584,57	2.078,78	78,49	
02.04.002	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	14,14	14,14	0,00	14,14	0,00	212,40	3.003,34	3.003,34	0,00	3.003,34	0,00	3.003,34	0,00	100,00
02.04.003	Fornecimento de Luminária 04 pétales em Led, iluminação pública, 180w, 4000K, 220v, e suporte em tubo aço galv, com Anteparo, da Ilumalite, mod LPL Ares ou similar	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4.581,23	4.581,23	0,00	4.581,23	0,00	4.581,23	0,00	100,00	
02.04.004	Lixeiras em eucalipto perfurado e autoclavado 0,45m x 0,45m x 0,53m	un	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	390,91	1.172,73	0,00	0,00	0,00	1.172,73	0,00	0,00	

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

Obra:

Contratada:

Contratante:

Prazo:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBUÍSE.

MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

03 MESES+ 03 MESES(ADITIVO)

CONTRATO Nº 22/2023

ORDEN DE SERVIÇO Nº

DATA DA MEDIÇÃO: 10/06/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO

B.M.Nº: 03

PERÍODO: 01/04/2024 À 10/06/2024

MARTINS

Locação e Serviços

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades				Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)				% Medido
			Contratada+ Aditivo	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratada + Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	
02.05	CANTEIRO											
02.05.001	Melo-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	63,53	63,53	0,00	63,53	32,87	2.393,01	2.088,23	0,00	2.088,23	87,83
02.05.002	Pinura de melo fio (calação)	m	63,53	0,00	0,00	0,00	4,64	294,78	0,00	0,00	0,00	100,00
02.06	SERVIÇOS FINAIS											
02.06.001	Marco Inaugural - Rev. 01	Un	1,00	0,00	1,00	1,00	677,66	984,92	0,00	677,66	677,66	68,81
02.06.002	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo estrutural	m2	0,35	0,00	0,00	0,00	877,61	307,16	0,00	0,00	307,16	0,00
02.07	RECUPERAÇÃO DE TALUDE											
02.07.001	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m2	127,76	127,76	0,00	127,76	0,12	15,33	15,33	0,00	15,33	100,00
02.07.002	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	127,76	127,76	0,00	127,76	22,77	2.909,10	2.909,10	0,00	2.909,10	100,00
02.08	ADITIVO											
02.08.001	Entrada de energia elétrica bilásica demandada entre 0 e 10,1 kW - Rev 01	un	1,00	0,00	1,00	1,00	2.119,81	12.987,76	0,00	12.766,57	202,14	98,44
02.08.002	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento	Un	1,00	0,00	1,00	1,00	2.107,58	2.119,81	0,00	2.119,81	2.119,81	100,00
02.08.003	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,8 m de solo (não inclui fornecimento), af. 11/2019	un	1,00	0,00	1,00	1,00	1.059,02	1.059,02	0,00	1.059,02	1.059,02	100,00
02.08.004	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	2,00	0,00	2,00	2,00	149,34	298,68	0,00	298,68	298,68	100,00
02.08.005	Eletroduto de pvc rígido rescalável, diâmetro = 32mm (1")	m	20,00	0,00	20,00	20,00	16,15	323,00	0,00	323,00	323,00	99,98
02.08.006	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/750v / 70°C	m	75,00	0,00	75,00	75,00	12,46	934,50	0,00	934,50	934,50	100,00
02.08.007	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	61,50	0,00	61,50	61,50	9,28	570,72	0,00	570,72	570,72	100,00
02.08.008	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, com reaproveitamento, af. 09/2023	m3	12,30	0,00	12,30	12,30	114,43	1.407,49	0,00	1.407,45	1.407,45	100,00
02.08.009	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	4,00	0,00	4,00	4,00	17,99	71,96	0,00	71,96	71,96	100,00
02.08.010	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,70 x 0,70 x 0,80m	un	1,00	0,00	1,00	1,00	585,05	585,05	0,00	585,05	585,05	100,00
02.08.011	Concreto magro para lastro, traço 1:4:5,4:5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L af. 05/2021	m3	0,22	0,00	0,22	0,22	411,23	90,47	0,00	90,47	90,47	100,00
02.08.012	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:3 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	14,50	0,00	14,50	14,50	43,59	632,05	0,00	632,04	632,04	100,00
02.08.013	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 09/2015	m2	29,00	0,00	29,00	29,00	6,47	187,63	0,00	187,63	187,63	100,00
02.08.014	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:3 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	29,00	0,00	29,00	29,00	33,21	963,10	0,00	963,10	963,10	100,00
02.08.015	Eletroduto de pvc rígido rescalável, diâmetro = 25mm (3/4")	m	6,00	0,00	6,00	6,00	12,59	75,54	0,00	75,54	75,54	100,00
02.08.016	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	un	1,00	0,00	1,00	1,00	68,10	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.017	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	1,00	1,00	133,99	133,99	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.018	Lona plástica preta	m2	253,61	0,00	253,61	253,61	5,28	1.339,07	0,00	1.339,07	1.339,07	100,00
03	PRAÇA REINALDO MOURA											
03.01	SERVIÇOS PRELIMINARES											
03.01.001	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev.02 - 09/2021	un	1,00	0,00	1,00	1,00	488,64	488,64	0,00	488,64	488,64	100,00
03.01.002	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	738,75	738,75	0,00	738,75	0,77	568,84	568,84	0,00	568,84	100,00

Obra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.										BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 22/2023	
Contratada: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA										B.M.Nº: 03				ORDEM DE SERVIÇO Nº	
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU										Período: 01/04/2024 À 10/06/2024				Data da medição: 10/08/2024	
Prazo: 03 MESES+ 03 MESES(ADITIVO)										Valores (R\$)					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratado+ Aditivo	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado + Contrato	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido	
03.01.003	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev.01	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1.892,86	1.892,86	1.892,86	0,00	1.892,86	0,00	100,00	
03.01.004	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	738,75	738,75	0,00	738,75	0,00	4,85	3.582,94	3.582,94	0,00	3.582,94	0,00	100,00	
03.02	PAVIMENTAÇÃO														
03.02.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	903,75	369,38	534,37	903,75	0,00	28,05	97.720,94	41.711,72	47.108,90	88.819,01	8.901,94	90,89	
03.02.002	Piso em concreto simples desarmado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - Ites usos	m2	903,75	369,38	534,37	903,75	0,00	50,16	25.350,18	10.360,97	14.989,09	25.350,18	0,00	100,00	
03.02.003	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	903,75	0,00	0,00	0,00	903,75	9,85	8.901,94	0,00	0,00	0,00	8.901,94	0,00	
03.02.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desarmado, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	451,03	451,03	451,03	0,00	451,03	0,00	100,00	
03.02.005	Colchão de areia	m3	137,29	96,04	41,25	137,29	0,00	128,82	17.685,70	12.371,87	5.313,83	17.685,70	0,00	100,00	
03.03	PAISAGISMO														
03.03.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	59,08	0,00	26,58	26,58	32,50	22,77	1.345,25	0,00	605,23	605,23	740,03	44,99	
03.04	DIVERSOS														
03.04.001	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev.01	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2.565,57	2.565,57	16.186,88	28.066,06	44.252,94	2.620,93	94,41	
03.04.002	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2". Sergipark ou similar	Un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	868,08	868,08	868,08	0,00	868,08	0,00	100,00	
03.04.003	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1.112,40	1.112,40	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00	100,00	
03.04.004	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar	Un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1.112,40	1.112,40	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00	100,00	
03.04.005	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	117,00	28,00	89,00	117,00	0,00	212,40	24.850,80	5.947,20	18.903,60	24.850,80	0,00	100,00	
03.04.006	Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, iluminação pública, 180w, 4000k, 220v, e suporte em tubo aço galv. com Anteparo, da Ilumalic, mod LPL Ares ou similar	un	3,00	1,00	2,00	3,00	0,00	4.581,23	13.743,69	4.581,23	9.162,46	13.743,69	0,00	100,00	
03.04.007	Lixeiras em eucalipto perfurado e autoclavado 0,45m x 0,45m x 0,53m	un	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	390,91	1.172,73	0,00	0,00	0,00	1.172,73	0,00	
03.04.008	Banco em eucalipto perfurado autoclavado com 1,60m x 0,45m x 0,85m	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	724,10	1.448,20	0,00	0,00	0,00	1.448,20	0,00	
03.05	QUIOSQUE														
03.05.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	2.638,44	1.319,22	0,00	1.319,22	1.319,22	0,00	74,68	
03.05.002	Pilar e vigas de madeira, seção 10x16cm a 20x20cm, em massaranduba, arandelin ou madeira de lei	m3	0,69	0,00	0,69	0,69	0,00	4.144,93	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	100,00	
03.05.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	16,96	0,00	16,96	16,96	0,00	17,79	301,72	0,00	301,72	301,72	0,00	100,00	
03.05.004	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 6m a 8 m	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1.337,27	1.337,27	0,00	1.337,27	1.337,27	0,00	100,00	
03.05.005	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	53,69	859,04	0,00	859,04	859,04	0,00	100,00	
03.05.006	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	112,13	2.803,25	0,00	2.803,25	2.803,25	0,00	100,00	
03.05.007	Teintamento com tinta cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabalânia ou similar - Rev.02	m2	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	60,77	1.519,25	0,00	1.518,25	1.519,25	0,00	100,00	
03.05.008	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev.01	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2.119,81	2.119,81	2.119,81	0,00	2.119,81	0,00	100,00	

Martins Engenharia
 Dinesh/Kumar
 Engenheiro Civil
 CREA: 270097088-8

Obra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBUSE.

Contratada:

MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

Prazo:

03 MESES+ 03 MESES(ADITIVO)

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 22/2023

ORDEM DE SERVIÇO Nº

Locação e Serviços

B.M.Nº: 03

Período: 01/04/2024 À 10/06/2024

Data da medição: 10/08/2024

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades				Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)				% Medido
			Contratada+ Aditivo	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Saldos a medir	Saldo a medir	Acumulado até o Período	% Medido	
03.05.009	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâ = 25mm (3/4")	m	35,00	0,00	25,00	10,00	15,10	377,60	377,60	151,00	71,43	
03.05.010	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/750V / 70°C	m	280,00	0,00	75,00	205,00	12,46	934,50	934,50	2.554,30	26,79	
03.05.011	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, excludive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	1,00	125,43	0,00	0,00	125,43	0,00	
03.05.012	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens S SX1 ou similar.	un	1,00	0,00	0,00	1,00	20,79	0,00	0,00	20,79	0,00	
03.05.013	Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto	pt	2,00	0,00	0,00	2,00	69,78	139,56	0,00	139,56	0,00	
03.05.014	Ponto de interruptor 01 seção simples c/placa, com canalleta plástica cilíndrica 20x10mm	pt	1,00	0,00	0,00	1,00	288,86	288,86	0,00	288,86	0,00	
03.05.015	Luminária fluorescente tubular 2 x 20 w / 127 v, completa	un	2,00	0,00	0,00	2,00	160,59	321,18	0,00	321,18	0,00	
03.05.016	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, 2 bancos em concreto armado (semelricular), com pintura acrílica.	Un	1,00	0,00	0,00	1,00	1.291,52	0,00	0,00	1.291,52	0,00	
03.06	CAITEIRO	m	121,20	0,00	0,00	121,20	32,87	3.983,84	3.983,84	0,00	0,00	
03.06.001	Melo-de concreto simples, rejuntaido com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	121,20	0,00	0,00	121,20	4,64	562,37	0,00	562,37	0,00	
03.06.002	Pintura de melo fio (calafiação)	m	121,20	0,00	0,00	121,20	677,66	824,82	0,00	824,82	0,00	
03.07	SERVIÇOS FINAIS	Un	1,00	0,00	1,00	0,00	877,81	307,16	0,00	307,16	0,00	
03.07.001	Marco Inaugural - Rev. 01	m2	0,35	0,00	0,00	0,35	2.107,58	6.322,74	0,00	6.322,74	0,00	
03.07.002	Placa em acrílico branco líteico dupla, tipo sanduíche, com aplicação de adesivo sobreposto	Un	3,00	0,00	3,00	0,00	1.059,02	3.177,06	0,00	3.177,06	0,00	
03.08	ADITIVO	Un	3,00	0,00	3,00	0,00	1.059,02	3.177,06	0,00	3.177,06	0,00	
03.08.001	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecedor Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,8 m de solo (não inclui fornecimento). af. 1/2019	un	3,00	0,00	3,00	0,00	1.059,02	3.177,06	0,00	3.177,06	0,00	
03.08.002	Caba de passagem em alvenaria de tijolos medidos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	5,00	0,00	5,00	0,00	149,34	746,70	0,00	746,70	0,00	
03.08.003	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâ = 32mm. (1")	m	90,00	0,00	90,00	0,00	16,15	1.453,50	0,00	1.453,50	0,00	
03.08.004	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	1,00	133,99	133,99	0,00	133,99	0,00	
03.08.005	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	2,00	0,00	0,00	2,00	68,10	136,20	0,00	136,20	0,00	
03.08.006	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saio cimento 50kg / 5 pedidas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Condição mecânica e transporte	m³	10,57	0,00	10,57	0,00	495,04	5.232,57	0,00	5.232,57	0,00	
03.08.007	Lona plástica preta	m2	903,75	0,00	903,75	0,00	5,28	4.771,80	4.771,80	0,00	0,00	
03.08.008	TOTAL		903,75	0,00	903,75	0,00	5,28	4.771,80	4.771,80	0,00	0,00	
								R\$ 370.821,63	R\$ 179.823,02	R\$ 338.363,21	R\$ 32.488,15	
								100,00%	49,22%	91,24%	8,76%	

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.

DATA:

MARTINS Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8
Pág. CIVIL Dinesh Kumar - CREA: 270097088-8

APROVADO PARA PAGAMENTO

Valor Aprovado:<



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
CONTROLADORIA MUNICIPAL

CHECK LIST

PARA PAGAMENTO DE OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA

Processo nº: 245, 246, 247, 248, 249, 250 Vigência: 22/01/24 A 22/01/25
Empresa Contratada: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA
Resumo do objeto: REFORMA DE PRAÇAS
Fonte de Recurso: 17200000
Medição: 3ª – 01/04/24 A 10/06/24

ITENS	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Nota Fiscal contendo Nº do empenho/Ano, Modalidade – Número/Ano da Licitação e Nº do Contrato/Ano.	X		DATA 10/06/24
ORDEM DE SERVIÇOS		X	
Planilha de medição da obra, assinado pelo Engenheiro responsável e fiscal	X		
REGISTRO FOTOGRÁFICO	X		
RELATÓRIO DIÁRIO DA OBRA	X		
CERTIDÃO DO CREA - PESSOA FÍSICA		X	
CERTIDÃO DO CREA - PESSOA JURÍDICA		X	
Cópia do comprovante de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART DE EXECUÇÃO	X		
Cópia do comprovante de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART DE FISCALIZAÇÃO		X	
Certidão de Regularidade do FGTS	X		24/05 A 22/06/2024
Certidão Negativa de Tributos Municipais	X		06/06 A 05/08/2024
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais e Dívida Ativa da União	X		20/05 A 16/11/2024
Certidão Negativa de Tributos Estaduais	X		03/06 A 03/07/2024
Certidão de Regularidade Trabalhista	X		22/02 A 20/08/2024
Extrato de Optante ou de Não Optante pelo Simples	X		
Cadastro Nacional de Obras - CNO	X		
Recolhimento do INSS relativo aos funcionários (Guia da Previdência Social – (GPS).	X		
Recolhimento do FGTS relativo aos funcionários (Guia de Recolhimento do FGTS – (GRF).	X		

VALOR DO CONTRATO + ADITIVO	MEDIÇÃO	VALOR	SALDO
370.821,53	1ª		
	2ª		
	3ª	159.530,19	32.468,15

Pirambu, 13/06/2024.


Katia Sirlene Cardoso dos Santos
Secretária de Controle Interno
Pirambu, 13/06/2024



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240372776

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

MANOEL MESSIAS SOARES NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2717976612**

Registro: **2717976612SE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pirambu**

RUA RUA GIVALDO MOURA DA SILVA

Complemento:

Cidade: **PIRAMBU**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

CPF/CNPJ: **13.095.039/0001-81**

Nº: **16**

CEP: **49190000**

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 0,00**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA PIRAMBU

Complemento: **Conjunto Reinaldo Moura**

Cidade: **PIRAMBU**

Data de Início: **05/02/2024**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Pirambu**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

Nº: **s/n**

CEP: **49190000**

Previsão de término: **05/05/2024**

Coordenadas Geográficas: **-10.738536, -36.856371**

Código: **49190-000**

CPF/CNPJ: **13.095.039/0001-81**

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO

Quantidade

Unidade

1.366,95

m2

1.366,95

m2

286,00

m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART referente ao serviço de fiscalização, de construção de 01(uma praça) localizada no conjunto Reinaldo Moura e Reforma de 02(duas) praças no conjunto Lourival Bomfim, na Sede do Município de Pirambu-SE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

Documento assinado digitalmente

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE



MANOEL MESSIAS SOARES NETO

Data: 02/04/2024 15:01:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MANOEL MESSIAS SOARES NETO - CPF: 049.126.295-70

Local

data

Prefeitura Municipal de Pirambu - CNPJ: 13.095.039/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 99,64**

Registrada em: **01/04/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **8203072119**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0CdDd
 Impresso em: 02/04/2024 às 15:00:34 por: , ip: 177.37.182.91

www.crea-se.org.br
 Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br
 Fax: XXXX-XXXX

CREA-SE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia de Sergipe





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240372776

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

MANOEL MESSIAS SOARES NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2717976612

Registro: 2717976612SE

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pirambu**

RUA RUA GIVALDO MOURA DA SILVA

Complemento:

Cidade: **PIRAMBU**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

Nº: 16

CEP: 49190000

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 0,00**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA PIRAMBU

Complemento: **Conjunto Reinaldo Moura**

Cidade: **PIRAMBU**

Data de Início: **05/02/2024**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Pirambu**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

Código: **49190-000**

Nº: s/n

CEP: 49190000

Coordenadas Geográficas: -10.738536, -36.856371

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO

Quantidade

Unidade

1.366,95

m2

1.366,95

m2

286,00

m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART referente ao serviço de fiscalização, de construção de 01(uma praça) localizada no conjunto Reinaldo Moura e Reforma de 02(duas) praças no conjunto Lourival Bomfim, na Sede do Município de Pirambu-SE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

Documento assinado digitalmente

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE



MANOEL MESSIAS SOARES NETO

Data: 02/04/2024 15:01:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MANOEL MESSIAS SOARES NETO - CPF: 049.126.295-70

Local _____ de _____ de _____
data

Prefeitura Municipal de Pirambu - CNPJ: 13.095.039/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 99,64**

Registrada em: **01/04/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **8203072119**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0CdDd
Impresso em: 02/04/2024 às 15:00:34 por: , ip: 177.37.182.91

www.crea-se.org.br
Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br
Fax: XXXX-XXXX





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

JUNHO/2024

Nota de Liquidação: 0619134

Fonte: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Data: 19/06/2024

FORNECEDOR

Nome: MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF: 15190486000145

Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 34

Compl:

Bairro: CENTRO

Cidade: Japaratuba

UF: SE

E-mail: 1@

Telefone: (79)3213-0564

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 22063

Operação:

Conta: 1100009

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: 15 Urbanismo
SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana
Programa: 0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
Ação: 1055 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações
SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo
Fonte: 17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Marcador: 17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Centro Custo:

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0603005	03/06/2024	12.967,60	7.586,64	5.380,96

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO Nº 22/2024 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM (MENOR) DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

PARTE DA NOTA FISCAL 021/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO Nº 22/2024 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM (MENOR) DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023.

Documento	Valor
Nota Fiscal (21 / Série: A / UF: SE / Emissão: 10/06/2024)	7.586,64

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	7.586,64

SETE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 7.586,64



Nº Processo
0000529

Nº Fila
250

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

TERMO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 15.190.486/0001-45

Nome: MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA GETULIO VARGAS

Bairro: CENTRO

E-mail: 1@

Compl:

Cidade: Japaratuba

Telefone: (79)3213-0564

UF: SE

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Conta:

EMPENHO	EMIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	FONTE
0603005	03/06/2024	1055.44905100-17200000	Global	Transferências do Orçamento Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO Nº 22/2024 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM (MENOR) DESTA MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023.

Documentação	
Nota Fiscal	21
Valor	R\$ 7.586,64
Emissão	10/06/2024
Horário de Entrega	13/06/2024 10:22:19

Para acompanhar o andamento do seu processo na fila pública, acesse o link abaixo:

<http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pirambu/fornecedor/filapagamento>

Cadastrado por: Santiago Santos Gois



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento Tributário - Praça 16 de Outubro, Nº 135, Centro - Carmópolis/SE, CEP: 49.7490-000 Telefone: (79) 3277-1210

Nota: 2024000

00000021

Código Verificação

AINM-HEYI



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

10/06/2024 05:59:46

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

06/2024

Exigibilidade do ISS

Exigível em Pirambu

Município de Prestação do Serviço

Pirambu - SE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

Nome Fantasia

MARTINS ENGENHARIA

CPF/CNPJ

15.190.486/0001-45

Inscrição Municipal

200052591

Inscrição Estadual

271630531

Simples Nacional

Não

Email

marcos@martinslocserv.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 99988-9649

Endereço

RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS, SN, Santa Barbara - CEP: 49740-000 - Carmópolis - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

prefeitura municipal pirambu

CPF/CNPJ

13.095.039/0001-81

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3276-1203

E-mail

pirambu@pirambu.com.br

Endereço

(Localidade), 16, praça nossa senhora de lurdes - Não informado - CEP: 49190-000 - Pirambu - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4399103

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO VALOR TOTAL DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRACAS LOC. NO CONJ. REINALDO MOURA E CONJ. LORIVAL BOMFIM - PIRAMBU/SE. CONTRATO MUNICIPAL Nº 04/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023.

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2024 A 10/06/2024.

PRAÇA LOURIVAL BOMFIM- R\$ 31.033,90
PRAÇA LOURIVAL BOMFIM MENOR - R\$ 18.024,30
PRAÇA REINALDO MOURA - R\$ 110.471,99

Material 60%

Mão de Obra 40%

DADOS BANCARIOS:

BANCO DO BRASIL

AG: 2206-3

CONTA CORRENTE: 110.000-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
DECLARO QUE

- ☒ Os serviços foram prestados
☐ Os produtos foram entregues
☐ A obra foi executada

Data: 19/06/2024

Assinatura do Responsável
Carimbo da Prefeitura Municipal de Pirambu
Data: 27/07/2024

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)
1.036,95

COFINS (R\$)
4.785,91

INSS (R\$)
0,00

IR (R\$)
2.392,95

CSLL (R\$)
1.595,30

Outras Retenções (R\$)
0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)
159.530,19

Deduções (R\$)
95.718,10

Desconto Incondicionado (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
63.812,09

Alíquota (%)
5,00

ISS (R\$)
3.190,60

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)
0,00

Valor Líquido (R\$)
149.719,08

Valor Total da Nota (R\$)
159.530,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 21.456,81 Federal e R\$ 7.976,51 Municipal. Fonte: IBPT [691A69]

Substitui nota 202400000000019 de 07/06/2024

Visualizado em: 10/06/2024 05:59:45

Para validação desta NFSe acesse: <http://carmopolisse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

RECEBIDO

Em 19/06/2024

Obra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBUISE.

Contratada: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

Prazo: 03 MESES+ 03 MESES(ADITIVO)

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades				Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)				% Medido		
			Contratada+ Aditivo	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Saldo a medir	Contratado + Contrato	Acumulado Anterior	Do Período		Acumulado até o Período	Saldo a medir
01.05.004	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 6m a 8 m	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1.337,27	1.337,27	0,00	1.337,27	0,00	100,00	
01.05.005	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	53,69	859,04	0,00	859,04	0,00	100,00	
01.05.006	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusiva peças principais	m2	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	112,13	2.803,25	0,00	2.803,25	0,00	100,00	
01.05.007	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, lãbalanilha ou similar - Rev.02	m2	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	60,77	1.519,25	0,00	1.519,25	0,00	100,00	
01.05.008	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev.01	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2.119,81	2.119,81	0,00	2.119,81	0,00	100,00	
01.05.009	Eletroduto de pvc rígido rosável, diâm = 25mm (3/4")	m	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	15,10	377,50	0,00	377,50	0,00	100,00	
01.05.010	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/750v / 70°C	m	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	12,46	1.619,80	0,00	1.619,80	0,00	100,00	
01.05.011	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	125,43	125,43	0,00	0,00	125,43	0,00	
01.05.012	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,79	20,79	0,00	0,00	20,79	0,00	
01.05.013	Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto	pt	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	69,76	139,56	0,00	0,00	139,56	0,00	
01.05.014	Ponto de interruptor 01 seção simples c/placa, com canalização plástica c/visória 20x10mm	pt	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	288,86	288,86	0,00	0,00	288,86	0,00	
01.05.015	Luminária fluorescente tubular 2 x 20 w / 127 v, completa	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	160,59	321,18	0,00	0,00	321,18	0,00	
01.05.016	Mesa c/ tampo: Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, 2 bancos em concreto armado (semi circular), com pintura acrílica.	Un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.291,52	1.291,52	0,00	0,00	1.291,52	0,00	
01.06	CANTEIRO												100,00	
01.06.001	Melo-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	100,45	100,45	0,00	100,45	0,00	32,87	3.301,79	3.301,79	0,00	3.301,79	0,00	100,00
01.06.002	Pintura de melo fio (calafate)	m	100,45	0,00	0,00	0,00	100,45	4,64	466,09	0,00	0,00	466,09	0,00	
01.07	SERVIÇOS FINAIS													
01.07.001	Marco Inaugural - Rev. 01	Un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	677,66	677,66	0,00	677,66	0,00	100,00	
01.07.002	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	m2	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	877,61	307,16	0,00	0,00	307,16	0,00	
01.08	ADITIVO													
01.08.001	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento	Un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2.107,58	2.107,58	0,00	2.107,58	0,00	100,00	
01.08.002	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,8 m de solo (não inclui fundecimento), al. 11/2019	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1.059,02	1.059,02	0,00	1.059,02	0,00	100,00	
01.08.003	Caixa pré moldada em concreto c/ampara para aterramento (20x20x15)cm, padrão Nregisa	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	18,07	18,07	0,00	18,07	0,00	100,00	
01.08.004	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	149,34	448,02	0,00	448,02	0,00	100,00	
01.08.005	Eletroduto de pvc rígido rosável, diâm = 32mm (1")	m	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	16,15	581,40	0,00	581,40	0,00	100,00	
01.08.006	Quadro de distribuição de embulitr, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	133,99	133,99	0,00	0,00	133,99	0,00	
01.08.007	Demolição manual de piso orientado sobre lastro de concreto - Rev.01	m2	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	24,17	1.109,40	0,00	1.109,40	0,00	100,00	
01.08.008	Demolição de melo-fio de concreto - Rev.01	m	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	9,28	425,95	0,00	425,95	0,00	100,00	

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

2/6

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BONFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.										BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 22/2023 ORDEN DE SERVIÇO Nº Data da medição: 10/06/2024			
Obra:										B.M.Nº: 03				Período: 01/04/2024 À 10/06/2024			
Contratada: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA										Valores (R\$)							
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU																	
Prazo: 03 MESES+ 03 MESES(ADITIVO)																	
Discriminação dos Serviços										Quantidades				Preço Unit. (R\$)			
Item	Und	Contratada+ Aditivo	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Contratado + Contrato	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	% Medido					
01.08.009	m3	2,93	0,00	2,93	2,93	0,00	335,28	0,00	335,28	335,28	0,00	100,00					
01.08.010	m2	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	1.241,95	0,00	1.241,95	1.241,95	0,00	100,00					
01.08.011	m2	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	188,28	0,00	188,28	188,28	0,00	100,00					
01.08.012	m2	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	1.042,02	0,00	1.042,02	1.042,02	0,00	100,00					
01.08.013	m3	1,33	0,00	1,33	1,33	0,00	765,82	0,00	765,82	765,82	0,00	100,00					
01.08.014	m2	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	532,53	0,00	532,53	532,53	0,00	100,00					
01.08.015	un	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	136,20	0,00	136,20	136,20	0,00	100,00					
01.08.016	m2	368,20	0,00	368,20	368,20	0,00	1.944,10	0,00	1.944,10	1.944,10	0,00	100,00					
02							69.717,95	46.312,69	18.024,30	64.336,98	5.380,97	92,28					
02.01							5.513,44	5.513,44	0,00	5.513,44	0,00	100,00					
02.01.001	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	488,65	488,65	0,00	488,65	0,00	100,00					
02.01.002	m2	253,61	253,61	0,00	253,61	0,00	2.931,73	2.931,73	0,00	2.931,73	0,00	100,00					
02.01.003	m2	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	200,20	200,20	0,00	200,20	0,00	100,00					
02.01.004	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1.892,86	1.892,86	0,00	1.892,86	0,00	100,00					
02.02							34.984,41	32.498,35	0,00	32.498,35	2.486,06	92,88					
02.02.001	m2	253,61	253,61	0,00	253,61	0,00	7.113,76	7.113,76	0,00	7.113,76	0,00	100,00					
02.02.002	m2	253,61	253,61	0,00	253,61	0,00	12.721,08	12.721,08	0,00	12.721,08	0,00	100,00					
02.02.003	m2	253,61	0,00	0,00	0,00	253,61	2.498,06	0,00	0,00	0,00	2.498,06	0,00	100,00				
02.02.004	un	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	902,06	902,06	0,00	902,06	0,00	100,00					
02.02.005	m3	50,72	50,72	0,00	50,72	0,00	6.533,75	6.533,75	0,00	6.533,75	0,00	100,00					
02.02.006	m3	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5.225,70	5.225,70	0,00	5.225,70	0,00	100,00					
02.03							288,90	288,90	0,00	288,90	0,00	100,00					
02.03.001	m2	12,60	12,60	0,00	12,60	0,00	22,77	286,90	0,00	286,90	0,00	100,00					
02.04							87,12	906,05	0,00	906,05	0,00	100,00					
02.04.001	m	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40	3.003,34	3.003,34	0,00	3.003,34	0,00	100,00					
02.04.002	m	14,14	14,14	0,00	14,14	0,00	4.581,23	4.581,23	0,00	4.581,23	0,00	100,00					
02.04.003	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1.172,73	1.172,73	0,00	1.172,73	0,00	100,00					
02.04.004	un	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	390,91	0,00	0,00	0,00	1.172,73	0,00	100,00				

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 200097088-8

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.										BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 22/2023 ORDEN DE SERVIÇO Nº Data da medição: 10/08/2024			
Contratada: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA										B.M.Nº: 03 Período: 01/04/2024 À 10/08/2024				MARTINS Locação e Serviços			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU 03 MESES+ 03 MESES(ADITIVO)										Preço Unit. (R\$)				Valores (R\$)			
Prazo: 03 MESES+ 03 MESES(ADITIVO)										Quantidades				Do Período			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada+ Aditivo	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Contratado + Contrato	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido				
02.05	CANTEIRO																
02.05.001	Melo-flo de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	63,53	63,53	0,00	63,53	0,00	2.383,01	2.088,23	0,00	2.088,23	294,78	87,83				
02.05.002	Plintura de melo flo (calçada)	m	63,53	0,00	0,00	0,00	63,53	2.088,23	2.088,23	0,00	2.088,23	0,00	100,00				
02.08	SERVIÇOS FINAIS																
02.06.001	Marco Inaugural - Rev. 01	Un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	994,82	0,00	677,66	677,66	307,16	68,81				
02.06.002	Placa em acrílico branco letoso dupla, tipo sanduíche, com aplicação de adesivo sobreposto	m2	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	677,66	0,00	677,66	677,66	0,00	100,00				
02.07	RECUPERAÇÃO DE TALUDE																
02.07.001	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m2	127,76	127,76	0,00	127,76	0,00	2.924,43	2.924,43	0,00	2.924,43	0,00	100,00				
02.07.002	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	127,76	127,76	0,00	127,76	0,00	2.909,10	2.909,10	0,00	2.909,10	0,00	100,00				
02.08	ADITIVO																
02.08.001	Entrada de energia elétrica bitásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	12.967,76	0,00	12.785,57	12.785,57	202,14	98,44				
02.08.002	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento	Un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2.119,81	0,00	2.119,81	2.119,81	0,00	100,00				
02.08.003	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,8 m de solo (não inclui fornecimento), af. 11/2019	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2.107,58	0,00	2.107,58	2.107,58	0,00	100,00				
02.08.004	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	298,68	0,00	298,68	298,68	0,00	100,00				
02.08.005	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 32mm (1")	m	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	323,00	0,00	322,95	322,95	0,00	99,98				
02.08.006	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70 °c	m	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	934,50	0,00	934,50	934,50	0,00	100,00				
02.08.007	Demolição de melo-flo granítico ou pré-moldado	m	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	570,72	0,00	570,72	570,72	0,00	100,00				
02.08.008	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, com reaproveitamento, af. 09/2023	m3	12,30	0,00	12,30	12,30	0,00	114,43	0,00	1.407,45	1.407,45	0,04	100,00				
02.08.009	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	71,96	0,00	71,96	71,96	0,00	100,00				
02.08.010	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,70 x 0,70 x 0,80m	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	585,05	0,00	585,05	585,05	0,00	100,00				
02.08.011	Concreto magro para lastro, traço 1:4:5,4:5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m3	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	90,47	0,00	90,47	90,47	0,00	100,00				
02.08.012	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	632,05	0,00	632,04	632,04	0,01	100,00				
02.08.013	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	187,63	0,00	187,63	187,63	0,00	100,00				
02.08.014	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	963,10	0,00	963,10	963,10	0,00	100,00				
02.08.015	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 25mm (3/4")	m	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	75,54	0,00	75,54	75,54	0,00	100,00				
02.08.016	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00				
02.08.017	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	133,99	0,00	0,00	0,00	133,99	0,00				
02.08.018	Lona plástica preta	m2	253,61	0,00	253,61	253,61	0,00	1.339,07	0,00	1.339,07	1.339,07	0,00	100,00				
03	PRACA REINALDO MOURA																
03.01	SERVIÇOS PRELIMINARES																
03.01.001	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metal 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev.02 - 09/2021	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	199.303,16	70.535,63	110.471,99	181.007,69	18.295,49	90,82				
03.01.002	Locação de praças com piluletes de madeira	m2	738,75	738,75	0,00	738,75	0,00	6.533,28	6.533,28	0,00	6.533,28	0,00	100,00				
								568,84	568,84	0,00	568,84	0,00	100,00				

Martins Engenharia
Dinesh/Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades				Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)				% Medido
			Contratada+ Aditivo	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratada + Contrato	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	
03.01.003	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev.01	un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.892,86	1.892,86	1.892,86	0,00	1.892,86	100,00
03.01.004	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	738,75	738,75	0,00	738,75	4,85	3.582,94	3.582,94	0,00	3.582,94	100,00
03.02	PAVIMENTAÇÃO							97.720,94	41.711,72	47.106,90	88.819,01	90,89
03.02.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	903,75	389,38	534,37	903,75	28,05	25.350,18	10.360,97	14.989,08	25.350,18	100,00
03.02.002	Piso em concreto simples desarmado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - Ites usos	m2	903,75	389,38	534,37	903,75	50,16	45.332,10	18.527,85	26.804,00	45.332,10	100,00
03.02.003	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	903,75	0,00	0,00	0,00	9,85	8.901,94	0,00	0,00	8.901,94	0,00
03.02.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desarmado, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00	1,00	0,00	1,00	451,03	451,03	451,03	0,00	451,03	100,00
03.02.005	Colação de areia	m3	137,29	96,04	41,25	137,29	126,82	17.685,70	12.371,87	5.313,83	17.685,70	100,00
03.03	PAISAGISMO							1.345,25	0,00	605,23	605,23	44,99
03.03.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	59,08	0,00	26,58	26,58	22,77	1.345,25	0,00	605,23	605,23	44,99
03.04	DIVERSOS							48.873,87	16.186,88	28.068,06	44.252,84	94,41
03.04.001	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev.01	un	1,00	1,00	0,00	1,00	2.565,57	2.565,57	2.565,57	0,00	2.565,57	100,00
03.04.002	Equipamento de ginástica - Baras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1,1/2" - Serigrafik ou similar	Un	1,00	1,00	0,00	1,00	868,08	868,08	868,08	0,00	868,08	100,00
03.04.003	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Serigrafik ou similar	Un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.112,40	1.112,40	1.112,40	0,00	1.112,40	100,00
03.04.004	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 unidades, Serigrafik ou similar	Un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.112,40	1.112,40	1.112,40	0,00	1.112,40	100,00
03.04.005	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	117,00	28,00	89,00	117,00	212,40	24.850,80	5.947,20	18.903,60	24.850,80	100,00
03.04.006	Fornecimento de Luminária 04 pólulas em Led, iluminação pública, 180w, 4000K, 220v, e suporte em tubo aço galv. com Anteparo, da Ilumalic, mod LPL Ares ou similar	un	3,00	1,00	2,00	3,00	4.581,23	13.743,69	4.581,23	9.162,46	13.743,69	100,00
03.04.007	Livelaes em eucalipto perfurado e autoclavado 0,45m x 0,45m x 0,53m	un	3,00	0,00	0,00	0,00	380,91	1.172,73	0,00	0,00	1.172,73	0,00
03.04.008	Banco em eucalipto perfurado autoclavado com 1,60m x 0,45m x 0,85m	un	2,00	0,00	0,00	0,00	724,10	1.448,20	0,00	0,00	1.448,20	0,00
03.05	QUIOSQUE							19.324,20	2.119,81	12.311,75	14.431,56	74,68
03.05.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,50	0,00	0,50	0,50	2.638,44	1.319,22	0,00	1.319,22	1.319,22	100,00
03.05.002	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, anelão ou madeira de lei	m3	0,69	0,00	0,69	0,69	4.144,93	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	100,00
03.05.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	16,96	0,00	16,96	16,96	17,79	301,72	0,00	301,72	301,72	100,00
03.05.004	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 6m a 8m	un	1,00	0,00	1,00	1,00	1.337,27	1.337,27	0,00	1.337,27	1.337,27	100,00
03.05.005	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com aberturas de encaixes	m	16,00	0,00	16,00	16,00	53,69	859,04	0,00	859,04	859,04	100,00
03.05.006	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, excluindo peças principais	m2	25,00	0,00	25,00	25,00	112,13	2.803,25	0,00	2.803,25	2.803,25	100,00
03.05.007	Reforço com tela cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabanhita ou similar - Rev.02	m2	25,00	0,00	25,00	25,00	60,77	1.519,25	0,00	1.519,25	1.519,25	100,00
03.05.008	Entrada de energia elétrica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev.01	un	1,00	1,00	0,00	1,00	2.119,81	2.119,81	2.119,81	0,00	2.119,81	100,00

Obra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBUÍSE.			BOLETIM DE MEDIÇÃO			CONTRATO Nº 22/2023 ORDEN DE SERVIÇO Nº MARTINS Locação e Serviços		
Contratada: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA			B.M.Nº: 03 Período: 01/04/2024 À 10/08/2024			Data da medição: 10/08/2024		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU			Quantidades			Valores (R\$)		
Prazo: 03 MESES+ 03 MESES(ADITIVO)			Und	Contratada+ Aditivo	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada Anterior	Contratado + Contrato
Discriminação dos Serviços			Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Acumulado até o Período	% Medido
03.05.009	Eletróduto de pvc rígido rosçável, diâm = 25mm (3/4")	m	0,00	25,00	10,00	15,10	377,50	151,00
03.05.010	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450V 750V / 70°C	m	0,00	75,00	205,00	12,46	934,50	2.554,30
03.05.011	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	0,00	0,00	1,00	125,43	0,00	125,43
03.05.012	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5kA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	0,00	0,00	1,00	20,79	0,00	20,79
03.05.013	Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto	p/c	0,00	0,00	2,00	69,78	0,00	139,56
03.05.014	Ponto de interruptor 01 seção simples o/placa, com canalização plástica c/divisória 20x10mm	p/c	0,00	0,00	1,00	288,86	0,00	288,86
03.05.015	Luminária fluorescente tubular 2 x 20 w / 127 v, completa	un	0,00	0,00	2,00	160,59	0,00	321,18
03.05.016	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m. 2 bancos em concreto armado (sem circulação), com pintura acrílica.	un	0,00	0,00	1,00	1.291,52	0,00	1.291,52
03.06	CANTEIRO						3.963,84	582,37
03.06.001	Melo-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	121,20	0,00	121,20	32,87	3.963,84	0,00
03.06.002	Pintura de melo fio (calçada)	m	121,20	0,00	0,00	4,64	562,37	0,00
03.07	SERVIÇOS FINAIS						984,82	307,16
03.07.001	Marco inaugural - Rev. 01	un	0,00	1,00	0,00	677,66	677,66	0,00
03.07.002	Placa em acrílico branco lético dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	m2	0,35	0,00	0,35	877,61	307,16	0,00
03.08	ADITIVO						21.974,56	270,19
03.08.001	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento	un	0,00	3,00	0,00	2.107,58	6.322,74	0,00
03.08.002	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,8 m de solo (não inclui fornecimento), af. 11/2019	un	0,00	3,00	0,00	1.059,02	3.177,06	0,00
03.08.003	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, diâm. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	0,00	5,00	0,00	149,34	746,70	0,00
03.08.004	Eletróduto de pvc rígido rosçável, diâm = 32mm (1")	m	0,00	90,00	0,00	16,15	1.453,50	0,00
03.08.005	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	0,00	0,00	1,00	133,99	0,00	133,99
03.08.006	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	un	0,00	0,00	2,00	68,10	0,00	136,20
03.08.007	Alvenaria pedra calcária agamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 sacco cimento 50kg / 5 pedreiras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Colocação mecânica e transporte	m3	0,00	10,57	0,00	495,04	5.232,57	0,00
03.08.008	Lona plástica preta	m2	903,75	903,75	0,00	5,28	4.771,80	0,00
TOTAL			903,75	903,75	903,75	5,28	R\$ 370.821,53	R\$ 370.821,53
Porcentagem			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 370.821,53	R\$ 370.821,53
ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.			APROVADO PARA PAGAMENTO			DATA:		
Martins Engenharia Dinesh Kumar Engenheiro Civil CREA: 270097088-8 MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA Eng Civil Dinesh Kumar - CREA 270097088-8			Valor Aprovado:			R\$ 159.530,19		
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA			Valor Nota Fiscal:			R\$ 32.488,15		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

JUNHO/2024

Nota de Liquidação: 0619130

Fonte: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Data: 19/06/2024

FORNECEDOR

Nome:

MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF:

15190486000145

Endereço:

RUA GETULIO VARGAS, 34

Compl:

Bairro:

CENTRO

Cidade:

Japaratuba

UF:

SE

E-mail:

1@

Telefone:

(79)3213-0564

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

001 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

22063

Operação:

Conta:

1100009

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:

0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Função:

15 Urbanismo

SubFunção:

451 Infraestrutura Urbana

Programa:

0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Ação:

1055 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

Natureza Despesa:

44905100 Obras e Instalações

SubElemento:

44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo

Fonte:

17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Marcador:

17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Centro Custo:

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0603007	03/06/2024	55.488,08	37.192,44	18.295,64

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO Nº 22/2024, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO REINALDO MOURA DESTES MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

PARTE DA NOTA FISCAL 21/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO Nº 22/2024, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO REINALDO MOURA DESTES MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023.

Documento	Valor
Nota Fiscal (21 / Série: A / UF: SE / Emissão: 10/06/2024)	37.192,44

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	37.192,44

TRINTA E SETE MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Retido:

0,00

Total Liquido:

37.192,44



Nº Processo
0000525

Nº Fila
246

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

TERMO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 15.190.486/0001-45
Nome: MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA GETULIO VARGAS
Bairro: CENTRO
E-mail: 1@

Compl:
Cidade: Japaratuba
Telefone: (79)3213-0564

UF: SE
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência: 22063

Conta: 1100009

EMPENHO	EMIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	FONTE
0603007	03/06/2024	1055.44905100-17200000	Global	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FED - Lei 9.478/1997

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO Nº 22/2024, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO REINALDO MOURA DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023.

Documentação	
Nota Fiscal	21
Valor	R\$ 37.192,44
Emissão	10/06/2024
Horário de Entrega	13/06/2024 10:05:12

Para acompanhar o andamento do seu processo na fila pública, acesse o link abaixo:

<http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pirambu/fornecedor/filapagamento>

Cadastrado por: Santiago Santos Gois



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento Tributário - Praça 16 de Outubro, Nº 135, Centro - Carmópolis/SE, CEP: 49.7490-000 Telefone: (79) 3277-1210

Nota: 2024000

00000021

Código Verificação

AINM-HEYI



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

10/06/2024 05:59:46

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

06/2024

Exigibilidade do ISS

Exigível em Pirambu

Município de Prestação do Serviço

Pirambu - SE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

Nome Fantasia

MARTINS ENGENHARIA

CPF/CNPJ

15.190.486/0001-45

Inscrição Municipal

200052591

Inscrição Estadual

271630531

Simples Nacional

Não

Email

marcos@martinslocserv.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 99988-9649

Endereço

RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS, SN, Santa Barbara - CEP: 49740-000 - Carmópolis - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

prefeitura municipal pirambu

CPF/CNPJ

13.095.039/0001-81

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3276-1203

E-mail

pirambu@pirambu.com.br

Endereço

(Localidade), 16, praça nossa senhora de lurdas - Não informado - CEP: 49190-000 - Pirambu - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4399103

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO VALOR TOTAL DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇA LOC. NO CONJ. REINALDO MOURA E CONJ. LORIVAL BOMFIM - PIRAMBU/SE. CONTRATO MUNICIPAL Nº 04/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023.

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2024 A 10/06/2024.

PRAÇA LOURIVAL BONFIM- R\$ 31.033,90

PRAÇA LOURIVAL BONFIM MENOR - R\$ 18.024,30

PRAÇA REINALDO MOURA - R\$ 110.471,99

Material 60%

Mão de Obra 40%

DADOS BANCARIOS:

BANCO DO BRASIL

AG: 2206-3

CONTA CORRENTE: 110.000-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
DECLARO QUE

- ☒ Os serviços foram prestados
☐ Os produtos foram entregues
☐ A obra foi executada

Data: 19/06/2024

Assinatura: [Assinatura]
Carimbo: [Carimbo]

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
1.036,95	4.785,91	0,00	2.392,95	1.595,30	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
159.530,19	95.718,10	0,00	63.812,09	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
3.190,60	*****	0,00	149.719,08	159.530,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 21.456,81 Federal e R\$ 7.976,51 Municipal. Fonte: IBPT [691A69]

Substitui nota 202400000000019 de 07/06/2024

Visualizado em: 10/06/2024 05:59:45

Para validação desta NFS-e acesse: <http://carmopolisse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

RECEBIDO

Em 12/06/24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BONFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.										BOLETIM DE MEDIÇÃO			CONTRATO Nº 22/2023		MARTINS Locação e Serviços	
MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA										B.M.Nº: 03			ORDEN DE SERVIÇO Nº		Data da medição: 10/06/2024	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU										Período: 01/04/2024 A 10/06/2024			Valores (R\$)			
03 MESES+ 03 MESES(ADITIVO)																
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades			Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)				% Medido				
			Contratada+ Aditivo	Acumulada Anterior	Do Período			Acumulada Anterior	Contratado + Contrato	Do Período	Acumulado até o Período					
01	PRAÇA MAIOR LOURIVAL BONFIM															
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES															
01.01.001	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev.02 - 09/2021	un	1,00	1,00	0,00	1,00	488,63	488,63	488,63	0,00	488,63	0,00	100,00			
01.01.002	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	368,20	368,20	0,00	368,20	11,56	4.256,39	4.256,39	0,00	4.256,39	0,00	100,00			
01.01.003	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	368,20	368,20	0,00	368,20	0,77	283,51	283,51	0,00	283,51	0,00	100,00			
01.01.004	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev.01	un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.892,86	1.892,86	1.892,86	0,00	1.892,86	0,00	100,00			
01.02	PAVIMENTAÇÃO															
01.02.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	368,20	368,20	0,00	368,20	50,16	18.468,91	18.468,91	0,00	18.468,91	0,00	100,00			
01.02.002	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - lres usos	m2	368,20	368,20	0,00	368,20	9,85	3.626,77	0,00	0,00	0,00	3.626,77	0,00			
01.02.003	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	368,20	0,00	0,00	0,00	451,03	451,03	451,03	0,00	451,03	0,00	100,00			
01.02.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00	1,00	0,00	1,00	128,82	9.481,15	9.481,15	0,00	9.481,15	0,00	100,00			
01.02.005	Colchão de areia	m3	73,60	73,60	0,00	73,60	0,00	914,22	914,22	0,00	914,22	0,00	100,00			
01.03	PAISAGISMO															
01.03.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	40,15	40,15	0,00	40,15	22,77	914,22	914,22	0,00	914,22	0,00	100,00			
01.04	DIVERSOS															
01.04.001	Corrimão em aço inox, esvovado, d=1 1/2"	m	8,74	0,00	0,00	0,00	87,12	761,43	0,00	0,00	0,00	761,43	0,00			
01.04.002	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev.01	un	1,00	1,00	0,00	1,00	2.565,57	2.565,57	2.565,57	0,00	2.565,57	0,00	100,00			
01.04.003	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv, ø=1 1/2", Seripaik ou similar	Un	1,00	1,00	0,00	1,00	868,08	868,08	868,08	0,00	868,08	0,00	100,00			
01.04.004	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Seripaik ou similar	Un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.112,40	1.112,40	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00	100,00			
01.04.005	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv, ø=2", conjunto com 03 unidades, Seripaik ou similar	Un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.112,40	1.112,40	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00	100,00			
01.04.006	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	23,13	23,13	0,00	23,13	212,40	4.912,81	4.912,81	0,00	4.912,81	0,00	100,00			
01.04.007	Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, iluminação pública, 180w, 4000K, 220v, e suporte em tubo aço galv, com Antepar, da Ilumalic, mod LPL Ares ou similar	un	1,00	1,00	0,00	1,00	4.581,23	4.581,23	4.581,23	0,00	4.581,23	0,00	100,00			
01.04.008	Lixeiras em eucalipto perfurado e autoclavado 0,45m x 0,45m x 0,53m	un	3,00	0,00	0,00	0,00	390,91	1.172,73	0,00	0,00	0,00	1.172,73	0,00			
01.05	QUIOSQUE															
01.05.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,65	0,00	0,65	0,65	2.638,44	1.714,99	0,00	1.714,99	1.714,99	0,00	100,00			
01.05.002	Pilar e vigas de madeira seção 10x16cm a 20x20cm, em massaranduba, angelim ou madeira de lei	m3	0,69	0,00	0,69	0,69	4.144,93	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	100,00			
01.05.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	16,96	0,00	16,96	16,96	17,79	301,72	0,00	301,72	301,72	0,00	100,00			
													Martins Engenharia			

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BONFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBUSE.										BOLETIM DE MEDIÇÃO			CONTRATO Nº 22/2023		MARTINS Locação e Serviços	
Obra: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA										B.M.Nº: 03			ORDEN DE SERVIÇO Nº		Data da medição: 10/06/2024	
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU										Período: 01/04/2024 A 10/06/2024			Valores (R\$)			
Prazo: 03 MESES+ 03 MESES(ADITIVO)										Preço Unit. (R\$)	Contratado + Contrato	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada+ Aditivo	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir									
01.08.009	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, com reaparelhamento. af. 09/2023	m3	2,93	0,00	2,93	2,93	0,00	114,43	335,28	0,00	335,28	0,00	335,28	0,00	100,00	
01.08.010	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço 15 - 1:2,8 (cimento/calareia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	63,69	1.241,95	0,00	1.241,95	0,00	1.241,95	0,00	100,00	
01.08.011	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Rev.08/2015	m2	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	6,47	188,28	0,00	188,28	0,00	188,28	0,00	100,00	
01.08.012	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	35,81	1.042,02	0,00	1.042,02	0,00	1.042,02	0,00	100,00	
01.08.013	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,33	0,00	1,33	1,33	0,00	575,80	765,82	0,00	765,82	0,00	765,82	0,00	100,00	
01.08.014	Remoção e reassentimento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	59,17	532,53	0,00	532,53	0,00	532,53	0,00	100,00	
01.08.015	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	68,10	136,20	0,00	136,20	0,00	136,20	0,00	100,00	
01.08.016	Lona plástica preta	m2	368,20	0,00	368,20	368,20	0,00	5,28	1.944,10	0,00	1.944,10	0,00	1.944,10	0,00	100,00	
02	PRACA MENOR LOURIVAL BONFIM							68.717,95	48.312,89		64.336,98	5.380,97	18.024,30	5.513,44	92,28	
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES							5.513,44	5.513,44		5.513,44	0,00	0,00	0,00	100,00	
02.01.001	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em melão 20 x 20cm e escoramento, instalação - Rev.02 - 09/2021	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	488,65	488,65		488,65	0,00	0,00	0,00	100,00	
02.01.002	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaparelhamento	m2	253,61	253,61	0,00	253,61	0,00	11,56	2.931,73	2.931,73	2.931,73	0,00	2.931,73	0,00	100,00	
02.01.003	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,77	200,20	200,20	200,20	0,00	200,20	0,00	100,00	
02.01.004	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev.01	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1.892,86	1.892,86	1.892,86	1.892,86	0,00	1.892,86	0,00	100,00	
02.02	PAVIMENTAÇÃO							34.984,41	32.498,35		32.498,35	2.488,06	0,00	0,00	92,86	
02.02.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	253,61	253,61	0,00	253,61	0,00	28,05	7.113,76	7.113,76	7.113,76	0,00	7.113,76	0,00	100,00	
02.02.002	Piso em concreto simples desarmado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de contração em lres.usos	m2	253,61	253,61	0,00	253,61	0,00	50,16	12.721,08	12.721,08	12.721,08	0,00	12.721,08	0,00	100,00	
02.02.003	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	253,61	253,61	0,00	253,61	0,00	9,85	2.498,06	2.498,06	2.498,06	0,00	2.498,06	0,00	100,00	
02.02.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desarmado, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	un	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	451,03	902,06	902,06	902,06	0,00	902,06	0,00	100,00	
02.02.005	Colchão de areia	m3	50,72	50,72	0,00	50,72	0,00	128,82	6.533,75	6.533,75	6.533,75	0,00	6.533,75	0,00	100,00	
02.02.006	Composição paramétrica para execução de escada em concreto armado, moldada in loco, fck = 25 mpa. af. 11/2022	m3	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5.225,70	5.225,70	5.225,70	5.225,70	0,00	5.225,70	0,00	100,00	
02.03	PAISAGISMO							286,90	286,90		286,90	0,00	0,00	0,00	100,00	
02.03.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	12,60	12,60	0,00	12,60	0,00	22,77	286,90	286,90	286,90	0,00	286,90	0,00	100,00	
02.04	DIVERSOS							9.883,34	3.003,34		3.003,34	0,00	0,00	0,00	78,49	
02.04.001	Contratado em aço inox, escovado, d=1 1/2"	m	10,40	0,00	0,00	10,40	0,00	87,12	906,05	906,05	906,05	0,00	906,05	0,00	100,00	
02.04.002	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica 2 demãos	m	14,14	14,14	0,00	14,14	0,00	212,40	3.003,34	3.003,34	3.003,34	0,00	3.003,34	0,00	100,00	
02.04.003	Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, iluminação pública, 180w, 4000k, 220v, e suporte em tubo aço galv. com Anteparo, da Ilumalic, mod LPL Ares ou similar	un	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4.581,23	4.581,23	4.581,23	4.581,23	0,00	4.581,23	0,00	100,00	
02.04.004	Lixeiras em eucalipto perfurado e autoclavado 0,45m x 0,45m x 0,53m	un	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	390,91	1.172,73	1.172,73	1.172,73	0,00	1.172,73	0,00	100,00	

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 200097088-8

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.										BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 22/2023			
MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA										B.M.Nº: 03				ORDEN DE SERVIÇO Nº			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU										Período: 01/04/2024 À 10/06/2024				Data da medição: 10/06/2024			
03 MESES+ 03 MESES(ADITIVO)										Valores (R\$)							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratado+ Aditivo	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado + Contrato	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido			
Quantidades																	
03.01.003	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw. - Rev.01	un	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.892,86	1.892,86	1.892,86	0,00	1.892,86	0,00	100,00			
03.01.004	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçada e quebra	m2	738,75	738,75	0,00	738,75	0,00	4,85	3.582,94	3.582,94	0,00	3.582,94	0,00	100,00			
03.02	PAVIMENTAÇÃO								97.720,94	41.711,72	47.106,90	88.819,01	8.901,94	90,89			
03.02.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	903,75	369,38	534,37	903,75	0,00	28,05	25.350,18	10.360,97	14.989,08	25.350,18	0,00	100,00			
03.02.002	Piso em concreto simples desarmado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de contração - les usas	m2	903,75	369,38	534,37	903,75	0,00	50,16	45.332,10	18.527,85	26.804,00	45.332,10	0,00	100,00			
03.02.003	Pintura p/ piso de aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	903,75	0,00	0,00	0,00	903,75	9,85	8.901,94	0,00	0,00	0,00	8.901,94	0,00			
03.02.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desarmado, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	451,03	451,03	451,03	0,00	451,03	0,00	100,00			
03.02.005	Colchão de areia	m3	137,29	96,04	41,25	137,29	0,00	128,82	17.685,70	12.371,87	5.313,83	17.685,70	0,00	100,00			
03.03	PAISAGISMO								1.345,25	0,00	605,23	605,23	740,03	44,99			
03.03.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	59,08	0,00	26,58	26,58	32,50	22,77	1.345,25	0,00	605,23	605,23	740,03	44,99			
03.04	DIVERSOS								46.873,87	16.188,88	28.066,06	44.252,94	2.820,93	94,41			
03.04.001	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev.01	un	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2.565,57	2.565,57	2.565,57	0,00	2.565,57	0,00	100,00			
03.04.002	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv, ø=1 1/2", Serigrafik ou similar	Un	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	868,08	868,08	868,08	0,00	868,08	0,00	100,00			
03.04.003	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Serigrafik ou similar	Un	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.112,40	1.112,40	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00	100,00			
03.04.004	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv, ø=2", conjunto com 03 unidades, Serigrafik ou similar	Un	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.112,40	1.112,40	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00	100,00			
03.04.005	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	117,00	28,00	89,00	117,00	0,00	212,40	24.850,80	5.947,20	18.903,60	24.850,80	0,00	100,00			
03.04.006	Fornecimento de Luminária 04 pélias em Led, iluminação pública, 180w, 4000k, 220v, e suporte em tubo aço galv, com Anteparo, da Ilumatic, mod LPL Ares ou similar	un	3,00	1,00	2,00	3,00	0,00	4.581,23	13.743,69	4.581,23	9.162,46	13.743,69	0,00	100,00			
03.04.007	Lixeiras em eucalipto perfurado e autoclavado 0,45m x 0,45m x 0,53m	un	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	390,91	1.172,73	0,00	0,00	0,00	1.172,73	0,00			
03.04.008	Banco em eucalipto perfurado autoclavado com 1,60m x 0,45m x 0,85m	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	724,10	1.448,20	0,00	0,00	0,00	1.448,20	0,00			
03.05	QUIOSQUE								19.324,20	2.119,81	12.311,75	14.431,56	4.892,64	74,68			
03.05.001	Concreto Armado fck=21 MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	2.638,44	1.319,22	0,00	1.319,22	1.319,22	0,00	100,00			
03.05.002	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massa aranduva, anelada ou madeira de lei	m3	0,69	0,00	0,69	0,69	0,00	4.144,93	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	100,00			
03.05.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira com Vito de 5m a 8 m	m2	16,96	0,00	16,96	16,96	0,00	17,79	301,72	0,00	301,72	301,72	0,00	100,00			
03.05.004	Maderamento em massa aranduva/madeira de lei, tesoura com Vito de 5m a 8 m	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1.337,27	1.337,27	0,00	1.337,27	1.337,27	0,00	100,00			
03.05.005	Maderamento em massa aranduva/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	53,69	859,04	0,00	859,04	859,04	0,00	100,00			
03.05.006	Maderamento em massa aranduva/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusiva peças principais	m2	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	112,13	2.803,25	0,00	2.803,25	2.803,25	0,00	100,00			
03.05.007	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª quolid, cor clara, Itabenhilha ou similar - Rev.02	m2	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	60,77	1.519,25	0,00	1.519,25	1.519,25	0,00	100,00			
03.05.008	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev.01	un	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2.119,81	2.119,81	2.119,81	0,00	2.119,81	0,00	100,00			

(Assinatura)

Martins Engenharia
 Dinesh/Kumar
 Engenheiro Civil
 CREA: 270097088-8

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BONIFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.										BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 22/2023	
MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA										B.M.Nº: 03				ORDEN DE SERVIÇO Nº	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU										Período: 01/04/2024 À 10/06/2024				Data da medição: 10/06/2024	
03 MESES+ 03 MESES(ADITIVO)										Valores (R\$)					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada+ Aditivo	Acumulada Anterior	Do Período	até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado + Contrato	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido	
03.05.009	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	35,00	0,00	25,00	25,00	10,00	15,10	528,50	0,00	377,50	377,50	151,00	71,43	
03.05.010	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450V/750V/70°C	m	280,00	0,00	75,00	75,00	205,00	12,46	3.488,80	0,00	934,50	934,50	2.554,30	26,79	
03.05.011	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	125,43	125,43	0,00	0,00	0,00	125,43	0,00	
03.05.012	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,79	20,79	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00	
03.05.013	Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto	pt	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	69,78	139,56	0,00	0,00	0,00	139,56	0,00	
03.05.014	Ponto de interruptor 01 seção simples c/placa, com canaléla plástica c/divisória 20x10mm	pt	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	288,86	288,86	0,00	0,00	0,00	288,86	0,00	
03.05.015	Luminária fluorescente tubular 2 x 20 w / 127 v, completa	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	160,59	321,18	0,00	0,00	0,00	321,18	0,00	
03.05.016	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, 2 bancos em concreto armado (sem circular), com pintura acrílica	Un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.291,52	1.291,52	0,00	0,00	0,00	1.291,52	0,00	
03.06	CANTEIRO								4.546,21	3.983,84	0,00	3.983,84	562,37	87,63	
03.06.001	Melo-flo de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	121,20	121,20	0,00	121,20	0,00	32,87	3.983,84	3.983,84	0,00	3.983,84	0,00	100,00	
03.06.002	Pintura de meio fio (calção)	m	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	4,64	562,37	0,00	0,00	0,00	562,37	0,00	
03.07	SERVIÇOS FINAIS								984,82	0,00	677,66	677,66	307,16	0,00	
03.07.001	Marco Inaugural - Rev. 01	Un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	677,66	-677,66	0,00	677,66	677,66	0,00	100,00	
03.07.002	Placa em acrílico branco lileoso dupla, tipo sanduíche, com aplicação de adesivo sobreposto	m2	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	877,61	307,16	0,00	0,00	0,00	307,16	0,00	
03.08	ADITIVO								21.974,56	0,00	21.704,37	21.704,37	270,19	98,77	
03.08.001	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecedor	Un	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2.107,58	6.322,74	0,00	6.322,74	6.322,74	0,00	100,00	
03.08.002	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal de 600 dan, engastamento nominal de 1 m de concreto e 0,8 m de solo (não inclui fornecimento), af. 11/2019	un	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1.059,02	3.177,06	0,00	3.177,06	3.177,06	0,00	100,00	
03.08.003	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, diâ. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	149,34	746,70	0,00	746,70	746,70	0,00	100,00	
03.08.004	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	16,15	1.453,50	0,00	1.453,50	1.453,50	0,00	100,00	
03.08.005	Quadro de distribuição de embutir, em chapão de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	133,99	133,99	0,00	0,00	0,00	133,99	0,00	
03.08.006	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	68,10	136,20	0,00	0,00	0,00	136,20	0,00	
03.08.007	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	10,57	0,00	10,57	10,57	0,00	495,04	5.232,57	0,00	5.232,57	5.232,57	0,00	100,00	
03.08.008	Lona plástica preta	m2	903,75	0,00	903,75	903,75	0,00	5,28	4.771,80	0,00	4.771,80	4.771,80	0,00	100,00	
TOTAL			903,75	0,00	903,75	903,75	0,00		RS 370.821,63	RS 178.923,02	RS 169.530,19	RS 32.468,15	RS 8,76%	91,24%	
FORCENTAGEM									100,00%	48,22%	43,02%	8,76%			

Martins Engenharia Dinesh Kumar Engenheiro Civil CREA: 270097088-8 MARTINS & C. ENGENHARIA, MANUT. E SERV. IND. LTDA Engº Civil Dinesh Kumar - CREA 270097088-8				Martins Engenharia Dinesh Kumar Engenheiro Civil CREA: 270097088-8 MARTINS & C. ENGENHARIA, MANUT. E SERV. IND. LTDA Engº Civil Dinesh Kumar - CREA 270097088-8				Martins Engenharia Dinesh Kumar Engenheiro Civil CREA: 270097088-8 MARTINS & C. ENGENHARIA, MANUT. E SERV. IND. LTDA Engº Civil Dinesh Kumar - CREA 270097088-8			
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA				ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.				APROVADO PARA PAGAMENTO			
DATA:				DATA:				Valor Aprovado:			
DATA:				Valor Aprovado:				Emilir Nota Fiscal:			
RS 159.530,19				RS 159.530,19				RS 159.530,19			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

JUNHO/2024

Nota de Liquidação: 0619135 Fonte: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 Data: 19/06/2024

FORNECEDOR

Nome: MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF: 15190486000145

Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 34

Compl:

Bairro: CENTRO

Cidade: Japarutuba

UF: SE

E-mail: 1@

Telefone: (79)3213-0564

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 22063

Operação:

Conta: 1100009

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Função: 15 Urbanismo

SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana

Programa: 0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Ação: 1055 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações

SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo

Fonte: 17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Marcador: 17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Centro Custo:

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0603006	03/06/2024	13.150,68	4.358,96	8.791,72

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO Nº 22/2024, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

RESTANTE DA NOTA FISCAL 021/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO Nº 22/2024, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023.

Documento	Valor
Nota Fiscal (21 / Série: A / UF: SE / Emissão: 10/06/2024)	4.358,96

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.358,96

QUATRO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 4.358,96



Nº Processo
0000527

Nº Fila
248

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

TERMO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 15.190.486/0001-45

Nome: MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA GETULIO VARGAS

Bairro: CENTRO

E-mail: 1@

Compl:

Cidade: Japaratuba

Telefone: (79)3213-0564

UF: SE

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência: 22063

Conta: 1100009

EMPENHO	EMIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	FONTE
0603006	03/06/2024	1055.44905100-17200000	Global	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO Nº 22/2024, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023.

Documentação	
Nota Fiscal	21
Valor	R\$ 4.358,96
Emissão	10/06/2024
Horário de Entrega	13/06/2024 10:15:12

Para acompanhar o andamento do seu processo na fila pública, acesse o link abaixo:
<http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pirambu/fornecedor/filapagamento>

Cadastrado por: Santiago Santos Gois



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento Tributário - Praça 16 de Outubro, Nº 135, Centro - Carmópolis/SE, CEP: 49.7490-000 Telefone: (79) 3277-1210

Nota: 2024000

00000021

Código Verificação
AINM-HEYI



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

10/06/2024 05:59:46

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

06/2024

Exigibilidade do ISS

Exigível em Pirambu

Município de Prestação do Serviço

Pirambu - SE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

Nome Fantasia

MARTINS ENGENHARIA

CPF/CNPJ

15.190.486/0001-45

Inscrição Municipal

200052591

Inscrição Estadual

271630531

Simples Nacional

Não

Email

marcos@martinslocserv.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 99988-9649

Endereço

RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS, SN, Santa Barbara - CEP: 49740-000 - Carmópolis - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

prefeitura municipal pirambu

CPF/CNPJ

13.095.039/0001-81

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3276-1203

E-mail

pirambu@pirambu.com.br

Endereço

(Localidade), 16, praça nossa senhora de lurdas - Não informado - CEP: 49190-000 - Pirambu - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4399103

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO VALOR TOTAL DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LÓC. NO CONJ. REINALDO MOURA E CONJ. LORIVAL BOMFIM - PIRAMBU/SE. CONTRATO MUNICIPAL Nº 04/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023.

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2024 A 10/06/2024.

PRAÇA LOURIVAL BONFIM - R\$ 31.033,90
PRAÇA LOURIVAL BONFIM MENOR - R\$ 18.024,30
PRAÇA REINALDO MOURA - R\$ 110.471,99

Material 60%
Mão de Obra 40%

DADOS BANCARIOS:

BANCO DO BRASIL

AG: 2206-3

CONTA CORRENTE: 110.000-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
DECLARO QUE

- ☐ Os serviços foram prestados
☐ Os produtos foram entregues
☐ A obra foi executada

Data: 19/06/2024

Assinatura: [Assinatura]
Carimbo: [Carimbo]

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
1.036,95	4.785,91	0,00	2.392,95	1.595,30	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
159.530,19	95.718,10	0,00	63.812,09	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
3.190,60	*****	0,00	149.719,08	159.530,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R\$ 21.456,81 Federal e R\$ 7.976,51 Municipal. Fonte: IBPT [691A69]
Substitui nota 202400000000019 de 07/06/2024

Visualizado em: 10/06/2024 05:59:45
Para validação desta NFSe acesse: <http://carmopolisse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

RECEBIDO
Em 12/06/24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBUSE.										BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 22/2023		ORDEN DE SERVIÇO Nº		MARTINS Locação e Serviços	
MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA										B.M.Nº: 03				Data da medição: 10/08/2024					
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU										Período: 01/04/2024 A 10/08/2024									
03 MESES+ 03 MESES(ADITIVO)										Valores (R\$)									
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada+ Aditivo	Quantidades			Preço Unit. (R\$)	Contratado + Contrato	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido						
				Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período													
01.05.004	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 6m a 8 m	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1.337,27	0,00	1.337,27	1.337,27	0,00	100,00						
01.05.005	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	53,69	0,00	859,04	859,04	0,00	100,00						
01.05.006	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusiva peças principais	m2	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	112,13	0,00	2.803,25	2.803,25	0,00	100,00						
01.05.007	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, fibrocimento ou similar - Rev.02	m2	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	60,77	0,00	1.519,25	1.519,25	0,00	100,00						
01.05.008	Entrada de energia elétrica básica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev.01	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2.119,81	2.119,81	0,00	2.119,81	0,00	100,00						
01.05.009	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 25mm (3/4")	m	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	15,10	0,00	377,50	377,50	0,00	100,00						
01.05.010	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/750v / 70°C	m	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	12,46	0,00	1.619,80	1.619,80	0,00	100,00						
01.05.011	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	125,43	0,00	0,00	0,00	125,43	0,00						
01.05.012	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5kA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,79	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00						
01.05.013	Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto	pt	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	69,78	0,00	0,00	0,00	139,56	0,00						
01.05.014	Ponto de interruptor 01 seção simples c/placa, com canalização elétrica c/diâmetro 20x10mm	pt	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	288,86	0,00	0,00	0,00	288,86	0,00						
01.05.015	Luminária fluorescente tubular 2 x 20 w / 127 v, completa	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	160,59	0,00	0,00	0,00	321,18	0,00						
01.05.016	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, 2 bancos em concreto armado (seml circular), com pintura acrílica.	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.291,52	0,00	0,00	0,00	1.291,52	0,00						
01.06	CANTEIRO																		
01.06.001	Melo-flo de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	100,45	100,45	0,00	100,45	0,00	32,87	3.301,79	3.301,79	3.301,79	466,09	100,00						
01.06.002	Pintura de melo flo (calafiação)	m	100,45	0,00	0,00	0,00	100,45	4,64	466,09	0,00	0,00	466,09	0,00						
01.07	SERVIÇOS FINAIS																		
01.07.001	Marco inaugural - Rev. 01	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	677,66	677,66	0,00	677,66	307,16	0,00						
01.07.002	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduíche, com aplicação de adesivo sobreposto	m2	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	877,61	307,16	0,00	0,00	307,16	0,00						
01.08	ADITIVO																		
01.08.001	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2.107,58	2.107,58	0,00	2.107,58	0,00	100,00						
01.08.002	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,8 m de solo (não inclui fornecimento), al. 11/2019	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1.059,02	1.059,02	0,00	1.059,02	0,00	100,00						
01.08.003	Calha pré moldada em concreto c/lampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energia	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	18,07	18,07	0,00	18,07	0,00	100,00						
01.08.004	Calha de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	149,34	448,02	0,00	448,02	0,00	100,00						
01.08.005	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 32mm (1")	m	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	16,15	581,40	0,00	581,40	0,00	100,00						
01.08.006	Quadro de distribuição de embulir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	133,99	133,99	0,00	0,00	133,99	0,00						
01.08.007	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev.01	m2	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	24,17	1.109,40	0,00	1.109,40	0,00	100,00						
01.08.008	Demolição de meio	m	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	9,28	425,95	0,00	425,95	0,00	100,00						

Assinado e rubricado por:
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA-SE 271757631-2

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

Obra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRACAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.

Contratado: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

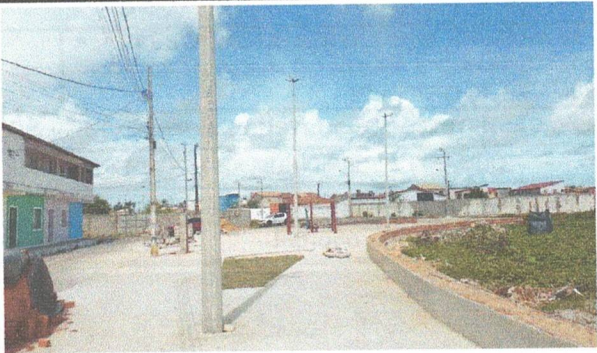
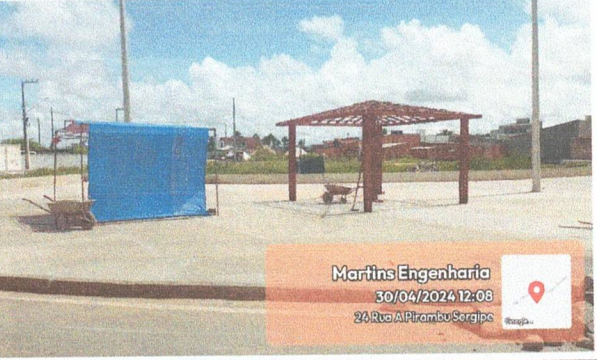
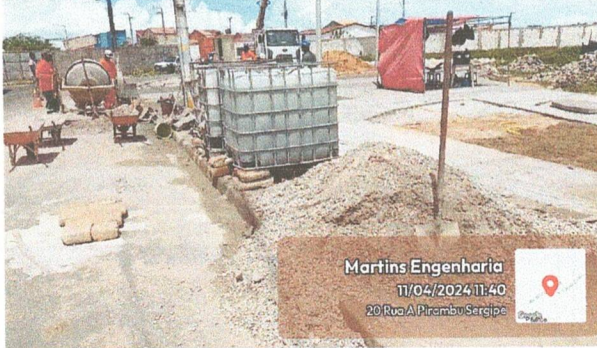
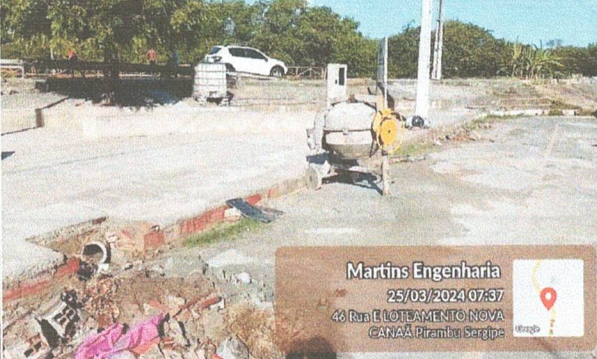
Prazo: 03 MESES+ 03 MESES(ADITIVO)

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades				Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)				% Medido
			Contratado+ Aditivo	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado + Contrato	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	
01.08.009	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, com reaparelhamento. af. 09/2023	m3	2,93	0,00	2,93	2,93	114,43	335,28	0,00	335,28	335,28	100,00
01.08.010	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	19,50	0,00	19,50	19,50	63,69	1.241,95	0,00	1.241,95	1.241,95	100,00
01.08.011	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Rev.06	m2	29,10	0,00	29,10	29,10	6,47	188,28	0,00	188,28	188,28	100,00
01.08.012	Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	29,10	0,00	29,10	29,10	35,81	1.042,02	0,00	1.042,02	1.042,02	100,00
01.08.013	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,33	0,00	1,33	1,33	575,80	765,82	0,00	765,82	765,82	100,00
01.08.014	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	9,00	0,00	9,00	9,00	59,17	532,53	0,00	532,53	532,53	100,00
01.08.015	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	2,00	0,00	2,00	2,00	68,10	136,20	0,00	136,20	136,20	100,00
01.08.016	Lona plástica preta	m2	368,20	0,00	368,20	368,20	5,28	1.944,10	0,00	1.944,10	1.944,10	100,00
02	PRACA MENOR LOURIVAL BOMFIM							69.717,95	48.312,69	18.024,30	64.338,98	92,28
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES							5.513,44	5.513,44	0,00	5.513,44	100,00
02.01.001	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metal 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev.02 - 09/2021	un	1,00	0,00	1,00	1,00	488,65	488,65	0,00	488,65	488,65	100,00
02.01.002	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaparelhamento	m2	253,61	0,00	253,61	253,61	11,56	2.931,73	2.931,73	0,00	2.931,73	100,00
02.01.003	Locação de pranchas com piquetes de madeira	m2	260,00	0,00	260,00	260,00	0,77	200,20	200,20	0,00	200,20	100,00
02.01.004	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev.01	un	1,00	0,00	1,00	1,00	1.892,86	1.892,86	1.892,86	0,00	1.892,86	100,00
02.02	PAVIMENTAÇÃO							34.994,41	32.498,35	0,00	32.498,35	92,88
02.02.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	253,61	0,00	253,61	253,61	28,05	7.113,76	7.113,76	0,00	7.113,76	100,00
02.02.002	Piso em concreto simples desarmado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de contração - Itens usos	m2	253,61	0,00	253,61	253,61	50,16	12.721,08	12.721,08	0,00	12.721,08	100,00
02.02.003	Revestimento de piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	253,61	0,00	253,61	253,61	9,85	2.498,06	0,00	0,00	2.498,06	0,00
02.02.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desarmado, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	0,00	2,00	2,00	451,03	902,06	902,06	0,00	902,06	100,00
02.02.005	Colchão de areia	m3	50,72	0,00	50,72	50,72	128,82	6.533,75	6.533,75	0,00	6.533,75	100,00
02.02.006	Composição paramétrica para execução de escada em concreto armado, moldada in loco, fck = 25 mpa. af. 11/2022	m3	1,00	0,00	1,00	1,00	5.225,70	5.225,70	5.225,70	0,00	5.225,70	100,00
02.03	PAISAGISMO							286,90	286,90	0,00	286,90	100,00
02.03.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	12,60	0,00	12,60	12,60	22,77	286,90	286,90	0,00	286,90	100,00
02.04	DIVERSOS							9.863,34	3.003,34	4.681,23	7.584,57	78,49
02.04.001	Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2"	m	10,40	0,00	10,40	10,40	87,12	906,05	0,00	0,00	906,05	0,00
02.04.002	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	14,14	0,00	14,14	14,14	212,40	3.003,34	3.003,34	0,00	3.003,34	100,00
02.04.003	Fornecimento de luminária 04 pértolas em Led, iluminação pública, 180w, 4000K, 220v, e suporte em tubo aço galv, com Anelaparo, mod LPL Ares ou similar	un	1,00	0,00	1,00	1,00	4.581,23	4.581,23	0,00	4.581,23	4.581,23	100,00
02.04.004	Lineiras em eucalipto perfilado e autoclavado 0,45m x 0,45m x 0,53m	un	3,00	0,00	3,00	3,00	390,91	1.172,73	0,00	0,00	1.172,73	0,00

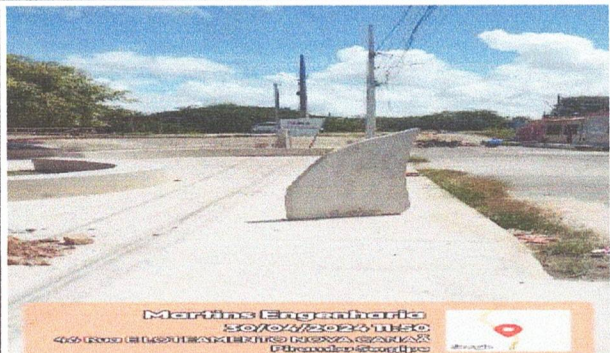
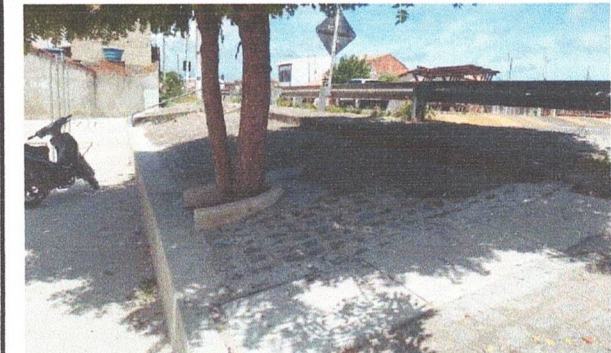
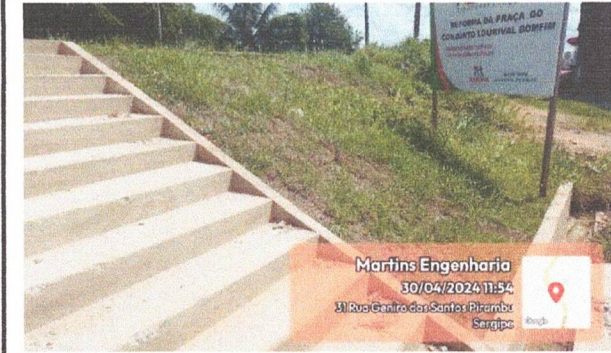
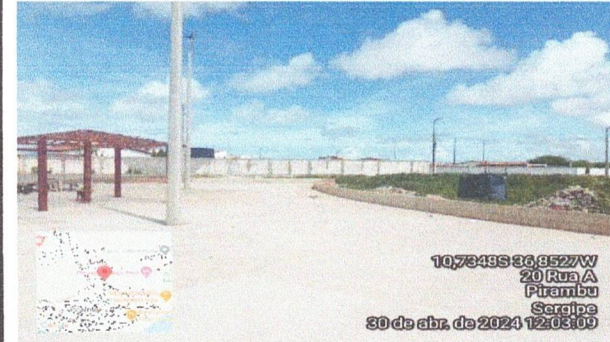
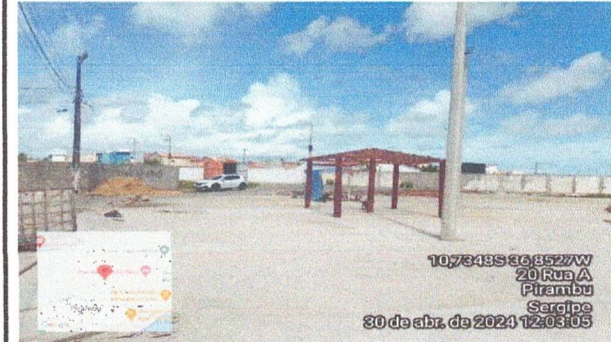
BOLETIM DE MEDIÇÃO										CONTRATO Nº 22/2023		ORDEN DE SERVIÇO Nº	
B.M.Nº: 03										Data da medição: 10/06/2024		MARTINS Locação e Serviços	
Período: 01/04/2024 A 10/06/2024													
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades				Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)				% Medido	
			Contratada+ Aditivo	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado + Contrato	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saldo a medir
02.05	CANTEIRO	m	63,53	63,53	0,00	63,53	0,00	2.383,01	2.088,23	0,00	2.088,23	294,78	87,63
02.05.001	Melo-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	63,53	63,53	0,00	63,53	0,00	2.088,23	2.088,23	0,00	2.088,23	0,00	100,00
02.05.002	Plintura de meio fio (calçada)	m					4,64	294,78	0,00	0,00	0,00	294,78	0,00
02.06	SERVIÇOS FINAIS	Un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	984,82	0,00	677,66	677,66	307,16	68,81
02.06.001	Marco Inaugural - Rev. 01	Un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	677,66	0,00	677,66	677,66	0,00	100,00
02.06.002	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	m2	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	877,61	0,00	0,00	0,00	307,16	0,00
02.07	RECUPERAÇÃO DE TALUDE	m2	127,76	127,76	0,00	127,76	0,00	0,12	15,33	0,00	15,33	0,00	100,00
02.07.001	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m2	127,76	127,76	0,00	127,76	0,00	22,77	2.909,10	0,00	2.909,10	0,00	100,00
02.07.002	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	127,76	127,76	0,00	127,76	0,00	12.987,76	0,00	12.765,57	12.765,57	202,14	98,44
02.08	ADITIVO	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2.119,81	0,00	2.119,81	2.119,81	0,00	100,00
02.08.001	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev.01	Un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2.107,58	0,00	2.107,58	2.107,58	0,00	100,00
02.08.002	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1.059,02	0,00	1.059,02	1.059,02	0,00	100,00
02.08.003	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,8 m de solo (não inclui fornecimento). af. 11/2019	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1.059,02	0,00	1.059,02	1.059,02	0,00	100,00
02.08.004	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	149,34	0,00	298,68	298,68	0,00	100,00
02.08.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	16,15	0,00	322,95	322,95	0,00	99,96
02.08.006	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/750V / 70 °C	m	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	12,46	0,00	934,50	934,50	0,00	100,00
02.08.007	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	9,28	0,00	570,72	570,72	0,00	100,00
02.08.008	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, com reaproveitamento. af. 09/2023	m3	12,30	0,00	12,30	12,30	0,00	114,43	0,00	1.407,45	1.407,45	0,04	100,00
02.08.009	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	17,99	0,00	71,96	71,96	0,00	100,00
02.08.010	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,70 x 0,70 x 0,80m	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	585,05	0,00	585,05	585,05	0,00	100,00
02.08.011	Concreto magro para lastrado, traço 1:4:5:4:5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betonilha 400 L. af. 05/2021	m3	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	411,23	0,00	90,47	90,47	0,00	100,00
02.08.012	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	43,59	0,00	632,04	632,04	0,01	100,00
02.08.013	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 09/2015	m2	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	6,47	0,00	187,63	187,63	0,00	100,00
02.08.014	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	33,21	0,00	963,10	963,10	0,00	100,00
02.08.015	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	12,59	0,00	75,54	75,54	0,00	100,00
02.08.016	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00
02.08.017	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	133,99	0,00	0,00	0,00	133,99	0,00
02.08.018	Lona plástica preta	m2	253,61	0,00	253,61	253,61	0,00	5,28	0,00	1.339,07	1.339,07	0,00	100,00
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	199.303,16	70.535,63	110.471,99	181.007,69	18.295,46	90,62
03.01	PRACA REINALDO MOURA							8.533,28	6.533,28	0,00	6.533,28	0,00	100,00
03.01.001	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metal 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev.02 - 09/2021	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	488,64	488,64	0,00	488,64	0,00	100,00
03.01.002	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	738,75	738,75	0,00	738,75	0,00	0,77	568,84	0,00	568,84	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU													
03 MESES+ 03 MESES(ADITIVO)													
Periodo: 01/04/2024 A 10/06/2024													
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades				Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)				% Medido	
			Contratada+ Aditivo	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Saldo a medir	Contratado + Contrato	Acumulado Anterior	Do Período		Acumulado até o Período
03.01.003	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw. - Rev 01	un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.892,86	1.892,86	1.892,86	0,00	1.892,86	0,00	100,00
03.01.004	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçada e queima	m2	738,75	738,75	0,00	738,75	4,85	3.582,94	3.582,94	0,00	3.582,94	0,00	100,00
03.02	PAVIMENTAÇÃO	m2	903,75	369,38	534,37	903,75	28,05	25.350,18	10.360,97	14.989,08	25.350,18	0,00	100,00
03.02.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	903,75	369,38	534,37	903,75	50,16	45.332,10	18.527,85	26.804,00	45.332,10	0,00	100,00
03.02.002	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - três usos	m2	903,75	0,00	0,00	0,00	9,85	8.901,94	0,00	0,00	8.901,94	0,00	0,00
03.02.003	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	un	1,00	1,00	0,00	1,00	451,03	451,03	451,03	0,00	451,03	0,00	100,00
03.02.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	m3	137,29	96,04	41,25	137,29	128,82	17.685,70	12.371,87	5.313,83	17.685,70	0,00	100,00
03.02.005	Cobção de areia	m2	59,08	0,00	28,58	26,58	22,77	1.345,25	0,00	605,23	605,23	740,03	44,99
03.03	PAISAGISMO	m2	59,08	0,00	28,58	26,58	22,77	1.345,25	0,00	605,23	605,23	740,03	44,99
03.03.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	un	1,00	1,00	0,00	1,00	2.565,57	2.565,57	2.565,57	0,00	2.565,57	0,00	100,00
03.04	DIVERSOS	un	1,00	1,00	0,00	1,00	868,08	868,08	868,08	0,00	868,08	0,00	100,00
03.04.001	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.112,40	1.112,40	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00	100,00
03.04.002	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1,12". Sergipark ou similar	un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.112,40	1.112,40	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00	100,00
03.04.003	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.112,40	1.112,40	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00	100,00
03.04.004	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar	un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.112,40	1.112,40	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00	100,00
03.04.005	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	117,00	28,00	89,00	117,00	212,40	24.850,80	5.947,20	18.903,60	24.850,80	0,00	100,00
03.04.006	Fornecimento de Luminária 04 pélatas em Led, iluminação pública, 180w, 4000k, 220v, e suporte em tubo aço galv, com Anelaparo, da Ilumatic, mod LPL Ares ou similar	un	3,00	1,00	2,00	3,00	4.581,23	13.743,69	4.581,23	9.162,46	13.743,69	0,00	100,00
03.04.007	Lixeiras em eucalipto perfurado e autoclavado 0,45m x 0,45m x 0,53m	un	3,00	0,00	0,00	0,00	390,91	1.172,73	0,00	0,00	0,00	1.172,73	0,00
03.04.008	Banco em eucalipto perfurado autoclavado com 1,60m x 0,45m x 0,85m	un	2,00	0,00	0,00	0,00	724,10	1.448,20	0,00	0,00	0,00	1.448,20	0,00
03.05	QUIOSQUE	m3	0,50	0,00	0,50	0,50	2.638,44	1.319,22	0,00	1.319,22	1.319,22	0,00	100,00
03.05.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,89	0,00	0,89	0,89	4.144,93	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	100,00
03.05.002	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massa aranduva, anelão ou madeira de lei	m2	16,96	0,00	16,96	16,96	17,79	301,72	0,00	301,72	301,72	0,00	100,00
03.05.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	un	1,00	0,00	1,00	1,00	1.337,27	1.337,27	0,00	1.337,27	1.337,27	0,00	100,00
03.05.004	Madeiramento em massa aranduva/madeira de lei, tesoura com vão de 6m a 8 m	m	16,00	0,00	16,00	16,00	53,69	859,04	0,00	859,04	859,04	0,00	100,00
03.05.005	Madeiramento em massa aranduva/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m2	25,00	0,00	25,00	25,00	112,13	2.803,25	0,00	2.803,25	2.803,25	0,00	100,00
03.05.006	Madeiramento em massa aranduva/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	25,00	0,00	25,00	25,00	60,77	1.519,25	0,00	1.518,26	1.519,25	0,00	100,00
03.05.007	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabalanha ou similar - Rev 02	un	1,00	1,00	0,00	1,00	2.119,81	2.119,81	2.119,81	0,00	2.119,81	0,00	100,00
03.05.008	Entrada de energia elétrica básica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	1,00	0,00	1,00	2.119,81	2.119,81	2.119,81	0,00	2.119,81	0,00	100,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.										BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 22/2023		ORDEN DE SERVIÇO Nº		Data da medição: 10/08/2024		MARTINS Locação e Serviços																					
MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA										B.M.Nº: 03				Período: 01/04/2024 A 10/08/2024				Valores (R\$)																							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU 03 MESES+ 03 MESES(ADITIVO)										Quantidades				Preço Unit. (R\$)				Contratado + Contrato				Acumulado Anterior				Do Período				Acumulado até o Período				Saldo a medir				% Medido			
Item	Discriminação dos Serviços				Und	Contratada+ Aditivo	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado + Contrato	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido																								
03.05.009	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 25mm (3/4")				m	35,00	0,00	25,00	25,00	10,00	15,10	528,50	0,00	377,50	377,50	151,00	71,43																								
03.05.010	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450V/750V/70°C				m	280,00	0,00	75,00	75,00	205,00	12,46	3.488,80	0,00	934,50	934,50	2.554,30	28,79																								
03.05.011	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusão disjuntores				un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	125,43	125,43	0,00	0,00	0,00	125,43	0,00																								
03.05.012	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção SKA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.				un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,79	20,79	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00																								
03.05.013	Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto				pt	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	69,78	139,56	0,00	0,00	0,00	139,56	0,00																								
03.05.014	Ponto de interruptor 01 seção simples c/placa, com canaleta plástica c/divisória 20x10mm				pt	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	288,86	288,86	0,00	0,00	0,00	288,86	0,00																								
03.05.015	Luminária fluorescente tubular 2 x 20 w / 127 v, completa				un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	160,59	321,18	0,00	0,00	0,00	321,18	0,00																								
03.05.016	Mesa c/ lampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m. 2 bancos em concreto armado (sentil circular), com pintura acrílica.				un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.291,52	1.291,52	0,00	0,00	0,00	1.291,52	0,00																								
03.06	CANTEIRO				m	121,20	121,20	0,00	121,20	0,00	32,87	3.983,84	3.983,84	0,00	3.983,84	0,00	87,63																								
03.06.001	Melo-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3				m	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	4,64	562,37	0,00	0,00	0,00	562,37	0,00																								
03.06.002	Pintura de melo fio (calafiação)				m	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	677,66	677,66	0,00	677,66	0,00	307,16	0,00																								
03.07	SERVIÇOS FINAIS				un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	877,61	307,16	0,00	0,00	0,00	307,16	0,00																								
03.07.001	Marco inaugural - Rev. 01				m2	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	2.107,58	6.322,74	0,00	6.322,74	0,00	270,19	0,00																								
03.07.002	Placa em acrílico branco liso dupla, tipo sanduíche, com aplicação de adesivo sobreposto				un	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3.177,06	3.177,06	0,00	3.177,06	0,00	0,00	100,00																								
03.08	ADITIVO				un	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2.107,58	6.322,74	0,00	6.322,74	0,00	0,00	100,00																								
03.08.001	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento				un	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1.059,02	3.177,06	0,00	3.177,06	0,00	0,00	100,00																								
03.08.002	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,8 m de solo (não inclui fornecimento), af. 11/2019				un	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	149,34	746,70	0,00	746,70	0,00	0,00	100,00																								
03.08.003	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, diâm. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m				un	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	16,15	1.453,50	0,00	1.453,50	0,00	0,00	100,00																								
03.08.004	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 32mm (1")				m	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	16,15	1.453,50	0,00	1.453,50	0,00	0,00	100,00																								
03.08.005	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusão disjuntores				un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	133,99	133,99	0,00	0,00	0,00	133,99	0,00																								
03.08.006	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação, af. 10/2020				un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	68,10	136,20	0,00	0,00	0,00	136,20	0,00																								
03.08.007	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saço cimento 50kg / 5 pedras areia diâm. 0,35x0,45x0,23m - Conexão mecânica e transporte				m3	10,57	0,00	10,57	10,57	0,00	495,04	5.232,57	0,00	5.232,57	0,00	0,00	100,00																								
03.08.008	Lona plástica preta				m2	903,75	0,00	903,75	903,75	0,00	5,28	4.771,80	0,00	4.771,80	0,00	0,00	100,00																								
TOTAL						903,75	0,00	903,75	903,75	0,00	5,28	4.771,80	0,00	4.771,80	0,00	0,00	100,00																								
PORCENTAGEM						100,00%					43,02%	R\$ 178.823,02	48,22%	R\$ 159.530,18	91,24%	R\$ 32.468,15	8,76%	91,24%																							
ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.										APROVADO PARA PAGAMENTO																															
DATA:										DATA:																															
MARTINS Engenharia										Valor Aprovado:																															
Dinesh Kumar										Emitir Nota Fiscal:																															
Engenheiro Civil										R\$ 159.530,18																															
CREA: 270097088-8																																									
MARTINS CREA: 270097088-8																																									
Eag Civil Dinesh Kumar - CREA 170097088-8																																									
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA																																									

Obra:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.	 MARTINS Locação e Serviços
Contratada:	MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
BM: 03 (CT +ADTV)	Período : 01/04/2024 à 10/06/2024	CONTRATO Nº 22/2023
	 10-7348S 36.9527W 20 Rua A Pirambu Sergipe 30 de abr. de 2024 12:03:20	
PISO E QUIOSQUE_Praça REINALDO MOURA	GRAMA_Praça REINALDO MOURA	
	 Martins Engenharia 30/04/2024 12:08 24 Rua A Pirambu Sergipe	
PISO EM CONCRETO_Praça REINALDO MOURA	QUIOSQUE_Praça REINALDO MOURA	
 Martins Engenharia 11/04/2024 11:40 20 Rua A Pirambu Sergipe	 Martins Engenharia 30/04/2024 12:08 24 Rua A Pirambu Sergipe	
Piso em concreto_Praça Reinaldo Moura	Piso em concreto e quiosque_Praça Reinaldo Moura	
 Martins Engenharia 25/03/2024 07:37 48 Rua E LOTEAMENTO NOVA CANAÁ Pirambu Sergipe		
DRENAGEM TUBOS DE CONCRETO DN 300_Praça L. Bomfim Maior	ALVENARIA DE PEDRAS_Praça Reinaldo Moura	

Martins Engenharia
 Dinesh Kumar
 Engenheiro Civil
 CREA: 270097088-8

Obra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.		 MARTINS Locação e Serviços
Contratada: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
BM: 03 (CT +ADTV)	Período : 01/04/2024 à 10/06/2024	CONTRATO Nº 22/2023
 Martins Engenharia 30/04/2024 11:53 31 Rua Centro dos Santos Pirambu Sergipe		
MARCO INAUGURAL_Praça L. Bomfim Maior	RECUPERAÇÃO TALUDE EM PARALELEPÍPEDO	
	 Martins Engenharia 30/04/2024 11:54 31 Rua Centro dos Santos Pirambu Sergipe	
MURETA CONTENÇÃO TALUDE - L.BOMFIM MENOR	MURETA CONTENÇÃO TALUDE - L.BOMFIM MENOR	
 Martins Engenharia 30/04/2024 11:53 31 Rua Centro dos Santos Pirambu Sergipe		
MARCO INAUGURAL_Praça L. Bomfim Menor	MARCO INAUGURAL_Praça L. Bomfim Menor	
 107849S 86.8527W 20 Rua A Pirambu Sergipe 30 de abr. de 2024 12:03:09	 107849S 86.8527W 20 Rua A Pirambu Sergipe 30 de abr. de 2024 12:03:09	
POSTES E LUMINÁRAIS _Praça REINALDO MOURA	PISO E QUIOSQUE_ Praça REINALDO MOURA	

Martins Engenharia
 Dinesh Kumar
 Engenheiro Civil
 CREA: 270097088-8

Martins Engenharia
 Dinesh Kumar
 Engenheiro Civil
 CREA: 270097088-8

Obra:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.		 MARTINS Locação e Serviços
Contratada: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU			
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
BM: 03 (CT +ADTV)		Período : 01/04/2024 à 10/06/2024	CONTRATO Nº 22/2023
			
TALUDE SEM CONTENÇÃO		TALUDE COM A MURETA DE CONTENÇÃO	
 Martins Engenharia Dinesh Kumar Engenheiro Civil CREA: 270097088-8 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA		ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.	





PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 01/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 57 Dias Restante: 33

Equipam.	Betoneira estacionária	1
	Serra Manual	1
	Máquina de corte de piso	1
	Carro de mão	4

Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
	Armador			
	Servente	2		

Serviços	Limpeza da área das praças
	Regularização de piso e concretagem de pisos

Observação	

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

Manoel Soares Neto
Engenheiro Civil
CREA-SE 271797022-6

Manoel Soares Neto
Engenheiro Civil
CREA-SE 271797022-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 02/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 58 Dias Restante: 32

Equipam.	Betoneira estacionária	1		
	Serra Manual	1		
	Máquina de corte de piso	1		
	Carro de mão	4		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
	Armador			
	Servente	2		
Serviços	Gabarito e aplicação de lona			
	Regularização de piso e concretagem de pisos			
Observação				

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 03/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 59 Dias Restante: 31

Equipam.	Betoneira estacionária	1
	Serra Manual	1
	Máquina de corte de piso	1
	Carro de mão	4

Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
	Armador			
	Servente	2		

Serviços	Gabarito e aplicação de lona
	Regularização de piso e concretagem de pisos

Observação	

Fiscalização:

Contratada:


Fiscalizador
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 04/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 60 Dias Restante: 30

Equipam.	Betoneira estacionária	1		
	Serra Manual	1		
	Máquina de corte de piso	1		
	Carro de mão	4		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
	Armador			
	Servente	2		
Serviços	Praça Reinaldo Moura			
	Gabarito e aplicação de lona			
	Regularização de piso e concretagem de pisos			
Observação				

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 05/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 61 Dias Restante: 29

Equipam.	Betoneira estacionária	1
	Serra Manual	1
	Máquina de corte de piso	1
	Carro de mão	4

Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
	Armador			
	Servente	2		

Serviços	Praça Reinaldo Moura
	Gabarito e aplicação de lona
	Regularização de piso e concretagem de pisos

Observação	

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 06/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

Tarde

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 62 Dias Restante: 28

Equipam.	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
Pessoal	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador		
	Carpinteiro			Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro			Eletricista		
	Armador					
	Servente					
Serviços	Não Houve atividades					
Observação						

Fiscalização:	Contratada:
	Martins Engenharia Dinesh Kumar Engenheiro Civil CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 07/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

Tarde

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 63 Dias Restante: 27

Equipam.	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
Pessoal	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador		
	Carpinteiro			Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro			Eletricista		
	Armador					
	Servente					
Serviços	Sem atividades					
Observação						

Fiscalização:

Contratada: Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 08/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 64 Dias Restante: 26

Equipam.	Betoneira estacionária	1
	Serra Manual	1
	Máquina de corte de piso	1
	Carro de mão	4

Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
	Armador			
	Servente	2		

Serviços	Praça Reinaldo Moura
	Gabarito e aplicação de lona
	Regularização de piso e concretagem de pisos
	Instalação de postes de concreto praças Lourival Bonfim(maior e menor) e Reinaldo Moura
	Instalação de luminárias

Observação	

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 09/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x


Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 65 Dias Restante: 25

Equipam.	Equipamento	
	Descrição	Quant.
Equipam.	Betoneira estacionária	1
	Serra Manual	1
	Máquina de corte de piso	1
	Carro de mão	4

Pessoal	Pessoal	
	Descrição	Quant.
Pessoal	Engenheiro	1
	Mestre de Obras/ Encarregado	1
	Carpinteiro	
	Pedreiro/Calceteiro	1
	Armador	
	Servente	2

Serviços	Serviços	
	Descrição	Quant.
Serviços	Praça Reinaldo Moura	
	Gabarito e aplicação de lona	
	Regularização de piso e concretagem de pisos	
	Instalação de postes de concreto praças Lourival Bonfim(maior e menor) e Reinaldo Moura	
	Instalação de luminárias	

Observação	Observação	
	Descrição	Quant.
Observação		

Fiscalização:	Contratada:
	Martins Engenharia Dinesh Kumar Engenheiro Civil CREA: 270097088-8 



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 10/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 66 Dias Restante: 24

Equipam.	Equipamento	
	Descrição	Quant.
Equipam.	Betoneira estacionária	1
	Serra Manual	1
	Máquina de corte de piso	1
	Carro de mão	4

Pessoal	Pessoal	
	Descrição	Quant.
Pessoal	Engenheiro	1
	Mestre de Obras/ Encarregado	1
	Carpinteiro	
	Pedreiro/Calceteiro	1
	Armador	
	Servente	2

Serviços	Serviços	
	Descrição	Quant.
Serviços	Praça Reinaldo Moura	
	Gabarito e aplicação de lona	
	Regularização de piso e concretagem de pisos	

Observação	Observação	
	Descrição	Quant.
Observação		

Fiscalização:	Contratada:
	Martins Engenharia Dinesh Kumar Engenheiro Civil CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 11/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

x

x

Tarde

x

x

Prazo da Obra

90

Dias Decorrido:

67

Dias Restante:

23

Equipam.	Betoneira estacionária	1
	Serra Manual	1
	Máquina de corte de piso	1
	Carro de mão	4

Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
	Armador			
	Servente	2		

Serviços	Praça Reinaldo Moura
	Gabarito e aplicação de lona
	Regularização de piso e concretagem de pisos

Observação	

Fiscalização:


Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 12/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

x

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 68 Dias Restante: 22

Equipam.	Betoneira estacionária	1
	Serra Manual	1
	Máquina de corte de piso	1
	Carro de mão	4

Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
	Armador			
	Servente	2		

Serviços	Praça Reinaldo Moura
	Gabarito e aplicação de lona
	Regularização de piso e concretagem de pisos

Observação	

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 13/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

Tarde

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 69 Dias Restante: 21

Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Máquina de corte de piso			
	Carro de mão			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro		Eletricista	
	Armador			
	Servente			
Serviços	Não Houve atividades			
Observação				

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 14/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

Tarde

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 70 Dias Restante: 20

Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Máquina de corte de piso			
	Carro de mão			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro		Eletricista	
	Armador			
	Servente			
Serviços	Sem atividades			
Observação				

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 15/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra

90

Dias Decorrido:

71

Dias Restante:

19

Equipam.	Betoneira estacionária	1
	Serra Manual	1
	Máquina de corte de piso	1
	Carro de mão	4

Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
	Armador			
	Servente	2		

Serviços	Praça Reinaldo Moura
	Gabarito e aplicação de lona
	Regularização de piso e concretagem de pisos
	Instalação de marco inaugural
	Aterro de área(área aditivo)
Observação	

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 16/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 72 Dias Restante: 18

Equipam.	Betoneira estacionária	1		
	Serra Manual	1		
	Máquina de corte de piso	1		
	Carro de mão	4		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
	Armador			
	Servente	2		
Serviços	Praça Reinaldo Moura			
	Gabarito e aplicação de lona			
	Regularização de piso e concretagem de pisos			
Observação				

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 17/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 73 Dias Restante: 17

Equipam.	Descrição		Quant.	
Equipam.	Betoneira estacionária		1	
	Serra Manual		1	
	Máquina de corte de piso		1	
	Carro de mão		4	
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
	Armador			
	Servente	2		
Serviços	Praça Reinaldo Moura			
	Gabarito e aplicação de lona			
	Regularização de piso e concretagem de pisos			
Observação				

Fiscalização:



Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 18/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 74 Dias Restante: 16

Equipam.	Equipamento	
	Descrição	Quant.
Equipam.	Betoneira estacionária	1
	Serra Manual	1
	Máquina de corte de piso	1
	Carro de mão	4

Pessoal	Pessoal	
	Descrição	Quant.
Pessoal	Engenheiro	1
	Mestre de Obras/ Encarregado	1
	Carpinteiro	
	Pedreiro/Calceteiro	1
	Armador	
	Servente	2

Serviços	Serviços	
	Descrição	Quant.
Serviços	Praça Reinaldo Moura	
	Gabarito e aplicação de lona	
	Regularização de piso e concretagem de pisos	
	Aterro de área(área aditivo)	
	Execução de alvenaria de pedra lateral (devido desnível acentuado) e acrescimos de áreas	

Observação	Observação	
	Descrição	Quant.
Observação		

Fiscalização:	Contratada:
	Martins Engenharia Dinesh Kumar Engenheiro Civil CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 19/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

x

Tarde

x

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 75 Dias Restante: 15

Equipam.	Betoneira estacionária	1
	Serra Manual	1
	Máquina de corte de piso	1
	Carro de mão	4

Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
	Armador			
	Servente	2		

Serviços	Praça Reinaldo Moura
	Gabarito e aplicação de lona
	Regularização de piso e concretagem de pisos

Observação	

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 20/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

Tarde

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 76 Dias Restante: 14

Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Máquina de corte de piso			
	Carro de mão			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro		Eletricista	
	Armador			
	Servente			
Serviços	Sem atividades			
Observação				

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270077088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 21/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

Tarde

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 77 Dias Restante: 13

Equipam.	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
Equipam.	Betoneira estacionária					
	Serra Manual					
	Máquina de corte de piso					
	Carro de mão					
Pessoal	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador		
	Carpinteiro			Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro			Eletricista		
	Armador					
	Servente					
Serviços	Sem atividades					
Observação						

Fiscalização:



Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8





PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 22/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

x

x

Tarde

x

x

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 78 Dias Restante: 12

Equipam.	Betoneira estacionária	1		
	Serra Manual	1		
	Máquina de corte de piso	1		
	Carro de mão	4		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
	Armador			
	Servente	2		
Serviços	Praça Reinaldo Moura			
	Gabarito e aplicação de lona			
	Regularização de piso e concretagem de pisos			
	Execução do quiosque			
	Execução do quiosque			
Observação				

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 23/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 79 Dias Restante: 11

Equipam.	Betoneira estacionária	1		
	Serra Manual	1		
	Máquina de corte de piso	1		
	Carro de mão	4		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
	Armador			
	Servente	2		
Serviços	Praça Reinaldo Moura			
	Gabarito e aplicação de lona			
	Regularização de piso e concretagem de pisos			
	Execução do banco			
	Execução do quiosque			
	Reg. Talude			
Observação				

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 24/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

x

Tarde

x

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 80 Dias Restante: 10

Equipam.	Betoneira estacionária	1	
	Serra Manual	1	
	Máquina de corte de piso	1	
	Carro de mão	4	

Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
	Armador			
	Servente	2		

Serviços	Praça Reinaldo Moura
	Gabarito e aplicação de lona
	Regularização de piso e concretagem de pisos
	Execução do banco
	Execução do quiosque
	Reg. Talude
Observação	

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 25/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

x

Tarde

x

Prazo da Obra

90

Dias Decorrido:

81

Dias Restante:

9

Equipam.	Betoneira estacionária	1
	Serra Manual	1
	Máquina de corte de piso	1
	Carro de mão	4

Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
	Armador			
	Servente	2		

Serviços	Praça Reinaldo Moura
	Gabarito e aplicação de lona
	Regularização de piso e concretagem de pisos
	Execução do banco
	Execução do quiosque
	Reg. Talude

Observação	

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 26/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

x

Tarde

x

Prazo da Obra

90

Dias Decorrido:

82

Dias Restante:

8

Equipam.

Betoneira estacionária

1

Serra Manual

1

Máquina de corte de piso

1

Carro de mão

4

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Almoxarife/Apontador

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Encanador

Carpinteiro

Pintor

Pedreiro/Calceteiro

1

Eletricista

Armador

Servente

2

Serviços

Praça Reinaldo Moura

Gabarito e aplicação de lona

Regularização de piso e concretagem de pisos

Execução do banco

Execução do quiosque

Reg. Talude

Observação

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 27/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

Tarde

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 83 Dias Restante: 7

Equipam.	Betoneira estacionária	
	Serra Manual	
	Máquina de corte de piso	
	Carro de mão	

Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro		Eletricista	
	Armador			
	Servente			

Serviços	sem atividades

Observação	

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 28/04/2024

Página: 1

Tempo

Manhã

Tarde

Chuva

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 84 Dias Restante: 6

Equipam.	Betoneira estacionária		
	Serra Manual		
	Máquina de corte de piso		
	Carro de mão		

Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro		Eletricista	
	Armador			
	Servente			

Serviços	sem atividades

Observação	

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 29/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 85 Dias Restante: 5

Equipam.	Betoneira estacionária	1
	Serra Manual	1
	Máquina de corte de piso	1
	Carro de mão	4

Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
	Armador			
	Servente	2		

Serviços	Praça Reinaldo Moura
	Gabarito e aplicação de lona
	Regularização de piso e concretagem de pisos
	Execução do banco
	Execução do quiosque
	Praça Lourival Bomfim maior
	Execução do quiosque
Observação	Limpeza

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA
E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 30/04/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra

90

Dias Decorrido:

86

Dias Restante:

4

Equipam.

Betoneira estacionária

1

Serra Manual

1

Máquina de corte de piso

1

Carro de mão

4

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Almoxarife/Apontador

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Encanador

Carpinteiro

Pintor

Pedreiro/Calceteiro

1

Eletricista

Armador

Servente

2

Serviços

Praça Reinaldo Moura

Execução do banco

Execução do quiosque

Praça Lourival Bomfim maior

Execução do quiosque

Limpeza

Observação

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270397088-8

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data: 01/04/2024
				Página: 1	
				Tempo	Sol
				Manhã	Nublado
				Tarde	Chuva
Prazo da Obra 90 Dias Decorridos: 57 Dias Restantes: 33					
Equipam.	Betoneira estacionária	1			
	Serra Manual	1			
	Máquina de corte de piso	1			
	Carro de mão	4			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro		Pintor		
	Pedreiro/Calçeteiro	1	Eletricista		
	Armador				
Serviços	Limpeza da área das praças				
	Regularização de piso e concretagem de pisos				
Observação					
Fiscalização:		Contratada:			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data: 03/04/2024
				Página: 1	
				Tempo	Sol
				Manhã	Nublado
				Tarde	Chuva
Prazo da Obra 90 Dias Decorridos: 69 Dias Restantes: 31					
Equipam.	Betoneira estacionária	1			
	Serra Manual	1			
	Máquina de corte de piso	1			
	Carro de mão	4			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro		Pintor		
	Pedreiro/Calçeteiro	1	Eletricista		
	Armador				
Serviços	Gabarito e aplicação de lona				
	Regularização de piso e concretagem de pisos				
Observação					
Fiscalização:		Contratada:			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data: 02/04/2024
				Página: 1	
				Tempo	Sol
				Manhã	Nublado
				Tarde	Chuva
Prazo da Obra 90 Dias Decorridos: 58 Dias Restantes: 32					
Equipam.	Betoneira estacionária	1			
	Serra Manual	1			
	Máquina de corte de piso	1			
	Carro de mão	4			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro		Pintor		
	Pedreiro/Calçeteiro	1	Eletricista		
	Armador				
Serviços	Gabarito e aplicação de lona				
	Regularização de piso e concretagem de pisos				
Observação					
Fiscalização:		Contratada:			

Martins Engenharia
 Dinesh Kumar
 Engenheiro Civil
 CREA: 270097088-8

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 04/04/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã	x		
				Tarde	x		
Prazo da Obra		90	Dias Decorido:	60	Dias Restante:	30	
Equipam.	Betoneira estacionária	1					
	Serra Manual	1					
	Máquina de corte de piso	1					
	Carro de mão	4					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador				
	Carpinteiro		Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista				
	Armador						
Servicos	Servente	2					
	Praça Reinaldo Moura Gabarito e aplicação de lona Regularização de piso e concretagem de pisos						
Observação							
Fiscalização:				Contratada:			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 06/04/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã			
				Tarde			
Prazo da Obra		90	Dias Decorido:	62	Dias Restante:	28	
Equipam.	Betoneira estacionária						
	Serra Manual						
	Máquina de corte de piso						
	Carro de mão						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador				
	Carpinteiro		Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro		Eletricista				
	Armador						
Servicos	Servente						
	Não Houve atividades						
Observação							
Fiscalização:				Contratada:			

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 05/04/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã	x		
				Tarde	x		
Prazo da Obra		90	Dias Decorido:	61	Dias Restante:	29	
Equipam.	Betoneira estacionária	1					
	Serra Manual	1					
	Máquina de corte de piso	1					
	Carro de mão	4					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador				
	Carpinteiro		Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista				
	Armador						
Servicos	Servente	2					
	Praça Reinaldo Moura Gabarito e aplicação de lona Regularização de piso e concretagem de pisos						
Observação							
Fiscalização:				Contratada:			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 07/04/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã			
				Tarde			
Prazo da Obra		90	Dias Decorido:	63	Dias Restante:	27	
Equipam.	Betoneira estacionária						
	Serra Manual						
	Máquina de corte de piso						
	Carro de mão						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador				
	Carpinteiro		Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro		Eletricista				
	Armador						
Servicos	Servente						
	Sem atividades						
Observação							
Fiscalização:				Contratada:			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM					
Contrato: 22/2023 Data: 08/04/2024 Página: 1		Tempo Sol Nublado Chuva Manhã x x Tarde x			
Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 64 Dias Restante: 26					
Equipam.	Betoneira estacionária		1		
	Serra Manual		1		
	Máquina de corte de piso		1		
	Carro de mão		4		
Pessoal	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1 Almojarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		1 Encanador		
	Carpinteiro		1 Pintor		
	Pedreiro/Calçeteiro		1 Eletricista		
	Armador		2		
Serviços	Praça Reinaldo Moura Gabarito e aplicação de lona Regularização de piso e concretagem de pisos Instalação de postes de concreto praças Lourival Bonfim(maior e menor) e Reinaldo Moura Instalação de luminárias				
	Observação				
	Fiscalização:				
	Contratada:				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM					
Contrato: 22/2023 Data: 10/04/2024 Página: 1		Tempo Sol Nublado Chuva Manhã x x Tarde x			
Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 66 Dias Restante: 24					
Equipam.	Betoneira estacionária		1		
	Serra Manual		1		
	Máquina de corte de piso		1		
	Carro de mão		4		
Pessoal	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1 Almojarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		1 Encanador		
	Carpinteiro		1 Pintor		
	Pedreiro/Calçeteiro		1 Eletricista		
	Armador		2		
Serviços	Praça Reinaldo Moura Gabarito e aplicação de lona Regularização de piso e concretagem de pisos				
	Observação				
	Fiscalização:				
	Contratada:				

Martins Engenharia
 Dinesh Kumar
 Engenheiro Civil
 CREA: 270097088-8

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM					
Contrato: 22/2023 Data: 09/04/2024 Página: 1		Tempo Sol Nublado Chuva Manhã x x Tarde x			
Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 65 Dias Restante: 25					
Equipam.	Betoneira estacionária		1		
	Serra Manual		1		
	Máquina de corte de piso		1		
	Carro de mão		4		
Pessoal	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1 Almojarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		1 Encanador		
	Carpinteiro		1 Pintor		
	Pedreiro/Calçeteiro		1 Eletricista		
	Armador		2		
Serviços	Praça Reinaldo Moura Gabarito e aplicação de lona Regularização de piso e concretagem de pisos Instalação de postes de concreto praças Lourival Bonfim(maior e menor) e Reinaldo Moura Instalação de luminárias				
	Observação				
	Fiscalização:				
	Contratada:				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM					
Contrato: 22/2023 Data: 11/04/2024 Página: 1		Tempo Sol Nublado Chuva Manhã x x x Tarde x x			
Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 67 Dias Restante: 23					
Equipam.	Betoneira estacionária		1		
	Serra Manual		1		
	Máquina de corte de piso		1		
	Carro de mão		4		
Pessoal	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1 Almojarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		1 Encanador		
	Carpinteiro		1 Pintor		
	Pedreiro/Calçeteiro		1 Eletricista		
	Armador		2		
Serviços	Praça Reinaldo Moura Gabarito e aplicação de lona Regularização de piso e concretagem de pisos				
	Observação				
	Fiscalização:				
	Contratada:				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM					
Contrato: 22/2023 Data: 12/04/2024 Página: 1		Tempo Sol Nublado Chuva Manhã x x Tarde x x			
Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 68 Dias Restante: 22					
Equipam.	Betoneira estacionária		1		
	Serra Manual		1		
	Máquina de corte de piso		1		
	Carro de mão		4		
Pessoal	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1		Almoxarife/Apontador
	Mestre de Obras/ Encarregado		1		Encanador
	Carpinteiro		1		Pintor
	Pedreiro/Calceteiro		1		Eletricista
	Armador		2		
Serviços	Praça Reinaldo Moura Gabarito e aplicação de lona Regularização de piso e concretagem de pisos				
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM					
Contrato: 22/2023 Data: 14/04/2024 Página: 1		Tempo Sol Nublado Chuva Manhã x x Tarde x x			
Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 70 Dias Restante: 20					
Equipam.	Betoneira estacionária		1		
	Serra Manual		1		
	Máquina de corte de piso		1		
	Carro de mão		4		
Pessoal	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1		Almoxarife/Apontador
	Mestre de Obras/ Encarregado		1		Encanador
	Carpinteiro		1		Pintor
	Pedreiro/Calceteiro		1		Eletricista
	Armador		2		
Serviços	Sem atividades				
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		

Martins Engenharia
 Dinesh Kumar
 Engenheiro Civil
 CREA: 270097088-8

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM					
Contrato: 22/2023 Data: 13/04/2024 Página: 1		Tempo Sol Nublado Chuva Manhã x x Tarde x x			
Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 69 Dias Restante: 21					
Equipam.	Betoneira estacionária		1		
	Serra Manual		1		
	Máquina de corte de piso		1		
	Carro de mão		4		
Pessoal	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1		Almoxarife/Apontador
	Mestre de Obras/ Encarregado		1		Encanador
	Carpinteiro		1		Pintor
	Pedreiro/Calceteiro		1		Eletricista
	Armador		2		
Serviços	Não Houve atividades				
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM					
Contrato: 22/2023 Data: 15/04/2024 Página: 1		Tempo Sol Nublado Chuva Manhã x x Tarde x x			
Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 71 Dias Restante: 19					
Equipam.	Betoneira estacionária		1		
	Serra Manual		1		
	Máquina de corte de piso		1		
	Carro de mão		4		
Pessoal	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1		Almoxarife/Apontador
	Mestre de Obras/ Encarregado		1		Encanador
	Carpinteiro		1		Pintor
	Pedreiro/Calceteiro		1		Eletricista
	Armador		2		
Serviços	Praça Reinaldo Moura Gabarito e aplicação de lona Regularização de piso e concretagem de pisos Instalação de marco inaugural Aterro de área(área aditivo)				
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU					
REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM					
Contrato: 22/2023		Data: 16/04/2024		Página: 1	
Tempo		Sol		Nublado	
Manhã		x			
Tarde		x			
Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 72 Dias Restante: 18					
Equipam.	Betoneira estacionária	1			
	Serra Manual	1			
	Máquina de corte de piso	1			
	Carro de mão	4			
Pessoal	Engenheiro	1		Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1		Encanador	
	Carpinteiro			Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	1		Eletricista	
	Armador				
Servente	2				
	Praça Reinaldo Moura				
Serviços	Gabarito e aplicação de lona				
	Regularização de piso e concretagem de pisos				
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU					
REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM					
Contrato: 22/2023		Data: 18/04/2024		Página: 1	
Tempo		Sol		Nublado	
Manhã		x			
Tarde		x			
Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 74 Dias Restante: 16					
Equipam.	Betoneira estacionária	1			
	Serra Manual	1			
	Máquina de corte de piso	1			
	Carro de mão	4			
Pessoal	Engenheiro	1		Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1		Encanador	
	Carpinteiro			Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	1		Eletricista	
	Armador				
Servente	2				
	Praça Reinaldo Moura				
Serviços	Gabarito e aplicação de lona				
	Regularização de piso e concretagem de pisos				
Observação	Aterro de área(área aditivo)				
	Execução de alvenaria de pedra lateral (devido desnível acentuado) e acrescimos de áreas				
Fiscalização:			Contratada:		

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU					
REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM					
Contrato: 22/2023		Data: 17/04/2024		Página: 1	
Tempo		Sol		Nublado	
Manhã		x			
Tarde		x			
Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 73 Dias Restante: 17					
Equipam.	Betoneira estacionária	1			
	Serra Manual	1			
	Máquina de corte de piso	1			
	Carro de mão	4			
Pessoal	Engenheiro	1		Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1		Encanador	
	Carpinteiro			Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	1		Eletricista	
	Armador				
Servente	2				
	Praça Reinaldo Moura				
Serviços	Gabarito e aplicação de lona				
	Regularização de piso e concretagem de pisos				
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU					
REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM					
Contrato: 22/2023		Data: 19/04/2024		Página: 1	
Tempo		Sol		Nublado	
Manhã		x			
Tarde		x			
Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 75 Dias Restante: 15					
Equipam.	Betoneira estacionária	1			
	Serra Manual	1			
	Máquina de corte de piso	1			
	Carro de mão	4			
Pessoal	Engenheiro	1		Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1		Encanador	
	Carpinteiro			Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	1		Eletricista	
	Armador				
Servente	2				
	Praça Reinaldo Moura				
Serviços	Gabarito e aplicação de lona				
	Regularização de piso e concretagem de pisos				
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM					
Contrato: 22/2023 Data: 20/04/2024 Página: 1		Tempo Sol Nublado Chuva Manhã Tarde			
Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 76 Dias Restante: 14		Tarde			
Equipam.	Betoneira estacionária				
	Serra Manual				
	Máquina de corte de piso				
	Carro de mão				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador		
	Carpinteiro		Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro		Eletricista		
	Armador				
Serviços	Sem atividades				
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM					
Contrato: 22/2023 Data: 22/04/2024 Página: 1		Tempo Sol Nublado Chuva Manhã Tarde			
Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 78 Dias Restante: 12		Tarde			
Equipam.	Betoneira estacionária		1		
	Serra Manual		1		
	Máquina de corte de piso		1		
	Carro de mão		4		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro		Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista		
	Armador				
Serviços	Praça Reinaldo Moura				
	Gabarito e aplicação de lona Regularização de piso e concretagem de pisos Execução do quiosque Execução do quiosque				
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		

Martins Engenharia
 Dinesh Kumar
 Engenheiro Civil
 CREA: 270097088-8

K

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM					
Contrato: 22/2023 Data: 21/04/2024 Página: 1		Tempo Sol Nublado Chuva Manhã Tarde			
Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 77 Dias Restante: 13		Tarde			
Equipam.	Betoneira estacionária				
	Serra Manual				
	Máquina de corte de piso				
	Carro de mão				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador		
	Carpinteiro		Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro		Eletricista		
	Armador				
Serviços	Sem atividades				
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM					
Contrato: 22/2023 Data: 23/04/2024 Página: 1		Tempo Sol Nublado Chuva Manhã Tarde			
Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 79 Dias Restante: 11		Tarde			
Equipam.	Betoneira estacionária		1		
	Serra Manual		1		
	Máquina de corte de piso		1		
	Carro de mão		4		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro		Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista		
	Armador				
Serviços	Praça Reinaldo Moura				
	Gabarito e aplicação de lona Regularização de piso e concretagem de pisos Execução do banco Execução do quiosque Reg. Talude				
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 24/04/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã	x	x	
				Tarde	x		
Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 80 Dias Restante: 10							
Equipam.	Betoneira estacionária	1					
	Serra Manual	1					
	Máquina de corte de piso	1					
	Carro de mão	4					
Pessoal	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	Quant.			
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	Quant.			
	Carpinteiro		Pintor	Quant.			
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	Quant.			
	Armador			Quant.			
	Servente	2		Quant.			
Serviços	Praça Reinaldo Moura						
	Gabarito e aplicação de lona						
	Regularização de piso e concretagem de pisos						
	Execução do banco						
	Execução do quiosque						
Observação	Reg. Talude						
Fiscalização:				Contratada:			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 26/04/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã	x	x	
				Tarde	x		
Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 82 Dias Restante: 8							
Equipam.	Betoneira estacionária	1					
	Serra Manual	1					
	Máquina de corte de piso	1					
	Carro de mão	4					
Pessoal	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	Quant.			
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	Quant.			
	Carpinteiro		Pintor	Quant.			
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	Quant.			
	Armador			Quant.			
	Servente	2		Quant.			
Serviços	Praça Reinaldo Moura						
	Gabarito e aplicação de lona						
	Regularização de piso e concretagem de pisos						
	Execução do banco						
	Execução do quiosque						
Observação	Reg. Talude						
Fiscalização:				Contratada:			

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 25/04/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã	x	x	
				Tarde	x		
Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 81 Dias Restante: 9							
Equipam.	Betoneira estacionária	1					
	Serra Manual	1					
	Máquina de corte de piso	1					
	Carro de mão	4					
Pessoal	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	Quant.			
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	Quant.			
	Carpinteiro		Pintor	Quant.			
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	Quant.			
	Armador			Quant.			
	Servente	2		Quant.			
Serviços	Praça Reinaldo Moura						
	Gabarito e aplicação de lona						
	Regularização de piso e concretagem de pisos						
	Execução do banco						
	Execução do quiosque						
Observação	Reg. Talude						
Fiscalização:				Contratada:			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 27/04/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã			
				Tarde			
Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 83 Dias Restante: 7							
Equipam.	Betoneira estacionária						
	Serra Manual						
	Máquina de corte de piso						
	Carro de mão						
Pessoal	Engenheiro		Almoxarife/Apontador	Quant.			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador	Quant.			
	Carpinteiro		Pintor	Quant.			
	Pedreiro/Calceteiro		Eletricista	Quant.			
	Armador			Quant.			
	Servente			Quant.			
Serviços	sem atividades						
Observação							
Fiscalização:				Contratada:			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU					
REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM					
Contrato: 22/2023		Data : 28/04/2024		Página: 1	
Tempo		Sol		Nublado	
Manhã		x		Chuva	
Tarde					
Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 84 Dias Restante: 6					
Equipam.	Betoneira estacionária	1			
	Serra Manual	1			
	Máquina de corte de piso	1			
	Carro de mão	4			
Pessoal	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista		
	Armador				
	Servente	2			
Serviços	sem atividades				
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU					
REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM					
Contrato: 22/2023		Data : 30/04/2024		Página: 1	
Tempo		Sol		Nublado	
Manhã		x		Chuva	
Tarde		x			
Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 86 Dias Restante: 4					
Equipam.	Betoneira estacionária	1			
	Serra Manual	1			
	Máquina de corte de piso	1			
	Carro de mão	4			
Pessoal	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista		
	Armador				
	Servente	2			
Serviços	Praça Reinaldo Moura				
	Execução do banco				
	Execução do quiosque				
	Praça Lourival Bomfim maior				
Execução do quiosque					
Limpeza					
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU					
REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM					
Contrato: 22/2023		Data : 29/04/2024		Página: 1	
Tempo		Sol		Nublado	
Manhã		x		Chuva	
Tarde		x			
Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 85 Dias Restante: 5					
Equipam.	Betoneira estacionária	1			
	Serra Manual	1			
	Máquina de corte de piso	1			
	Carro de mão	4			
Pessoal	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista		
	Armador				
	Servente	2			
Serviços	Praça Reinaldo Moura				
	Gabarito e aplicação de lona				
	Regularização de piso e concretagem de pisos				
	Execução do banco				
	Execução do quiosque				
Praça Lourival Bomfim maior					
Execução do quiosque					
Limpeza					
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU					
REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM					
Contrato: 22/2023		Data : 01/05/2024		Página: 1	
Tempo		Sol		Nublado	
Manhã		x		Chuva	
Tarde		x			
Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 87 Dias Restante: 3					
Equipam.	Betoneira estacionária				
	Serra Manual				
	Máquina de corte de piso				
	Carro de mão				
Pessoal	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador		
	Carpinteiro		Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro		Eletricista		
	Armador				
	Servente				
Serviços	Sem atividades- feriado				
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 02/05/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã	x		
				Tarde	x		
Prazo da Obra		90 Dias Decorrido:	88 Dias Restante:	2			
Equipam.	Betoneira estacionária		1				
	Serra Manual		1				
	Máquina de corte de piso		1				
	Carro de mão		4				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		1 Almojarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado		0 Encanador				
	Carpinteiro		1 Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro		1 Eletricista				
	Armador						
Serviços	Servente		1				
	Limpeza e acabamento						
Observação							
Fiscalização:				Contratada:			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 04/05/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã			
				Tarde			
Prazo da Obra		180 Dias Decorrido:	90 Dias Restante:	90			
Equipam.	Betoneira estacionária						
	Serra Manual						
	Máquina de corte de piso						
	Carro de mão						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		1 Almojarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado		0 Encanador				
	Carpinteiro		1 Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro		1 Eletricista				
	Armador						
Serviços	Servente						
	sem atividades						
Observação							
Fiscalização:				Contratada:			

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 03/05/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã	x		
				Tarde	x		
Prazo da Obra		180 Dias Decorrido:	89 Dias Restante:	91			
Equipam.	Betoneira estacionária		1				
	Serra Manual		1				
	Máquina de corte de piso		1				
	Carro de mão		4				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		1 Almojarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado		0 Encanador				
	Carpinteiro		1 Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro		1 Eletricista				
	Armador						
Serviços	Servente		1				
	Limpeza e acabamento						
Observação							
Fiscalização:				Contratada:			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 05/05/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã			
				Tarde			
Prazo da Obra		180 Dias Decorrido:	91 Dias Restante:	89			
Equipam.	Betoneira estacionária						
	Serra Manual						
	Máquina de corte de piso						
	Carro de mão						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		1 Almojarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado		0 Encanador				
	Carpinteiro		1 Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro		1 Eletricista				
	Armador						
Serviços	Servente						
	sem atividades						
Observação							
Fiscalização:				Contratada:			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 06/05/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã			
				Tarde			
Prazo da Obra		180	Dias Decorrido:	9	Dias Restante:	171	
Equipam.	Betoneira estacionária	1					
	Serra Manual	1					
	Máquina de corte de piso	1					
	Carro de mão	4					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	0	Encanador				
	Carpinteiro		Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista				
Serviços	Armador						
	Servente	1					
	Reboco de bancos de alvenaria						
Observação							
Fiscalização:			Contratada:				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 08/05/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã	x		
				Tarde	x	xx	
Prazo da Obra		180	Dias Decorrido:	94	Dias Restante:	86	
Equipam.	Betoneira estacionária	1					
	Serra Manual	1					
	Máquina de corte de piso	1					
	Carro de mão	4					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	0	Encanador				
	Carpinteiro		Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista				
Serviços	Armador						
	Servente	1					
	Reboco de bancos de alvenaria						
	Quiosque praça L. Bonfim maior						
Observação							
Fiscalização:			Contratada:				

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 07/05/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã	x		
				Tarde	x		
Prazo da Obra		180	Dias Decorrido:	93	Dias Restante:	87	
Equipam.	Betoneira estacionária	1					
	Serra Manual	1					
	Máquina de corte de piso	1					
	Carro de mão	4					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	0	Encanador				
	Carpinteiro		Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista				
Serviços	Armador						
	Servente	1					
	Reboco de bancos de alvenaria						
	Quiosque praça L. Bonfim maior						
Observação							
Fiscalização:			Contratada:				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 09/05/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã	x		
				Tarde	x	x	x
Prazo da Obra		180	Dias Decorrido:	95	Dias Restante:	85	
Equipam.	Betoneira estacionária	1					
	Serra Manual	1					
	Máquina de corte de piso	1					
	Carro de mão	4					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	0	Encanador				
	Carpinteiro		Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista				
Serviços	Armador						
	Servente	1					
	Reboco de bancos de alvenaria						
	Quiosque praça L. Bonfim maior						
Observação							
Fiscalização:			Contratada:				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 10/05/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã	x		
				Tarde	x		
Prazo da Obra 180 Dias Decorrido: 96 Dias Restante: 84							
Equipam.	Betoneira estacionária		1				
	Serra Manual		1				
	Máquina de corte de piso		1				
	Carro de mão		4				
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		0	Encanador			
	Carpinteiro			Pintor			
	Pedreiro/Calceteiro		1	Eletricista			
	Armador						
Serviços	Reboco de bancos de alvenaria						
	Quiosque praça L. Bonfim maior e Reinaldo Moura						
Observação							
Fiscalização:				Contratada:			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 12/05/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã			
				Tarde			
Prazo da Obra 180 Dias Decorrido: 98 Dias Restante: 82							
Equipam.	Betoneira estacionária						
	Serra Manual						
	Máquina de corte de piso						
	Carro de mão						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador			
	Carpinteiro			Pintor			
	Pedreiro/Calceteiro			Eletricista			
	Armador						
Serviços	sem atividades						
Observação							
Fiscalização:				Contratada:			

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 11/05/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
Prazo da Obra 180 Dias Decorrido: 97 Dias Restante: 83							
Equipam.	Betoneira estacionária						
	Serra Manual						
	Máquina de corte de piso						
	Carro de mão						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador			
	Carpinteiro			Pintor			
	Pedreiro/Calceteiro			Eletricista			
	Armador						
Serviços							
Observação							
Fiscalização:				Contratada:			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 13/05/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã	x		
				Tarde	x		
Prazo da Obra 180 Dias Decorrido: 99 Dias Restante: 81							
Equipam.	Betoneira estacionária		1				
	Serra Manual		1				
	Máquina de corte de piso		1				
	Carro de mão		4				
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		0	Encanador			
	Carpinteiro			Pintor			
	Pedreiro/Calceteiro		1	Eletricista			
	Armador						
Serviços	Reboco de bancos de alvenaria						
	Quiosque praça L. Bonfim maior e Reinaldo Moura						
Observação							
Fiscalização:				Contratada:			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 14/05/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã	x		
				Tarde	x		
Prazo da Obra 180		Dias Decorrido: 100	Dias Restante: 80				
Equipam.	Betoneira estacionária	1					
	Serra Manual	1					
	Máquina de corte de piso	1					
	Carro de mão	4					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	0	Encanador				
	Carpinteiro		Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista				
	Armador						
Servicos	Servente	1					
	Reboco de bancos de alvenaria Quiosque praça L. Bonfim maior e Reinaldo Moura						
Observação							
Fiscalização:			Contratada:				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 16/05/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã	x	x	
				Tarde	x		
Prazo da Obra 180		Dias Decorrido: 102	Dias Restante: 78				
Equipam.	Betoneira estacionária	1					
	Serra Manual	1					
	Máquina de corte de piso	1					
	Carro de mão	4					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	0	Encanador				
	Carpinteiro		Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista				
	Armador						
Servicos	Servente	1					
	Reboco de bancos de alvenaria Quiosque praça L. Bonfim maior e Reinaldo Moura Limpeza e remoção de entulho						
Observação							
Fiscalização:			Contratada:				

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 15/05/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã	x		
				Tarde	x		
Prazo da Obra 180		Dias Decorrido: 101	Dias Restante: 79				
Equipam.	Betoneira estacionária	1					
	Serra Manual	1					
	Máquina de corte de piso	1					
	Carro de mão	4					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	0	Encanador				
	Carpinteiro		Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista				
	Armador						
Servicos	Servente	1					
	Reboco de bancos de alvenaria Quiosque praça L. Bonfim maior e Reinaldo Moura						
Observação							
Fiscalização:			Contratada:				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 17/05/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã	x	x	
				Tarde	x		
Prazo da Obra 180		Dias Decorrido: 103	Dias Restante: 77				
Equipam.	Betoneira estacionária	1					
	Serra Manual	1					
	Máquina de corte de piso	1					
	Carro de mão	4					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	0	Encanador				
	Carpinteiro		Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista				
	Armador						
Servicos	Servente	1					
	Limpeza Reboco de bancos de alvenaria Quiosque praça L. Bonfim maior e Reinaldo Moura Cobertura quiosque						
Observação							
Fiscalização:			Contratada:				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 18/05/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã			
				Tarde			
Prazo da Obra 180Dias Decorrido: 104Dias Restante: 70							
Equipam.	Betoneira estacionária						
	Serra Manual						
	Máquina de corte de piso						
	Carro de mão						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		0	Encanador			
	Carpinteiro			Pintor			
	Pedreiro/Calceteiro		1	Eletricista			
	Armador						
Serviços	Sem atividades						
Observação							
Fiscalização:				Contratada:			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 20/05/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã	x	x	
				Tarde	x		
Prazo da Obra 180Dias Decorrido: 106Dias Restante: 74							
Equipam.	Betoneira estacionária		1				
	Serra Manual		1				
	Máquina de corte de piso		1				
	Carro de mão		4				
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		0	Encanador			
	Carpinteiro			Pintor			
	Pedreiro/Calceteiro		1	Eletricista			
	Armador						
Serviços	Quiosque praça L. Bonfim maior e Reinaldo Moura						
	Cobertura quiosque						
Observação							
Fiscalização:				Contratada:			

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 19/05/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã			
				Tarde			
Prazo da Obra 180Dias Decorrido: 105Dias Restante: 75							
Equipam.	Betoneira estacionária						
	Serra Manual						
	Máquina de corte de piso						
	Carro de mão						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador			
	Carpinteiro			Pintor			
	Pedreiro/Calceteiro			Eletricista			
	Armador						
Serviços	Não houve atividades						
Observação							
Fiscalização:				Contratada:			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 21/05/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã	x	x	
				Tarde	x		
Prazo da Obra 180Dias Decorrido: 107Dias Restante: 73							
Equipam.	Betoneira estacionária		1				
	Serra Manual		1				
	Máquina de corte de piso		1				
	Carro de mão		4				
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		0	Encanador			
	Carpinteiro			Pintor			
	Pedreiro/Calceteiro		1	Eletricista			
	Armador						
Serviços	Quiosque praça L. Bonfim maior e Reinaldo Moura						
	Cobertura quiosque						
Observação							
Fiscalização:				Contratada:			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 22/05/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã	x		
				Tarde	x		
Prazo da Obra 180 Dias Decorrido: 108 Dias Restante: 72							
Equipam.	Betoneira estacionária	1					
	Serra Manual	1					
	Máquina de corte de piso	1					
	Carro de mão	4					
Pessoal	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	0	Encanador				
	Carpinteiro		Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista				
	Armador						
	Servente	1					
Serviços	Quiosque praça L. Bonfim maior e Reinaldo Moura						
	Cobertura quiosque						
Observação							
Fiscalização:				Contratada:			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 24/05/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã	x		
				Tarde	x		
Prazo da Obra 180 Dias Decorrido: 110 Dias Restante: 70							
Equipam.	Betoneira estacionária	1					
	Serra Manual	1					
	Máquina de corte de piso	1					
	Carro de mão	4					
Pessoal	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	0	Encanador				
	Carpinteiro		Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista				
	Armador						
	Servente	1					
Serviços	Limpeza e organização de ferramentas						
Observação							
Fiscalização:				Contratada:			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 23/05/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã	x		
				Tarde	x		
Prazo da Obra 180 Dias Decorrido: 109 Dias Restante: 71							
Equipam.	Betoneira estacionária	1					
	Serra Manual	1					
	Máquina de corte de piso	1					
	Carro de mão	4					
Pessoal	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	0	Encanador				
	Carpinteiro		Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista				
	Armador						
	Servente	1					
Serviços	Quiosque praça L. Bonfim maior e Reinaldo Moura						
	Cobertura quiosque						
Observação							
Fiscalização:				Contratada:			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIARAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 25/05/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã	x		
				Tarde	x		
Prazo da Obra 180 Dias Decorrido: 111 Dias Restante: 69							
Equipam.	Betoneira estacionária						
	Serra Manual						
	Máquina de corte de piso						
	Carro de mão						
Pessoal	Engenheiro		Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador				
	Carpinteiro		Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro		Eletricista				
	Armador						
	Servente						
Serviços	Limoeza e organização de ferramentas						
Observação							
Fiscalização:				Contratada:			

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097668-8

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023 Data: 26/05/2024 Página: 1	Tempo Manhã Sol Nublado Chuva
Prazo da Obra: 180 Dias Decorrido: 112 Dias Restante: 68				Tempo Manhã Sol Nublado Chuva	
Equipam.	Betoneira estacionária		1		
	Serra Manual		1		
	Máquina de corte de piso		1		
	Carro de mão		4		
Pessoal	Engenheiro		1		Almoxarife/Apontador
	Mestre de Obras/ Encarregado		0		Encanador
	Carpinteiro				Pintor
	Pedreiro/Calceteiro		1		Eletricista
	Armador				
	Servente		1		
Serviços	sem atividades				
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023 Data: 28/05/2024 Página: 1	Tempo Manhã Sol Nublado Chuva
Prazo da Obra: 180 Dias Decorrido: 114 Dias Restante: 66				Tempo Manhã Sol Nublado Chuva	
Equipam.	Betoneira estacionária		1		
	Serra Manual		1		
	Máquina de corte de piso		1		
	Carro de mão		4		
Pessoal	Engenheiro		1		Almoxarife/Apontador
	Mestre de Obras/ Encarregado		0		Encanador
	Carpinteiro				Pintor
	Pedreiro/Calceteiro		1		Eletricista
	Armador				
	Servente		1		
Serviços	Regulização de pisos				
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		

Martins Engenharia
 Dinesh Kumar
 Engenheiro Civil
 CREA: 270097088-8

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023 Data: 27/05/2024 Página: 1	Tempo Manhã Sol Nublado Chuva
Prazo da Obra: 180 Dias Decorrido: 113 Dias Restante: 67				Tempo Manhã Sol Nublado Chuva	
Equipam.	Betoneira estacionária		1		
	Serra Manual		1		
	Máquina de corte de piso		1		
	Carro de mão		4		
Pessoal	Engenheiro		1		Almoxarife/Apontador
	Mestre de Obras/ Encarregado		0		Encanador
	Carpinteiro				Pintor
	Pedreiro/Calceteiro		1		Eletricista
	Armador				
	Servente		1		
Serviços	Regulização de pisos				
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS ENGENHARIA	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023 Data: 29/05/2024 Página: 1	Tempo Manhã Sol Nublado Chuva
Prazo da Obra: 180 Dias Decorrido: 115 Dias Restante: 65				Tempo Manhã Sol Nublado Chuva	
Equipam.	Betoneira estacionária		1		
	Serra Manual		1		
	Máquina de corte de piso		1		
	Carro de mão		4		
Pessoal	Engenheiro		1		Almoxarife/Apontador
	Mestre de Obras/ Encarregado		0		Encanador
	Carpinteiro				Pintor
	Pedreiro/Calceteiro		1		Eletricista
	Armador				
	Servente		1		
Serviços	Regulização de pisos				
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM					
Contrato: 22/2023 Data: 30/05/2024 Página: 1		Tempo Sol Nublado Chuva Manhã Tarde			
Prazo da Obra 180 Dias Decorrido: 116 Dias Restante: 64					
Equipam.	Betoneira estacionária				
	Serra Manual				
	Máquina de corte de piso				
	Carro de mão				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador		
	Carpinteiro		Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro		Eletricista		
Serviços	Armador				
	Servente				
Observação	sem atividades - Feriado				
Fiscalização:		Contratada:			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM					
Contrato: 22/2023 Data: 09/06/2024 Página: 1		Tempo Sol Nublado Chuva Manhã Tarde			
Prazo da Obra 180 Dias Decorrido: 126 Dias Restante: 55					
Equipam.	Betoneira estacionária		1		
	Serra Manual		1		
	Máquina de corte de piso		1		
	Carro de mão		4		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro		Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro	6	Eletricista		
Serviços	Armador				
	Servente		6		
Observação	Banco de concreto praça reinaldo moura				
	Limpeza geral				
Fiscalização:		Contratada:			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM					
Contrato: 22/2023 Data: 31/05/2024 Página: 1		Tempo Sol Nublado Chuva Manhã Tarde			
Prazo da Obra 180 Dias Decorrido: 117 Dias Restante: 63					
Equipam.	Betoneira estacionária		1		
	Serra Manual		1		
	Máquina de corte de piso		1		
	Carro de mão		4		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	0	Encanador		
	Carpinteiro		Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista		
Serviços	Armador				
	Servente		1		
Observação	Reboco de bancos de concreto e emassamento de cumeira quiosques				
Fiscalização:		Contratada:			

Martins Engenharia
 Dinesh Kumar
 Engenheiro Civil
 CREA: 270097088-8



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº **SE20240370700**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

DINESH KUMAR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2700970888

Registro: 10595SE

Empresa contratada: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

Registro: 0000162345-SE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE PIRAMBU
PRAÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

Nº 16

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PIRAMBU

UF: SE

CEP: 49190000

Contrato: 22/2023

Celebrado em: 22/01/2024

Valor: R\$ 289.215,17

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

CONJUNTO REINALDO MOURA E LOURIVAL BOMFIM

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: PIRAMBU

UF: SE

CEP: 49190000

Data de início: 12/03/2024

Previsão de término: 05/04/2024

Cordenadas Geográficas: -10.740422, -36.861025

Finalidade: Outro

Código: 44905100

Proprietário: MUNICÍPIO DE PIRAMBU

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

1.360,56

m2

49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO

255,18

m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder à baixa desta ART

5. Observações

CONTRATO Nº 22/2023; OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.

- Clausula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem de acordo com a Lei nº 9.307 de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Documento assinado digitalmente

7. Entidade de Classe

SENCE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SERGIPE



DINESH KUMAR

Data: 13/03/2024 12:01:29:030

Verifique em: <https://validar.crea.org.br>

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DINESH KUMAR - CPF: 267.687.395-49

Local

data

MUNICÍPIO DE PIRAMBU - CNPJ: 13.095.039/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 262,55

Registrada em: 13/03/2024

Valor pago: R\$ 262,55

Nosso Número: 8203066422

Documento assinado digitalmente

MANGEL MESSIAS SOARES NETO

Data: 14/03/2024 08:04:58:1000

Verifique em: <https://validar.crea.org.br>

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-se.org.br/publicar_com_a_chave:892196

Impresso em: 13/03/2024 às 21:58:45 por: IP: 191.193.220.26

www.crea-se.org.br

crea-se@crea-se.org.br

Tel: 3234-3000

Fax: XXXX-XXXX

CREA-SE
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

15.190.486/0001-45

Razão Social:

MARTINS CONSTRUCAO MANUTENCAO E SERVICOS

Endereço:

RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS SN GALPAO 01 / ANTONIO B TELES / CARMOPOLIS / SE / 49740-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/05/2024 a 22/06/2024 ✓

Certificação Número: 2024052420062027788082

Informação obtida em 03/06/2024 08:38:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135-CENTRO Telefone: (79)3277-1210 CNPJ: 13.108.535/0001-22

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ***** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 06/06/2024

Contribuinte: MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA		Inscrição Mercantil: 200052591 Sequencial: 13391 Referência Loteamento:
Localização: RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS, S/N, , SANTA BARBARA		Cadastro Imobiliário: 01.01.1814.0313.001
Natureza: Tributos Mercantis		Inscrição Imobiliária: 3164
Razão Social: MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
15.190.486/0001-45		200052591
Atividade Principal: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Atividades Secundárias 2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 2513-6/00 - FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA 2539-0/02 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS 3311-2/00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E		
Início Atividade: 01/03/2012	Validade: 05/08/2024	
Observações: Válido por 59 dias.		
VIA INTERNET		



Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/carmopolis//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

1F93D9061860A774AFE5985CCA0E64750C512359



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARTINS CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA
CNPJ: 49.179.259/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:42:40 do dia 20/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/11/2024.

Código de controle da certidão: **6EB4.7A38.ED47.A016**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 259015 / 2024

Inscrição Estadual: 271630531

Razão Social: MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ: 15190486000145

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Endereço: RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS QUADRAB
TELES - CARMOPOLIS CEP: 49740000

GALPAO01 , ANTONIO BARRETO

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressaltando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **03/06/2024** , válida até **03/07/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240603C4C4VB



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.190.486/0001-45
Certidão nº: 12080264/2024
Expedição: 22/02/2024, às 11:28:10
Validade: 20/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 15.190.486/0001-45, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE**

Av. Pres. Tancredo Neves, 40 - Fórum Monsenhor Alberto B. de Azevedo - Bairro Centro - Japaratuba - SE - CEP 49960000 - www.tjse.jus.br
COMARCA DE JAPARATUBA - CARTÓRIO

CERTIDÃO**Processo nº: 0005500-46.2024.8.25.8825**

Certifico que a pedido da parte interessada, MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 15.190.486/0001-45, foi realizada consulta no Sistema de Controle Processual do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, tendo sido constatada a existência de processo judicial em desfavor da parte.

Dados do processo:**Número Único** 0000056-09.2024.8.25.0038**Situação:** ANDAMENTO**Classe:** Monitória**Distribuição:** 17/01/2024**Competência:** Japaratuba

Documento assinado eletronicamente por **THAIS DE SOUZA SANTOS**, Técnico Judiciário, em 01/03/2024, às 11:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjse.jus.br/autenticacao-de-documentos> informando o código verificador **2229825** e o código CRC **E1209ED5**.

0005500-46.2024.8.25.8825

2229825v2

"Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o
Meio Ambiente"



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL

RESULTADO: POSITIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: Martins Construção Manutenção e Serviços Industriais LTDA

Tipo de Pessoa: Jurídica

CNPJ: 15.190.486/0001-45

Nome Fantasia: Martins Construções e Serviços

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

Nº Processo	Classe	Juízo de Tramitação
0000056-09.2024.8.25.0038	Monitória	Japaratuba

OBSERVAÇÕES

1. Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão 2024.0082893 expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em 24/05/2024 e válida até 23/06/2024.

Código de Autenticidade nº 2037.5372.5541.4495



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra	Nome da obra	Data do cadastramento	Origem do cadastramento
90.018.51436/73	REFORMA DE PRAÇAS	21/03/2024 14:38	e-CAC
Tipo Zona	ART	RRT	CIB
Zona Urbana	SE20240370700		
Data do início da obra	CNAE	Cadastro Imobiliário	
12/03/2024	4213600 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas	NÃO INFORMADO	

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	12/03/2024

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	PIRAMBU	SE	49.190-000
Bairro	Logradouro	Número	
DIVERSOS	CONJUNTO REINALDO MOURA E LOURIVAL BOMFIM	S N	

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
MARTINS CONSTRUCAO, MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	15.190.486/0001-45	Construtora
Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade	
12/03/2024		

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
13.095.039/0001-81	MUNICIPIO DE PIRAMBU

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Residencial unifamiliar	Mista	1.360,56 m²
Reforma	Residencial unifamiliar	Mista	1.360,56 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra
1.360,56 m²

CPF/CNPJ do Empregador
15.190.486

Nome/Razão Social do Empregador
MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124040903657020-3

Tag
15190486 03/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

23.895,64

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	114	23.895,64	0,00	0,00	0,00	23.895,64
Total Geral:		23.895,64	0,00	0,00	0,00	23.895,64

Data de geração da Guia: 09/04/2024 às 11:24:05 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 23.895,64

Realizado em: 18/04/2024 - 08:27:36

Solicitante: MARCOS MARTINS DA ROCHA

Cooperativa e conta origem: 2102/09791-8

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: Martins Locacoes E Servicos Ltda

CNPJ do pagador: 15.190.486/0001-45

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: MARTINS CONSTRUCAO MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIA

CNPJ do devedor: 15.190.486/0001-45

ID da transação: E0292338920240418112727Dw5krECm9

Dados gerais:

Identificador: c1160d6d601c4210972fe7eaaa9837ea

Valor original: R\$ 23.895,64

Vencimento: 19/04/2024

Autenticação Eletrônica: E029.2338.9202.4041.8112.727D.w5kr.ECm9

Número de Controle: 10749610659

Emitido em: 18/04/2024 - 08:27:39

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
15.190.486/0001-45

Razão Social
MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIA

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24108.7075103-8

Pagar este documento até
19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000224254660

Valor Total do Documento
37.393,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.609,00			5.609,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	9.404,78			9.404,78
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.837,31			7.837,31
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	626,98			626,98
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	583,40			583,40
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	875,10			875,10
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	2.551,52			2.551,52
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	3.827,29			3.827,29
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.880,95			1.880,95
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.931,21			3.931,21
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

17/04/2024 14:13:52

85890000373 4 93670385241 6 10071624108 7 70751038079 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000373 4 93670385241 6 10071624108 7 70751038079 6



CNPJ: 15.190.486/0001-45
Número: 07.16.24108.7075103-8
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 37.393,67

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	54,37			54,37
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	211,76			211,76
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	37.393,67			37.393,67



Associado: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAL LTDA
Cooperativa: 2102 **Conta Corrente:** 09791-8 **Impresso em** 19/04/2024 15:58:21

Tributos

Solicitante: MARCOS
Cooperativa Origem: 2102
Conta Origem: 09791-8
Número de Controle: 3165 - SE
Tipo de Documento: DARF COOP COD BARRAS
Agente Arrecadador: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras: 85890000373 4 93670385241 6 10071624108 7 70751038079 6
Valor Total (R\$): 37.393,67
Data Vencimento: 19/04/2024
Data do Pagamento: 19/04/2024
Hora do Pagamento: 15:58
Descrição do Pagamento:
Autenticação Mecânica: SER12342-7R1WQ 321213 * 37.393,67
19/04/2024 * ***** 1ERRF21443782
Autenticação Eletrônica: 1WR2.3721.462R.1W42R.P249.2RTQ1.DR32.T23R2

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

15.190.486

Nome Empregador:

MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIA

Qtd. Trabalhadores:

114

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/04/2024

Número da Guia:

0124040903657020-3

Emitida por:

10.451.338/0001-13 - CONTEPA -

Data Emissão:

09/04/2024 11:24:05 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.190.486/0001-45		Tomador:		33.000.167/0001-01								
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ABNEZIO JOSE DA SILVA	00273000185	042.474.316-76	101	19/04/2024	Mensal	3.040,27		243,22	0,00	0,00	0,00	243,22
03/2024		ADAO NILSON PEREIRA DA SILVA	00273000214	070.451.776-07	101	19/04/2024	Mensal	3.530,52		282,44	0,00	0,00	0,00	282,44
03/2024		ADILSON PEREIRA DA SILVA	00273000186	971.908.456-15	101	19/04/2024	Mensal	3.727,40		298,19	0,00	0,00	0,00	298,19
03/2024		ADRIANA LABELA PEREIRA DIAS	00273000150	104.225.516-43	101	19/04/2024	Mensal	5.247,95		419,83	0,00	0,00	0,00	419,83
03/2024		ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS	00273000151	091.661.008-14	101	19/04/2024	Mensal	2.364,97		189,19	0,00	0,00	0,00	189,19
03/2024		ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA	00273000244	035.609.096-51	101	19/04/2024	Mensal	2.864,90		229,19	0,00	0,00	0,00	229,19
03/2024		ANDREISA VIEIRA AVELINO	00273000152	039.576.426-20	101	19/04/2024	Mensal	2.583,97		206,71	0,00	0,00	0,00	206,71
03/2024		ANGELINA MIRIAM DA SILVA OLIVEIRA	00273000153	139.893.496-86	101	19/04/2024	Mensal	2.182,32		174,58	0,00	0,00	0,00	174,58
03/2024		ARTUR TEIXEIRA DA SILVA	00273000179	712.377.636-49	101	19/04/2024	Mensal	4.806,52		384,52	0,00	0,00	0,00	384,52
03/2024		BOLIVAR DE SOUSA AMENO	00273000248	008.810.656-09	101	19/04/2024	Mensal	2.486,41		198,91	0,00	0,00	0,00	198,91
03/2024		CARLOS ANDRE FONSECA	00273000215	067.337.116-54	101	19/04/2024	Mensal	3.437,95		275,03	0,00	0,00	0,00	275,03
03/2024		CARLOS JUNIO RODRIGUES DAMASCENO	00273000187	101.808.816-47	101	19/04/2024	Mensal	3.054,23		244,33	0,00	0,00	0,00	244,33
03/2024		CELESTE PERPETUA DA SILVA TORRES	00273000154	057.290.006-89	101	19/04/2024	Mensal	2.546,04		203,68	0,00	0,00	0,00	203,68
03/2024		CLEBER OTACILIO DA SILVA	00273000216	910.029.906-53	101	19/04/2024	Mensal	4.037,62		323,00	0,00	0,00	0,00	323,00
03/2024		CRISTINA DIAS DOS SANTOS CRUZ	00273000155	028.170.096-55	101	19/04/2024	Mensal	2.313,36		185,06	0,00	0,00	0,00	185,06
03/2024		DANIEL PINTO DE GOES	00273000156	041.402.216-58	101	19/04/2024	Mensal	3.295,38		263,63	0,00	0,00	0,00	263,63
03/2024		DANIELA SANTOS DIAS	00273000182	073.004.886-17	101	19/04/2024	Mensal	2.364,97		189,19	0,00	0,00	0,00	189,19
03/2024		DENIS XAVIER GIRARDI	00273000188	049.814.856-46	101	19/04/2024	Mensal	2.118,77		169,50	0,00	0,00	0,00	169,50
03/2024		DIONISIO CANDIDO BARBOSA FILHO	00273000189	046.204.196-48	101	19/04/2024	Mensal	4.354,62		348,36	0,00	0,00	0,00	348,36
03/2024		EDMILSON SOUZA LOPES	00273000245	085.137.036-56	101	19/04/2024	Mensal	2.864,90		229,19	0,00	0,00	0,00	229,19
03/2024		EDVAN BERNARDO DA CRUZ	00273000196	095.401.266-65	101	19/04/2024	Mensal	3.393,70		271,49	0,00	0,00	0,00	271,49
03/2024		ELAINE CRISTINA MAGALHAES DE MOURA	00273000157	011.971.926-62	101	19/04/2024	Mensal	2.183,91		174,71	0,00	0,00	0,00	174,71
03/2024		ELENILDA DA CONSOLACAO PEIXOTO GON	00273000183	060.254.456-48	101	19/04/2024	Mensal	2.366,49		189,31	0,00	0,00	0,00	189,31
03/2024		ELIANA GOMES CAMILO SOUSA	00273000159	034.566.856-10	101	19/04/2024	Mensal	2.183,91		174,71	0,00	0,00	0,00	174,71
03/2024		ELOIZO DE SOUZA GOMES	00273000190	000.639.376-46	101	19/04/2024	Mensal	3.763,68		301,09	0,00	0,00	0,00	301,09
03/2024		EIVANDRO SOARES DE MIRANDA	00273000270	106.935.556-96	101	19/04/2024	Mensal	2.830,83		226,46	0,00	0,00	0,00	226,46
03/2024		FABIANE APARECIDA SORRENTINO DE SOU	00273000235	066.474.426-50	101	19/04/2024	Mensal	2.625,09		210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
03/2024		FABIANO APARECIDO MOURA	00273000175	060.962.376-14	101	19/04/2024	Mensal	6.097,36		487,78	0,00	0,00	0,00	487,78
03/2024		FELIPE FERREIRA FIRMINO DA SILVA	00273000181	120.597.696-55	101	19/04/2024	Mensal	2.959,20		236,73	0,00	0,00	0,00	236,73
03/2024		FERNANDO DOS SANTOS	00273000183	037.907.776-09	101	19/04/2024	Mensal	1.322,94		105,83	0,00	0,00	0,00	105,83
03/2024		FLAVIA FERREIRA DE CRISTO	00273000160	087.336.636-02	101	19/04/2024	Mensal	2.604,50		208,36	0,00	0,00	0,00	208,36
03/2024		FLAVIANO APARECIDO MOURA	00273000192	083.605.356-71	101	19/04/2024	Mensal	1.971,20		157,69	0,00	0,00	0,00	157,69
03/2024		FRANCIELLE MONIKE DE SOUZA	00273000250	143.680.516-37	101	19/04/2024	Mensal	2.948,21		235,85	0,00	0,00	0,00	235,85
03/2024		GABRIEL VIEIRA SANTOS	00273000271	634.548.586-15	101	19/04/2024	Mensal	2.217,23		177,37	0,00	0,00	0,00	177,37
03/2024		GEDAIL SILVA NASCIMENTO	00273000268	651.396.406-78	101	19/04/2024	Mensal	3.270,69		261,65	0,00	0,00	0,00	261,65
03/2024		GERALDO MAGELA DE ASSIS	00273000210	655.801.766-00	101	19/04/2024	Mensal	3.764,66		301,17	0,00	0,00	0,00	301,17
03/2024		GERALDO SALVIANO	00273000197	045.049.966-93	101	19/04/2024	Mensal	3.525,06		282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
03/2024		GIOVANI SOUZA GONZAGA	00273000272		101	19/04/2024	Mensal	2.482,33		198,58	0,00	0,00	0,00	198,58



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

15.190.486

Nome Empregador:

MARTINS CONSTRUCAO.MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIA

Vencimento da Guia:

19/04/2024

Número da Guia:

0124040903657020-3

Emitida por:

10.451.338/0001-13 - CONTEPA -

Qtld. Trabalhadores:

114

Origem:

Gestão de Guias

Data Emissão:

09/04/2024 11:24:05 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.190.486/0001-45		Tomador:		33.000.167/0001-01								
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		GUILHERME SOUZA MAINARTE DA SILVA	00273000161	132.543.646-19	101	19/04/2024	Mensal	773,18		61,84	0,00	0,00	0,00	61,84
03/2024		GUSTAVO RAMALHO DA SILVA	00273000224	022.012.586-43	101	19/04/2024	Mensal	2.167,71		173,41	0,00	0,00	0,00	173,41
03/2024		HELIO TEIXEIRA	00273000263	795.020.596-20	101	19/04/2024	Mensal	3.019,37		241,54	0,00	0,00	0,00	241,54
03/2024		ISAÍAS MARIANO	00273000194	038.845.366-48	101	19/04/2024	Mensal	2.831,49		226,51	0,00	0,00	0,00	226,51
03/2024		IVONE RIBEIRO GUIMARAES ARAUJO	00273000234	042.740.286-46	101	19/04/2024	Mensal	2.507,57		200,60	0,00	0,00	0,00	200,60
03/2024		JAIME MAGALHAES DOS SANTOS	00273000198	082.791.746-56	101	19/04/2024	Mensal	2.987,67		239,01	0,00	0,00	0,00	239,01
03/2024		JOANITA GONCALVES DE SOUZA	00273000227	055.392.906-23	101	19/04/2024	Mensal	2.365,36		189,22	0,00	0,00	0,00	189,22
03/2024		JOSE BATISTA GERMANO	00273000211	098.352.608-77	101	19/04/2024	Mensal	2.679,41		214,35	0,00	0,00	0,00	214,35
03/2024		JULIO CEZAR MACIEL	00273000180	676.841.496-87	101	19/04/2024	Mensal	3.064,89		245,19	0,00	0,00	0,00	245,19
03/2024		LAURA DA PENHA RODRIGUES DE PAULA	00273000247	063.692.376-20	101	19/04/2024	Mensal	2.003,60		160,28	0,00	0,00	0,00	160,28
03/2024		LEDSON PAULA FERNANDES	00273000258	043.704.996-58	101	19/04/2024	Mensal	6.365,41		509,23	0,00	0,00	0,00	509,23
03/2024		LEONARDO PINTO GUIMARAES	00273000269	114.767.856-19	101	19/04/2024	Mensal	2.755,09		220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
03/2024		LEONORA PEREIRA DE ANDRADE	00273000176	054.204.816-77	101	19/04/2024	Mensal	2.545,67		203,65	0,00	0,00	0,00	203,65
03/2024		LIZANDRA SANTOS TEIXEIRA	00273000228	127.186.316-27	101	19/04/2024	Mensal	2.981,65		238,53	0,00	0,00	0,00	238,53
03/2024		LORENA ANASTACIA SOARES ALVES	00273000280	104.619.986-29	101	19/04/2024	Mensal	4.532,07		362,56	0,00	0,00	0,00	362,56
03/2024		LUIZ GUSTAVO DE FREITAS GONCALVES	00273000273	165.723.086-42	101	19/04/2024	Mensal	2.363,99		189,11	0,00	0,00	0,00	189,11
03/2024		LUIZ TIAGO DE FREITAS	00273000162	093.916.916-92	101	19/04/2024	Mensal	2.364,60		189,16	0,00	0,00	0,00	189,16
03/2024		MARCIO ANTONIO PEREIRA DE MOURA	00273000202	859.577.126-04	101	19/04/2024	Mensal	3.768,07		301,44	0,00	0,00	0,00	301,44
03/2024		MARCIONEY COELHO DANTAS DE SOUSA	00273000261	895.743.261-00	101	19/04/2024	Mensal	2.703,93		216,31	0,00	0,00	0,00	216,31
03/2024		MARCOS ANDRE ALVES DA COSTA CAMARG	00273000259	703.648.756-90	101	19/04/2024	Mensal	2.994,23		239,53	0,00	0,00	0,00	239,53
03/2024		MARCOS PAULO CARDOSO DE SOUZA	00273000262	007.018.476-38	101	19/04/2024	Mensal	2.448,51		195,88	0,00	0,00	0,00	195,88
03/2024		MARIA DE FATIMA MARTINS COELHO SOUS	00273000164	041.360.976-82	101	19/04/2024	Mensal	2.147,56		171,80	0,00	0,00	0,00	171,80
03/2024		MARIA DE LOURDES SILVA DUARTE	00273000213	990.039.286-53	101	19/04/2024	Mensal	1.734,06		138,72	0,00	0,00	0,00	138,72
03/2024		MARIA DO CARMO DOS SANTOS	00273000165	022.502.801-85	101	19/04/2024	Mensal	2.364,60		189,16	0,00	0,00	0,00	189,16
03/2024		MARILENE JESUS DE OLIVEIRA	00273000166	073.251.525-40	101	19/04/2024	Mensal	2.555,45		204,43	0,00	0,00	0,00	204,43
03/2024		MARIZA KELE BALMANT TEIXEIRA	00273000229	107.435.776-04	101	19/04/2024	Mensal	2.184,29		174,74	0,00	0,00	0,00	174,74
03/2024		MARTA ROSA DE JESUS BATISTA	00273000181	023.750.736-85	101	19/04/2024	Mensal	2.364,97		189,19	0,00	0,00	0,00	189,19
03/2024		NEUZA NUNIS DE OLIVEIRA	00273000168	823.671.246-04	101	19/04/2024	Mensal	2.184,29		174,74	0,00	0,00	0,00	174,74
03/2024		ODINEIA MARIA GARCIA DE CASTRO	002730001671	041.272.036-17	101	19/04/2024	Mensal	2.464,01		197,12	0,00	0,00	0,00	197,12
03/2024		PATRICIA ALVES DAS GRACAS	00273000169	013.796.096-40	101	19/04/2024	Mensal	2.183,91		174,71	0,00	0,00	0,00	174,71
03/2024		POLIANA LUCIA VIEIRA	00273000230	140.193.086-75	101	19/04/2024	Mensal	1.153,71		92,29	0,00	0,00	0,00	92,29
03/2024		RAFAEL MARTINS DA SILVA	00273000146	091.095.566-21	101	19/04/2024	Mensal	2.235,85		178,86	0,00	0,00	0,00	178,86
03/2024		RAFAEL SANTOS BRITO	00273000205	142.929.316-07	101	19/04/2024	Mensal	3.368,35		269,46	0,00	0,00	0,00	269,46
03/2024		RAIMUNDO VALERIANO DOS SANTOS	00273000189	035.330.756-48	101	19/04/2024	Mensal	2.789,74		223,17	0,00	0,00	0,00	223,17
03/2024		ROBSON DUTRA	00273000206	033.191.966-42	101	19/04/2024	Mensal	2.679,71		214,37	0,00	0,00	0,00	214,37
03/2024		RONALDO ADRIANO OLIVEIRA CRUZ	00273000147	748.511.106-00	101	19/04/2024	Mensal	3.063,38		245,07	0,00	0,00	0,00	245,07
03/2024		RONILSON BRITO	00273000207	943.667.726-04	101	19/04/2024	Mensal	2.908,99		232,71	0,00	0,00	0,00	232,71
03/2024		ROSANA APARECIDA DA SILVA MACHADO	00273000223	033.346.616-01	101	19/04/2024	Mensal	2.186,55		174,92	0,00	0,00	0,00	174,92
03/2024		ROSEMEIRE PEREIRA DIAS	00273000177	027.526.966-39	101	19/04/2024	Mensal	2.138,75		171,10	0,00	0,00	0,00	171,10

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.190.486 Nome Empregador: MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIA

Qtd. Trabalhadores: 114 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040903657020-3

Data Emissão: 09/04/2024 11:24:05 (Brasília)

Emitida por: 10.451.338/0001-13 - CONTEPA -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.190.486/0001-45 Tomador: 33.000.167/0001-01													
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		SERGIO GERALDO DA COSTA	00273000200	031.893.366-79	101	19/04/2024	Mensal	3.297,34	263,78	0,00	0,00	0,00	263,78
03/2024		SHEILA FERREIRA DE JESUS	00273000231	119.775.046-04	101	19/04/2024	Mensal	2.168,54	173,48	0,00	0,00	0,00	173,48
03/2024		SHIRLEI ALVES SANTOS SILVA	00273000232	075.408.366-79	101	19/04/2024	Mensal	2.544,91	203,59	0,00	0,00	0,00	203,59
03/2024		SHIRLEI DA SILVA PORTO CRUZ	00273000148	035.114.406-45	101	19/04/2024	Mensal	2.725,97	218,07	0,00	0,00	0,00	218,07
03/2024		SILVANIA APARECIDA OLIVEIRA NASCIMENT	00273000149	068.594.436-00	101	19/04/2024	Mensal	2.140,42	171,23	0,00	0,00	0,00	171,23
03/2024		TELMA APARECIDA MACHADO DOS SANTOS	00273000172	929.372.336-00	101	19/04/2024	Mensal	2.003,60	160,28	0,00	0,00	0,00	160,28
03/2024		TEREZA DOS SANTOS	00273000173	045.258.696-82	101	19/04/2024	Mensal	2.362,72	189,01	0,00	0,00	0,00	189,01
03/2024		THAIS APARECIDA SILVA MARTINS	00273000239	075.288.606-11	101	19/04/2024	Mensal	2.533,53	202,68	0,00	0,00	0,00	202,68
03/2024		VALCIRLENE FATIMA SANTOS TEIXEIRA	00273000174	063.675.336-05	101	19/04/2024	Mensal	2.364,97	189,19	0,00	0,00	0,00	189,19
03/2024		VANDERLEI MIRANDA TEIXEIRA	00273000264	046.521.726-56	101	19/04/2024	Mensal	2.867,67	229,41	0,00	0,00	0,00	229,41
03/2024		VERONICA RODRIGUES OLIVEIRA NASCIME	00273000184	700.700.366-40	101	19/04/2024	Mensal	2.852,92	228,23	0,00	0,00	0,00	228,23
03/2024		WELLINGTON ALBINO DE OLIVEIRA FILHO	00273000240	151.378.196-03	101	19/04/2024	Mensal	2.583,97	206,71	0,00	0,00	0,00	206,71
Total do Tomador 33.000.167/0001-01									19.928,50	0,00	0,00	0,00	19.928,50
Total do Estabelecimento 15.190.486/0001-45									23.895,64	0,00	0,00	0,00	23.895,64
Total da Guia									23.895,64	0,00	0,00	0,00	23.895,64



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

15.190.486

Nome Empregador:

MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIA

Vencimento da Guia:

19/04/2024

Número da Guia:

0124040903657020-3

Emitida por:

10.451.338/0001-13 - CONTEPA -

114

Origem:

Gestão de Guias

09/04/2024 11:24:05

Data Emissão:

(Brasília)

Qtd.

Trabalhadores:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.190.486/0001-45				Tomador: 90.010.29485/60											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024		AGATA RAIANE DOS SANTOS	00273000038	031.912.975-61	101	19/04/2024	Mensal	3.103,23		248,25	0,00	0,00	0,00	248,25	
03/2024		ANTONIO JOSE SANTA ROSA FILHO	00273000072	008.794.425-14	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024		CLEITON NASCIMENTO DE JESUS	002730001091	051.182.745-83	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024		EDIVALDO ARAUJO DA SILVA	00273000045	016.791.925-31	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024		EDSON DOMINGOS LIMA SANTOS	00273000081	019.826.775-46	101	19/04/2024	Mensal	3.487,46		278,99	0,00	0,00	0,00	278,99	
03/2024		Geraldo dos Santos	00273000047	440.390.345-20	101	19/04/2024	Mensal	2.010,50		160,84	0,00	0,00	0,00	160,84	
03/2024		Hudson Arrento dos Santos	00273000050	038.385.295-10	101	19/04/2024	Mensal	425,35		34,02	0,00	0,00	0,00	34,02	
03/2024		JARISON NASCIMENTO DOS SANTOS	00273000251	018.677.545-84	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024		JOAO LIMA ANDRADE FILHO	00273000144	048.946.755-52	101	19/04/2024	Mensal	2.424,00		193,92	0,00	0,00	0,00	193,92	
03/2024		JOSE BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA	00273000069	073.511.065-41	101	19/04/2024	Mensal	1.885,62		150,84	0,00	0,00	0,00	150,84	
03/2024		JOSE CARLOS SANTA ROSA	002730001093	046.383.535-25	101	19/04/2024	Mensal	1.885,62		150,84	0,00	0,00	0,00	150,84	
03/2024		JOSE VANDO DE SOUSA	00273000091	034.786.935-19	101	19/04/2024	Mensal	2.679,28		214,34	0,00	0,00	0,00	214,34	
03/2024		Jose Maria Dias Cardoso Filho	00273000056	661.746.275-00	101	19/04/2024	Mensal	5.375,00		430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	
03/2024		LUCIANO DOS SANTOS	00273000095	016.768.845-84	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024		OSEIAS BRITO FORTUNA	00273000252	028.256.365-25	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
Total do Tomador				90.010.29485/60				31.748,06		2.539,80	0,00	0,00	0,00	2.539,80	
Total do Estabelecimento				15.190.486/0001-45				298.702,48		23.895,64	0,00	0,00	0,00	23.895,64	
				Total da Guia				298.702,48		23.895,64	0,00	0,00	0,00	23.895,64	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.190.486 Nome Empregador: MARTINS CONSTRUCAO.MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIA Qtd. Trabalhadores: 114 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040903657020-3 Emitida por: 10.451.338/0001-13 - CONTEPA - Data Emissão: 09/04/2024 11:24:05 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		90.017.71701/73									
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ALEX SILVA SANTOS	00273000277	066.051.245-96	101	19/04/2024	Mensal	889,99	71,19	0,00	0,00	0,00	71,19
03/2024		DINESH KUMAR	00273000274	267.687.395-49	101	19/04/2024	Mensal	4.848,00	387,84	0,00	0,00	0,00	387,84
03/2024		IAGO SANTOS LEITE	00273000082	046.860.535-52	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		JOSE NELITO DOS SANTOS JUNIOR	00273000276	025.351.955-18	101	19/04/2024	Mensal	2.324,72	185,97	0,00	0,00	0,00	185,97
03/2024		KAIO VINICIUS ARAUJO SOUZA	00273000278	058.353.685-93	101	19/04/2024	Mensal	701,72	56,13	0,00	0,00	0,00	56,13
03/2024		MARCIO ARAGAO DE BRITO	00273000275	988.093.005-30	101	19/04/2024	Mensal	1.364,93	109,19	0,00	0,00	0,00	109,19
03/2024		RODRIGO LUIZ DA PAIXAO SANTOS	00273000279	082.508.875-57	101	19/04/2024	Mensal	1.270,80	101,66	0,00	0,00	0,00	101,66
03/2024		WELLISON PEREIRA SANTOS	00273000209	076.348.795-33	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
Total do Tomador				90.017.71701/73		14.224,16		1.137,90		0,00		0,00	
Total do Estabelecimento				15.190.486/0001-45		298.702,48		23.895,64		0,00		0,00	
Total da Guia						298.702,48		23.895,64		0,00		0,00	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

15.190.486

Nome Empregador:

MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIA

Qtd. Trabalhadores:

114

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/04/2024

Número da Guia:

0124040903657020-3

Emitida por:

10.451.338/0001-13 - CONTEPA -

Data Emissão:

09/04/2024 11:24:05 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.190.486/0001-45														Tomador: Sem Tomador			
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
03/2024		JOAO VICTOR SANTOS	00273000257	078.804.005-75	101	19/04/2024	Mensal	2.118,00		169,44	0,00	0,00	0,00	169,44			
03/2024		TATIANA DA SILVA SANTOS	00273000266	999.251.505-82	101	19/04/2024	Mensal	1.500,00		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00			
					Total do Tomador			Sem Tomador		289,44	0,00	0,00	0,00	289,44			
					Total do Estabelecimento			15.190.486/0001-45		23.895,64	0,00	0,00	0,00	23.895,64			
					Total da Guia					23.895,64	0,00	0,00	0,00	23.895,64			



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.190.486 Nome Empregador: MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIA
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040903657020-3 Emitida por: 10.451.338/0001-13 - CONTEPA -

Qtd. Trabalhadores: 114 Origem: Gestão de Guias
Data Emissão: 09/04/2024 11:24:05 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 15.190.486/0001-45										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	114	298.702,48	23.895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.895,64
							0,00	0,00	0,00	23.895,64

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Auxiliar rural por período prazo da Lei 11.118/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado, nos termos da Lei 8.651/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado, nos termos da Lei 8.651/1998
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 112 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 113 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 114 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 202 - Trabalhador avulso não pontual
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Servidor
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Agente público - Outros
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exerce em outro órgão/juiz autônomo
- 411 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador empregado de passageiros por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça de Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apresentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 781 - Contribuinte individual - Membro de conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 791 - Contribuinte individual - Membro de conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 801 - Contribuinte individual - Membro de conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 811 - Contribuinte individual - Membro de conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 821 - Contribuinte individual - Membro de conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 831 - Contribuinte individual - Membro de conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 841 - Contribuinte individual - Membro de conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 851 - Contribuinte individual - Membro de conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 861 - Contribuinte individual - Membro de conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 871 - Contribuinte individual - Membro de conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 881 - Contribuinte individual - Membro de conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 891 - Contribuinte individual - Membro de conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 901 - Contribuinte individual - Membro de conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 911 - Contribuinte individual - Membro de conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 921 - Contribuinte individual - Membro de conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 931 - Contribuinte individual - Membro de conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 941 - Contribuinte individual - Membro de conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 951 - Contribuinte individual - Membro de conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

15.190.486

Nome Empregador:

MARTINS CONSTRUCAO.MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIA

Qtd. Trabalhadores:

114

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/04/2024

Número da Guia:

0124040903657020-3

Emissão:

09/04/2024 11:24:05 (Brasília)

Emitida por:

10.451.338/0001-13 - CONTEPA -

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
03/2024	15.190.486/0001-45	114	298.702,48	23.895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.895,64
		Total da Guia	298.702,48	23.895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.895,64



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

15.190.486

Nome Empregador:

MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIA

Qtd. Trabalhadores:

114

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/04/2024

Número da Guia:

0124040903657020-3

Emitida por:

10.451.338/0001-13 - CONTEPA -

Data Emissão:

09/04/2024 11:24:05 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 15.190.486/0001-45										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	114	296.644,15	23.730,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.730,99
03/2024	12 - FGTS 13º salário	4	2.058,33	164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,65
	Total da Guia	Total da Guia	298.702,48	23.895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.895,64



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.190.486

Nome Empregador: MARTINS CONSTRUCAO.MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIA

Qtd. Trabalhadores: 114

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024

Número da Guia: 0124040903657020-3

Data Emissão: 09/04/2024 11:24:05 (Brasília)

Emitida por: 10.451.338/0001-13 - CONTEPA -

Relação de Tomadores de Serviço

Resumo de Tomadores de Serviço									
Tomador: 33.000.167/0001-01									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	89	249.112,26	19.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.928,50
Total do Tomador	33.000.167/0001-01	249.112,26	19.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.928,50
Tomador: 90.010.29485/60									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	15	31.748,06	2.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,80
Total do Tomador	90.010.29485/60	31.748,06	2.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,80
Tomador: 90.017.71701/73									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	8	14.224,16	1.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,90
Total do Tomador	90.017.71701/73	14.224,16	1.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,90
Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	2	3.618,00	289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,44
Total do Tomador	Sem Tomador	3.618,00	289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,44
Total da Guia		298.702,48	23.895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.895,64
