

04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:23:05
 220602206 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PF MN PIRAMBU FDO ESP PEA
 AGENCIA: 2206-3 CONTA: 136.072-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2024
 NR. DOCUMENTO 552.206.000.007.290
 VALOR TOTAL 474.440,91
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: J PROJECT ENGENHARIA LTDA
 AGENCIA: 2206-3 CONTA: 7.290-7
 NR. DOCUMENTO 552.206.000.136.072
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.11A.702.08B.CE7.83B

PAGO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PF MN PIRAMBU FDO ESP PEA
Agência 2206-3
Conta corrente 136072-8

Creditado

Nome J PROJECT ENGENHARIA LTDA
Agência 2206-3
Conta corrente 7290-7
Valor 474.440,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA	04/09/2024 11:10:57
	JB826408 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO	04/09/2024 11:23:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB826408 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO.



Entre contas correntes

G3340410446097281
04/09/2024 11:10:55

Debitado

Nome	PF MN PIRAMBU FDO ESP PEA
Agência	2206-3
Conta corrente	136072-8

Creditado

Nome	J PROJECT ENGENHARIA LTDA
Agência	2206-3
Conta corrente	7290-7
Valor	474.440,91
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 351764003.

Usuário: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.



TERMO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 05.325.864/0001-05

Nome: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Endereço: R A

Bairro: CENTRO

E-mail: @

Compl: LOTE ARTHUR B DO ROSARIO

Cidade: Japarutuba

Telefone: (79)99003-449

UF: SE

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Conta:

EMPENHO	EMIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	FONTE
0507002	07/05/2024	1055.44905100-17200000	Global	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FED - Lei 9.478/1997

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2024 E CONTRATO Nº 76/2024.

Documentação

Nota Fiscal	06
Valor	R\$ 480.203,35
Emissão	02/09/2024
Horário de Entrega	03/09/2024 12:42:11

Para acompanhar o andamento do seu processo na fila pública, acesse o link abaixo:

<http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pirambu/fornecedor/filapagamento>

Cadastrado por: Santiago Santos Gois

Secretaria de Controle Interno

☒ Aprovado
☐ Reprovado

Obs. _____



MUNICÍPIO DE JAPARATUBA

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento Tributário - Praça Padre Caio Tavares, Nº 86, Centro - CEP: 49.960-000

- Telefone: (79) 3272-3216

Nota: 2024000

00000006

Código Verificação

NUT4-UDY3



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

02/09/2024 06:52:23

Período de Competência Município de Prestação do

09/2024

Serviço

Pirambu - SE

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte
(ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em
Pirambu

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia

J & A ENGENHARIA

CPF/CNPJ

05.325.864/0001-05

Inscrição Municipal

533

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

jcalex1@hotmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 9900-3449

Endereço

RUA A, LOT. ARTHUR BISPO DO ROSARIO, 75, Centro - CEP: 49960-000 - Japaratuba - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

CPF/CNPJ

13.095.039/0001-81

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3276-1375

E-mail

pmpirambu@hotmail.com

Endereço

Rua Givaldo Moura da Silva, 16 - Centro - CEP: 49190-000 - Pirambu - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
CNAE: 4213800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA ORLA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.
VINCULADO AO CONTRATO Nº 76/2024.

CONTRATO Nº 76/2024

PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

CNO: 90.020.27538/76

(ISS 2,00%) RETIDO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/06. Art. 18, § 5, inc. I PERTINENTE AO REGIME TRIBUTÁRIO (SIMPLES NACIONAL)

SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

BASE DE CÁLCULO PARA EFEITO DO ISS CONFORME CODIGO TRIBUTARIO MUNICIOIO DE PIRAMBU/SE:

CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PREFEITURA DE PIRAMBU/SE - MATERIAL 40%

CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PREFEITURA DE PIRAMBU/SE - MAO DE OBRA 60%

VALOR DO ISS A SER RETIDO CONFORME BASE DE CALCULO (288.122,01 x 2,00%)

DADOS BANCARIOS:

J A PROJECT ENG

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2206-3

CONTA CORRENTE: 7290-7

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

480.203,35

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

2,0000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

480.203,35

Valor Total da Nota (R\$)

480.203,35

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 64.587,35 Federal e R\$ 24.010,17 Municipal. Fonte: IBPT [B047CD]

Visualizado em: 02/09/2024 06:53:45

Para validação desta NFSe acesse: <http://japaratubase.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 370 de 23 de abril de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
DECLARO QUE

- ☒ Os serviços foram prestados
☐ Os produtos foram entregues
☐ A obra foi executada

Data: 03 / 09 / 24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
CONTROLADORIA MUNICIPAL

CHECK LIST

PARA PAGAMENTO DE OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA

Processo nº:
Empresa Contratada: *Projeto Engenharia*
Contrato nº
Resumo do objeto:

Fonte de Recurso:
Medição:

ITENS	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Nota Fiscal contendo Nº do empenho/Ano, Modalidade – Número/Ano da Licitação e Nº do Contrato/Ano.	X		
Laudo de medição da obra, assinado pelo Engenheiro responsável.	X		
ORDEM DE SERVIÇOS	X		
REGISTRO FOTOGRÁFICO	X		
RELATÓRIO DIÁRIO DA OBRA	X		
CERTIDÃO DO CREA - PESSOA FÍSICA	X		
CERTIDÃO DO CREA - PESSOA JURÍDICA	X		
Cópia do comprovante de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART DE EXECUÇÃO	X		
Cópia do comprovante de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART DE FISCALIZAÇÃO	X		
Certidão de Regularidade do FGTS	X		
Certidão Negativa de Tributos Municipais	X		
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais e Dívida Ativa da União	X		
Certidão Negativa de Tributos Estaduais	X		
Certidão de Regularidade Trabalhista	X		
Extrato de Optante ou de Não Optante pelo Simples	X		
Cadastro Nacional de Obras - CNO	X		
Recolhimento do INSS relativo aos funcionários (Guia da Previdência Social – (GPS).	X		
Recolhimento do FGTS relativo aos funcionários (Guia de Recolhimento do FGTS – (GRF).	X		

VALOR DO CONTRATO	MEDIÇÃO	VALOR	SALDO

A

Prefeitura Municipal de Pirambu/SE
Praça Nossa Senhora de Lurdes, nº 16, Centro
Pirambu/SE

Assunto: ENCAMINHAMENTO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 PARA PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 76/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU.

FATURA

A EMPRESA J & A PROJECT E ENGENHARIA LTDA, a importância supra de R\$ **480.203,35** (quatrocentos e oitenta mil, duzentos e três reais e trinta e cinco centavos) referente ao pagamento do 2º Boletim de Medição, referente ao Contrato 76/2024, CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU.

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pirambu/SE a importância supra de R\$ **480.203,35** (quatrocentos e oitenta mil, duzentos e três reais e trinta e cinco centavos) referente ao pagamento do 2º Boletim de Medição, referente ao Contrato 76/2024, CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU. Em anexo.


Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme lei Federal Nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Banco do Brasil

Agência → : 2206-3

Conta Corrente: 7290-7

Japaratuba/SE, 02 de setembro de 2024



J A Project & Engenharia LTDA
Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Representante Legal

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03			BOLETIM DE MEDIÇÃO 02			CONTRATO Nº76/2024					
CONTRATADA: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA			CONTRATO			Período: 01/08/2024 à 31/08/2024					
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE			ORDEN DE SERVIÇO			Data da Medição:02/09/2024					
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades			Saldo a medir	Unit.	Valores (R\$)			% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada Anterior			Do Período	Acumulada Anterior	Do Período		Acumulado até o Período
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	0,1480				47.006,78	6.958,32	22.676,97	48,24
02	CONSTRUÇÃO DA ORLA - TRECHO 003							47.006,78	6.958,32	22.676,97	48,24
02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES							894.622,41	189.805,62	507.582,04	56,73
02.001.001	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	m2	0,35	-	-	-	0,35	1.864,86	652,63	111.351,54	93,27
02.001.002	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	1,00	-	1,00	-	898,95	898,95	-	100,00
02.001.003	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	-	2,34	16.380,00	16.380,00	100,00
02.001.004	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	1,00	-	1,00	-	672,64	672,64	672,64	100,00
02.001.005	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusivo fornecimento do medidor	un	1,00	1,00	-	1,00	-	1.921,89	1.921,89	1.921,89	100,00
02.001.006	Locação de container - Almostrado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	10,00	1,00	1,00	2,00	8,00	958,88	958,88	1.917,76	20,00
	Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saca cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeição mecânica e transporte	m3	150,00	91,24	58,76	150,00	-	597,07	89.560,50	89.560,50	100,00
02.002	CICLOVIA							171.072,00	114.096,00	146.960,50	85,91
02.002.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	600,00	600,00	-	600,00	-	1,67	1.002,00	1.002,00	100,00
02.002.002	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	600,00	600,00	-	600,00	-	59,39	35.634,00	35.634,00	100,00
02.002.003	Pintura de meio fio (calçada)	m	600,00		-	-	600,00	3,00	1.800,00	-	-
02.002.004	Alterio de caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	300,00	225,00	75,00	300,00	-	204,60	61.380,00	61.380,00	100,00
02.002.005	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, cor natural, desmoldado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m2	600,00	300,00	150,00	450,00	150,00	104,75	62.850,00	47.137,50	75,00
02.002.006	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples	m2	600,00		450,00	450,00	150,00	4,06	2.436,00	1.827,00	75,00
02.002.006.001	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	600,00		-	-	600,00	9,95	5.970,00	-	-
02.003	ESTACIONAMENTO							31.860,80	400,80	400,80	1,25
02.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	240,00	240,00	-	240,00	-	1,67	400,80	400,80	100,00
02.003.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	240,00		-	-	240,00	125,27	30.064,80	-	-
02.003.003	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	100,00		-	-	100,00	13,95	1.395,00	-	-
02.004	PASSEIO EM CONCRETO CINZA							334.095,00	-	233.673,92	69,94
02.004.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.500,00		726,14	726,14	773,87	1,67	2.505,00	1.212,64	48,40
02.004.002	Alterio de caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	750,00		750,00	750,00	-	204,60	153.450,00	153.450,00	100,00

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797691 - 2

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 27150367-2

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03				BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				CONTRATO N°76/2024						
CONTRATADA: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				CONTRATO		Período: 01/08/2024 à 31/08/2024		CONTRATO N°76/2024						
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE				ORDEM DE SERVIÇO		Data da Medição:02/09/2024								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades					Valores (R\$)							
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
02.004.003	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempenado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m2	1.500,00		726.14	726.14	773.86	104.75	157.125.00	-	76.063.16	76.063.16	81.061.84	48,40
02.004.004	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples	m2	1.500,00		726.14	726.14	773.86	4.06	6.090.00	-	2.948.12	2.948.12	3.141.88	48,40
02.004.004.001	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	1.500,00		-	-	1.500,00	9.95	14.925.00	-	-	-	14.925.00	-
02.005	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-	-	-	-	183.224.25	-	15.175.28	15.175.28	169.048.97	8,28
02.005.001	Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=8,00m, d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, ind base concreto	un	16.00		-	-	16.00	2.358.82	37.741.12	-	-	-	37.741.12	-
02.005.002	Luminária em LED modular para iluminação pública, 40W, lentes em policarbonato, corpo em alumínio, pint.anti-incrustantes grau de proteção IP67, IK09, temp de cor 5000°K, IRC >=70% v.uti 50.000 horas, linha Street-Light da Ledstar-Unicobra ou similar	un	16.00		-	-	16.00	1.592.78	25.484.48	-	-	-	25.484.48	-
02.005.003	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	un	15.00		14.00	14.00	1.00	310.92	4.663.80	-	4.352.88	4.352.88	310.92	93,33
02.005.004	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	1.100,00		445.00	445.00	655.00	24.32	26.752.00	-	10.822.40	10.822.40	15.929.60	40,45
02.005.005	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	2.00		-	-	2.00	236.88	473.76	-	-	-	473.76	-
02.005.006	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noil	un	1.00		-	-	1.00	562.34	562.34	-	-	-	562.34	-
02.005.007	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 450/750v / 70°c	m	600,00		-	-	600,00	34.68	20.808.00	-	-	-	20.808.00	-
02.005.008	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 450/750v / 70°c	m	2.000,00		-	-	2.000,00	19.37	38.740.00	-	-	-	38.740.00	-
02.005.009	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/750v / 70°c	m	2.000,00		-	-	2.000,00	12.42	24.840.00	-	-	-	24.840.00	-
02.005.010	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	5.00		-	-	5.00	631.75	3.158.75	-	-	-	3.158.75	-
02.006	PAISAGISMO				-	-	-	-	37.341.00	-	-	-	37.341.00	-
02.006.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	600,00		-	-	600,00	30.34	18.204.00	-	-	-	18.204.00	-
02.006.002	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	150,00		-	-	150,00	127.58	19.137.00	-	-	-	19.137.00	-
02.007	DIVERSOS				-	-	-	-	17.654.35	-	-	-	17.654.35	-
02.007.001	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	1.00		-	-	1.00	1.284.48	1.284.48	-	-	-	1.284.48	-
02.007.002	Equipamento de ginástica - roda de ombro	un	1.00		-	-	1.00	2.108.96	2.108.96	-	-	-	2.108.96	-
02.007.003	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo	un	1.00		-	-	1.00	5.080.84	5.080.84	-	-	-	5.080.84	-
02.007.004	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro pelv. s=1 1/2", Sergipark ou similar	Un	1.00		-	-	1.00	1.020.79	1.020.79	-	-	-	1.020.79	-
02.007.005	Marco Inaugural - Rev. 01	un	1.00		-	-	1.00	896.64	896.64	-	-	-	896.64	-
02.007.006	Conjunto com 06 lxeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com lâmpa vai e vem	un	6.00		-	-	6.00	1.210.44	7.262.64	-	-	-	7.262.64	-
03	CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS DE VOLEI				-	-	-	-	144.904.92	9.290.25	69.546.00	78.836.25	66.068.67	54,40
03.001	QUADRA DE VOLEI DE AREIA				-	-	-	-	144.904.92	9.290.25	69.546.00	78.836.25	66.068.67	54,40
03.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	23.00		23.00	23.00	-	60.77	1.397.71	-	1.397.71	1.397.71	-	100,00
03.001.002	Relevo manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	4.00		4.00	4.00	-	40.51	162.04	-	162.04	162.04	-	100,00
03.001.003	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	10.00		10.00	10.00	-	696.67	6.966.70	-	6.966.70	6.966.70	-	100,00


Alex Sandro Rodrigues dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-SE nº 27156-6/20


Manoel Messias Soares Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-SE nº 27156-6/20

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03				BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				CONTRATO Nº76/2024				
CONTRATADA: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				CONTRATO		07/05/2024		Período: 01/08/2024 à 31/09/2024				
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE				ORDEM DE SERVIÇO		04/07/2024		Data da Medição:02/09/2024				
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades			Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Valores (R\$)		% Medido
		Und	Contratada	Do Período						Do Período	Acumulado até o Período	
03.001.004	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "U" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa	m	83,00	83,00	83,00	-	41,52	3.446,16	-	3.446,16	-	100,00
03.001.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8(cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	47,00	47,00	47,00	-	52,14	2.450,58	-	2.450,58	-	100,00
03.001.006	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto murala	m2	244,00	97,60	97,60	146,40	342,68	83.613,92	-	33.445,58	50.168,36	39,99
03.001.007	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	188,00	-	-	188,00	7,77	1.460,76	-	-	1.460,76	-
03.001.008	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	188,00	-	-	188,00	39,77	7.476,76	-	-	7.476,76	-
03.001.009	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	188,00	-	-	188,00	18,12	3.406,56	-	-	3.406,56	-
03.001.010	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	62,00	-	-	62,00	31,87	1.975,94	-	-	1.975,94	-
03.001.011	Aterro de áreas com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	150,00	105,00	150,00	-	206,45	30.967,50	9.290,25	21.677,25	30.967,50	100,00
03.001.012	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	-	-	1,00	290,44	290,44	-	-	290,44	-
03.001.013	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/estecedor e catraca	par	1,00	-	-	1,00	1.289,85	1.289,85	-	-	1.289,85	-
04.001	CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER			-	-	-		261.460,84	77.162,28	77.162,28	184.298,56	29,51
04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	1,67	2.004,00	-	2.004,00	2.004,00	100,00
04.001.002	Alvenaria pedra calcára argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saca cimento 50kg / 5 padolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	20,00	20,00	20,00	-	595,07	11.901,40	-	11.901,40	11.901,40	100,00
04.001.003	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisado 07.2015	m2	30,00	-	-	30,00	52,49	1.574,70	-	-	1.574,70	-
04.001.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	45,00	-	-	45,00	18,12	815,40	-	-	815,40	-
04.001.005	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1,00), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2")	m	12,00	-	-	12,00	289,13	3.589,56	-	-	3.589,56	-
04.001.006	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	10,00	-	-	10,00	31,87	318,70	-	-	318,70	-
04.001.007	Aterro de áreas com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	260,00	260,00	260,00	-	206,45	53.677,00	-	53.677,00	53.677,00	100,00
04.001.008	Camaçada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	100,00	69,90	69,90	30,10	31,07	3.107,00	-	2.171,79	2.171,79	69,89
04.001.008.001	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desmoldado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m2	1.200,00	-	-	1.200,00	104,75	125.700,00	-	-	125.700,00	-
04.001.008.002	Cobogó de cimento tipo "escama", dim. 40 x 40cm	m2	24,00	-	-	24,00	190,63	4.575,12	-	-	4.575,12	-
04.001.008.003	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	100,00	8,00	8,00	92,00	158,93	15.893,00	-	1.271,44	14.621,56	8,00


Alex Sandro Rodrigues dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA RJ nº 27156/2010-2


Manoel Messias Soares Neto
 Engenheiro Civil RN nº 21191661-2

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03				BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				CONTRATO Nº 76/2024			
CONTRATADA: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				CONTRATO				Período: 01/08/2024 a 31/08/2024			
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE				ORDEN DE SERVIÇO				Data da Medição: 02/09/2024			
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades			Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Valores (R\$)		
		Und	Contratada	Acumulada Anterior					Do Período	Acumulado até o Período	% Medido
04.001.006.004	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	20,00		6,60	13,40	12,875,20	-	4,248,81	4,248,81	8,626,39
04.001.008.005	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	1,200,00		-	1,200,00	11,940,00	-	-	-	11,940,00
04.002	Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação = 60x70x50cm	un	16,00		4,00	12,00	7,551,36	-	1,887,84	1,887,84	5,663,52
04.003	Mesa em concreto armado polido (c=1,60, f=0,80 e h=0,75mm), 2 bancos em concreto armado (c=1,40, f=0,40 e h=0,40mm), com pintura acrílica.	Un	4,00		-	4,00	5,932,40	-	-	-	5,932,40
05.001	PARQUE INFANTIL				-	-	33,820,59	-	-	-	33,820,59
05.001.001	SERVIÇOS				-	-	33,820,59	-	-	-	33,820,59
05.001.001	Brinquedo - Totem Manilhas com pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Oria Atalaia Nova	un	1,00		-	1,00	7,156,36	-	-	-	7,156,36
05.001.002	Brinquedo - Trem com manilhas de concreto, c/pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Oria Atalaia Nova	un	1,00		-	1,00	5,019,40	-	-	-	5,019,40
05.001.003	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 brancas	un	1,00		-	1,00	6,066,67	-	-	-	6,066,67
05.001.004	Brinquedo - Escorregadeira com manilha em concreto e piso granito cinza andorinha, c/pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Oria Atalaia Nova	un	1,00		-	1,00	6,117,25	-	-	-	6,117,25
05.001.005	Brinquedo - Giratória (carrossel d=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", serigrafia, ou similar	un	1,00		-	1,00	4,664,53	-	-	-	4,664,53
05.001.006	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical.	Un	1,00		-	1,00	4,796,38	-	-	-	4,796,38
06	FRETE				-	-	7,230,59	6,522,06	(0,00)	6,522,06	708,53
06.001	Frete: Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m³	40,35		-	40,35	100,48	-	-	-	100,48
06.002	Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m³	5,67		-	5,67	174,34	-	-	-	174,34
06.003	Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m³	16,72		-	16,72	433,71	-	-	-	433,71
06.004	Frete: Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	91,24	91,24	91,24	91,24	6,522,06	212,576,25	480,203,35	692,779,60	696,266,53
TOTAL:			91,24	91,24	-	91,24	1,389,046,13	6,522,06	-	6,522,06	-
PERCENTUAL										49,87%	50,13%
ASSINATURA EMPRESA				AUTENTICAÇÃO							
ATESTO QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTE BM FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM, FISCAL DO CONTRATO Nº. 76/2024, EM PERFEITA ORDEM.				FISCAL DO CONTRATO							

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - 27156382-2

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 27156382-2



OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03
---------	---

ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2024

CONTRATO:	76/2024
-----------	---------

PERÍODO DE CONTRATO:	06 meses
----------------------	----------

BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 01

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/08/2024 a 31/08/2024

DATA:	02/09/2024
-------	------------

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)

Manoel Messias Soares Neto

RESPONSÁVEL FISCAL DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

ORDEM DE SERVIÇO

VIGÊNCIA:

07/05/2024

CONTRATO: N° _76/2024

**OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA
NOVA ETAPA DA ORLA , DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU, SERGIPE "**

PRAZO DO CONTRATO: 12 meses

PRAZO DA OBRA: 06 meses

DATA DO CONTRATO: 07 de Maio de 2024


RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONTRATADA: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Tendo em vista o instrumento contratual acima descrito, celebrado com esta Prefeitura, fica Vossa Senhoria cientificado de que o prazo para início dos serviços objeto do contrato começará a partir de 04/07/2024.

Outrossim, informamos que foi designado pela Prefeitura Municipal de Pirambu, o engenheiro Manoel Messias Soares Neto, para fiscalização dos serviços.


Pirambu, 03 de Julho de 2024




Prefeitura de Pirambu
Guilherme Jullius Zacarias de Melo
PREFEITO

CIENTE:

Engº Fiscal:



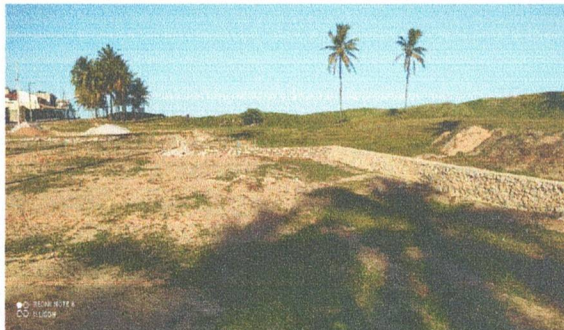
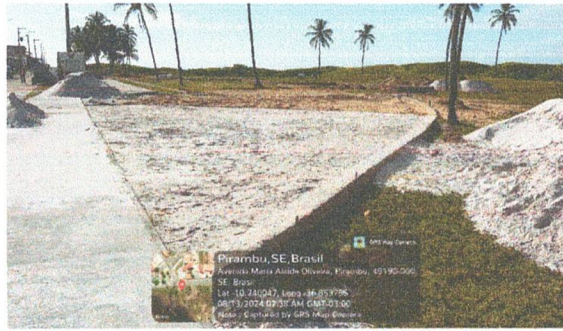
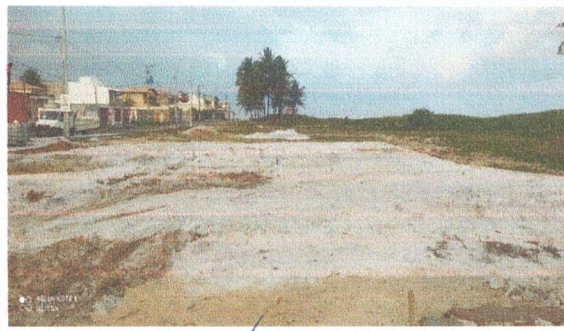
Firma Contratada:



OBRA;	CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03		
Contratada: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA			
Contratante: MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE			
REGISTRO FOTOGRÁFICO - BM 02			
REF. BM: 02	Período : 01/08/2024 à 31/08/2024	CONTRATO Nº76/2024 PMJ	
			
			
			
			

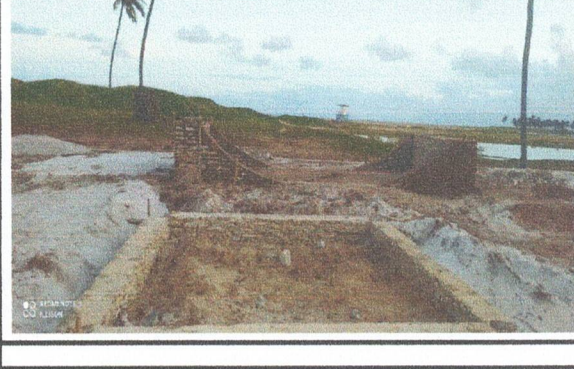
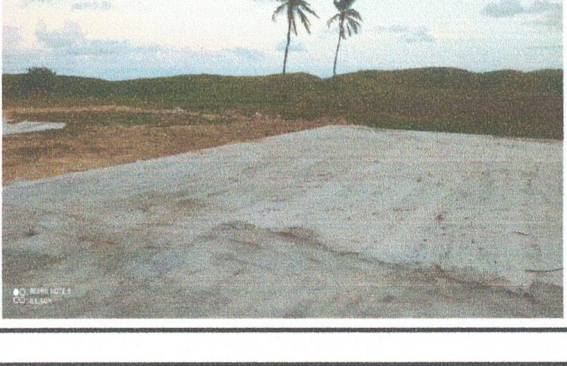
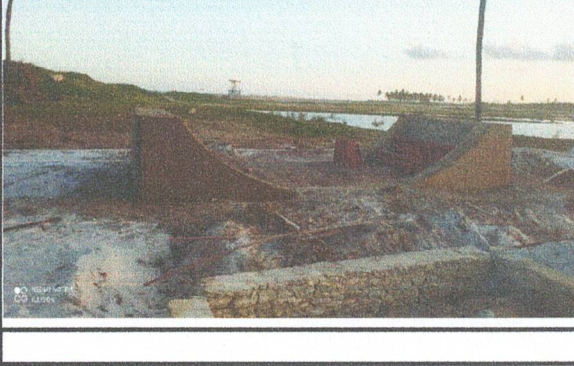
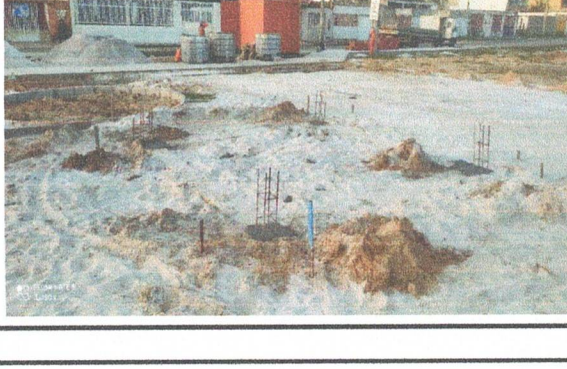
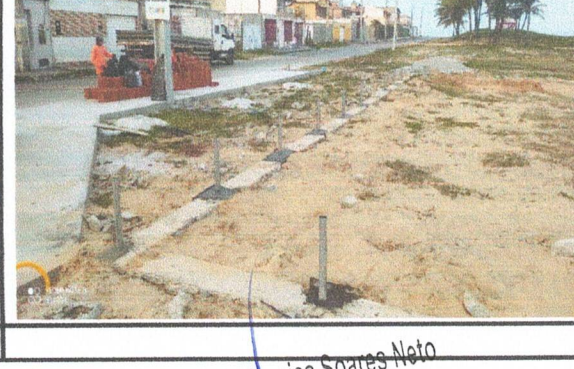

 Alex Sandro Rodrigues dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-SE nº 271563679-2

Manoel Messias Soares Neto
 Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

OBRA;	CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03		
Contratada: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA			
Contratante: MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE			
REGISTRO FOTOGRÁFICO - BM 02			
REF. BM: 02	Período : 01/08/2024 à 31/08/2024		CONTRATO Nº76/2024 PMJ
			
			
			
			

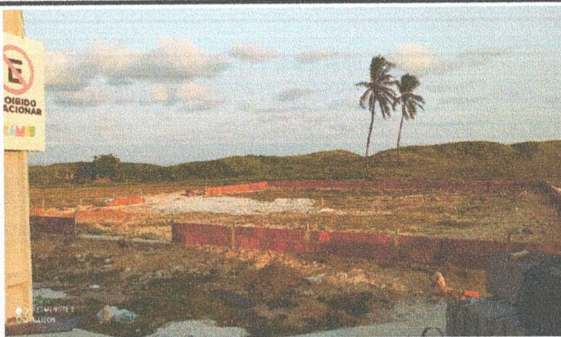
Manoel Mesias Soares Neto
Engenheiro Civil - nº 271787661-2


Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 27156679-2

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03		 PROJECT ENGENHARIA LTDA
Contratada: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA			
Contratante: MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE			
REGISTRO FOTOGRÁFICO - BM 02			
REF. BM: 02	Período : 01/08/2024 à 31/08/2024	CONTRATO Nº76/2024 PMJ	
			
			
			
			

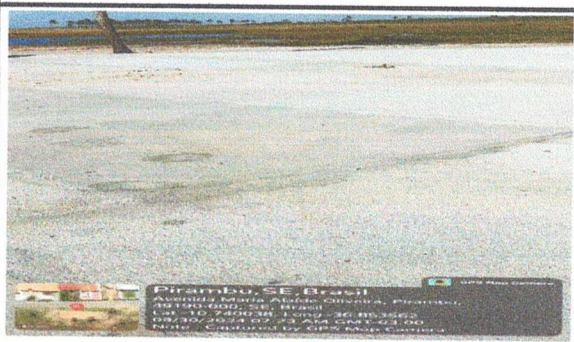
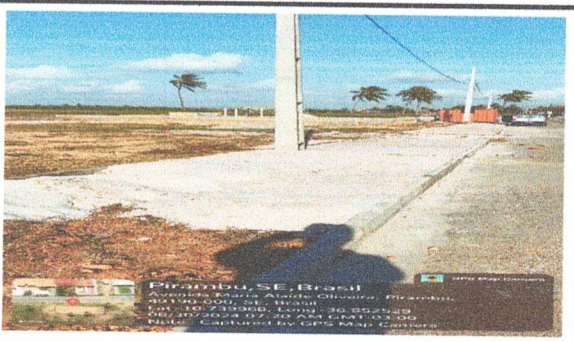
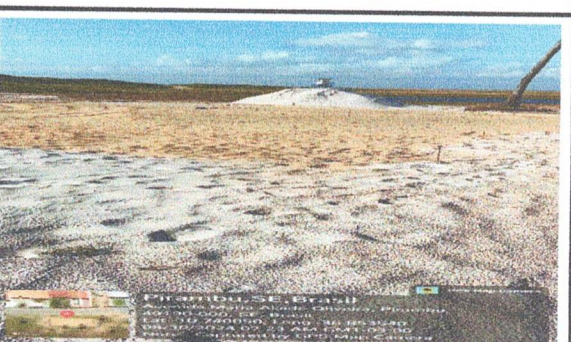

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-SE nº 271665/9-2

Manoel Massias Soares Neto
 Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

OBRA;	CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03		
Contratada: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA			
Contratante: MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE			
REGISTRO FOTOGRÁFICO - BM 02			
REF. BM: 02	Período : 01/08/2024 à 31/08/2024		CONTRATO Nº76/2024 PMJ
			
			
			
			


 Alex Sandro Rodrigues dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-SE nº 271002573-2

Manoel Messias Soares Neto
 Engenheiro Civil - nº 271797661 - 2

OBRA;	CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03		
Contratada: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA			
Contratante: MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE			
REGISTRO FOTOGRÁFICO - BM 02			
REF. BM: 02	Período : 01/08/2024 à 31/08/2024		CONTRATO Nº76/2024 PMJ
			
			
			
Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2 FISCALIZAÇÃO		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 27102779-2 ASSINATURA DA EMPRESA	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS



Objeto:

**CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU -
TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024**

Contratante: MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

Contratada: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

Ordem de Serviço: 04/07/2024

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			quinta-feira, 1 de agosto de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
 J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 28 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 122 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	4	Gesseiro	-
Serviços Executados	Execução de aterro			
	Execução de piso em concreto			
	Execução de alvenaria de pedra			
Anotação da Fiscalização				
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2			
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
			 Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				sexta-feira, 2 de agosto de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024					
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA					
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	29 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	121 dias
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária				
	Serra Manual				
	Policorte				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro	-	Eletricista		
	Pedreiro	2	Pintor	-	
	Armador	-	Carpinteiro	-	
	Servente	4	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Execução de aterro				
	Execução de piso em concreto				
	Execução de alvenaria de pedra				
Anotação da Fiscalização					
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil - RN - nº 271797661 - 2				
Vistos	Fiscalização:			Contratada:	
				Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 27156279-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				sábado, 3 de agosto de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024					
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA					
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	30 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	120 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:		
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	0	Motorista / Operador	-	
	Mestre de Obras/ Encarregado	0	Topografo	-	
	Calceteiro	0	Eletricista	-	
	Pedreiro		Pintor	-	
	Armador	0	Carpinteiro	-	
	Servente	0	Gesseiro	-	
Serviços Executados	sem atividades				
Anotação da Fiscalização					
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:		
			Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil C.R.C.E nº 27165/2024		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			domingo, 4 de agosto de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 31 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 119 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	-	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	-	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	-
	Pedreiro	-	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	-	Gesseiro	-
Serviços Executados	sem atividades			
Anotação da Fiscalização				
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil - RN - nº 271797661 - 2			
Vistos	Fiscalização:		Contratada: Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271663679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			segunda-feira, 5 de agosto de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 32 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 118 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	4	Gesseiro	-
Serviços Executados	Execução de aterro			
	Execução de piso em concreto			
	Execução de alvenaria de pedra			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN nº 271707661-2 Fiscalização:		Contratada: Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271503079-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

terça-feira, 6 de agosto de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024



J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:

07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Prazo da Obra

150

dias

Corridos

33 dias

Restantes

117 dias

Condições Climáticas:

Manhã: Boa. / Tarde:

Equipam.

Betoneira estacionária

Serra Manual

Policorte

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Motorista / Operador

-

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Topografo

-

Calceteiro

-

Eletricista

-

Pedreiro

2

Pintor

-

Armador

-

Carpinteiro

-

Servente

4

Gesseiro

-

Serviços Executados

Execução de aterro

Execução de piso em concreto

Execução de alvenaria de pedra

Anotação da Fiscalização

Vistos

Fiscalização:

Contratada:

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - nº 271797661 - 2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

quarta-feira, 7 de agosto de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024



J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	34 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	116 dias
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária				
	Serra Manual				
	Policorte				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro	-	Eletricista		
	Pedreiro	2	Pintor	-	
	Armador	-	Carpinteiro	-	
	Servente	4	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Execução de aterro				
	Execução de piso em concreto				
	Execução de alvenaria de pedra				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:		Contratada:		
	Manoel Massias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			quinta-feira, 8 de agosto de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 35 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 115 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	4	Gesseiro	-
Serviços Executados	Execução de aterro			
	Execução de piso em concreto			
	Execução de alvenaria de pedra			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				sexta-feira, 9 de agosto de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024					
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA					
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	36 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	114 dias
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária				
	Serra Manual				
	Policorte				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro	-	Eletricista		
	Pedreiro	2	Pintor	-	
	Armador	-	Carpinteiro	-	
	Servente	4	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Execução de aterro				
	Execução de piso em concreto				
	Execução de alvenaria de pedra				
Anotação da Fiscalização					
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil/RN nº 2711797661 - 2				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:		
			Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				sábado, 10 de agosto de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024					
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA					
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	37 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	113 dias
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária				
	Serra Manual				
	Policorte				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Motorista / Operador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Topografo	-	
	Calceteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor	-	
	Armador		Carpinteiro	-	
	Servente		Gesseiro	-	
Serviços Executados	sem atividades				
Anotação da Fiscalização					
	Mandel Messias Soares Neto Engenharia 271797661-2				
Vistos	Contratada: Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2				

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			domingo, 11 de agosto de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 38 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 112 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	-	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	-	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	-
	Pedreiro	-	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	-	Gesseiro	-
Serviços Executados	sem atividades			
Anotação da Fiscalização				
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil - CREA-SE nº 271663679-2			
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
			Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271663679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

segunda-feira, 12 de agosto de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024



J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:

07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Prazo da Obra

150

dias

Corridos

39 dias

Restantes

111 dias

Condições Climáticas:

Manhã: Boa. / Tarde:

Equipam.

Betoneira estacionária

Serra Manual

Policorte

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Motorista / Operador

-

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Topografo

-

Calceteiro

-

Eletricista

-

Pedreiro

2

Pintor

-

Armador

-

Carpinteiro

-

Servente

4

Gesseiro

-

Serviços Executados

Execução de aterro

Execução de piso em concreto

Execução de alvenaria de pedra

Anotação da Fiscalização

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - 271797661-2

Fiscalização:

Contratada:

Vistos


Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563673-2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			terça-feira, 13 de agosto de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 40 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 110 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	4	Gesseiro	-
Serviços Executados	Execução de aterro			
	Execução de piso em concreto			
	Execução de alvenaria de pedra			
Anotação da Fiscalização				
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2			
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
			Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563673-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				quarta-feira, 14 de agosto de 2024		
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024						
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA						
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE						
DADOS DO DIA E DA OBRA						
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	41 dias	
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	109 dias	
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde:		
Equipam.	Betoneira estacionária					
	Serra Manual					
	Policorte					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		1	Motorista / Operador		-
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Topografo		-
	Calceteiro		-	Eletricista		
	Pedreiro		2	Pintor		-
	Armador		-	Carpinteiro		-
	Servente		4	Gesseiro		-
Serviços Executados	Execução de aterro					
	Execução de piso em concreto					
	Execução de alvenaria de pedra					
Anotação da Fiscalização						
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2					
Vistos	Fiscalização:			Contratada:		
				Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				quinta-feira, 15 de agosto de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024					
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA					
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	42 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	108 dias
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária				
	Serra Manual				
	Policorte				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro	-	Eletricista		
	Pedreiro	2	Pintor	-	
	Armador	-	Carpinteiro	-	
	Servente	4	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Execução de aterro				
	Execução de piso em concreto				
	Execução de alvenaria de pedra				
Anotação da Fiscalização					
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil R.O. nº 271797661 - 2				
Vistos	Fiscalização:			Contratada:	
				Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				sábado, 17 de agosto de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024					
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA					
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	44 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	106 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:		
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Motorista / Operador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Topografo	-	
	Calceteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor	-	
	Armador		Carpinteiro	-	
Serviços Executados	Servente		Gesseiro		-
	sem atividades				
Anotação da Fiscalização					
	MARCELO JOSIAS BARROS NETO ENGENHEIRO CIVIL Nº 271739664-2				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:		
			 Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS		domingo, 18 de agosto de 2024		
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00	Corridos 45 dias	
Prazo da Obra		150 dias	Restantes 105 dias	
Condições Climáticas:		Manhã: Boa. / Tarde:		
Equipam.				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro		Motorista / Operador	
	Mestre de Obras/ Encarregado		Topografo	-
	Calceteiro		Eletricista	
	Pedreiro		Pintor	-
	Armador		Carpinteiro	-
	Servente		Gesseiro	-
Serviços Executados	sem atividades			
Anotação da Fiscalização	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro CIVIL RN - nº 271797661 - 2			
Vistos	Fiscalização:	Contratada:  Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			segunda-feira, 19 de agosto de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 46 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 104 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	4	Gesseiro	-
Serviços Executados	Execução de aterro			
	Execução de piso em concreto			
	Execução de alvenaria de pedra			
Anotação da Fiscalização				
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil - nº 271797661 - 2			
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
			Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			terça-feira, 20 de agosto de 2024		
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024					
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA					
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	47 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	103 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:		
Equipam.	Betoneira estacionária				
	Serra Manual				
	Policorte				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro	-	Eletricista		
	Pedreiro	2	Pintor	-	
	Armador	-	Carpinteiro	-	
	Servente	4	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Execução de aterro				
	Execução de piso em concreto				
	Execução de alvenaria de pedra				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:		Contratada:		
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				quarta-feira, 21 de agosto de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024					
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA					
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	48 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	102 dias
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária				
	Serra Manual				
	Policorte				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro	-	Eletricista		
	Pedreiro	2	Pintor	-	
	Armador	-	Carpinteiro	-	
	Servente	4	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Execução de aterro				
	Execução de piso em concreto				
	Execução de alvenaria de pedra				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:			Contratada:	
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2			Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				quinta-feira, 22 de agosto de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024					
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA					
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	49 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	101 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:		
Equipam.	Betoneira estacionária				
	Serra Manual				
	Policorte				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro	-	Eletricista		
	Pedreiro	2	Pintor	-	
	Armador	-	Carpinteiro	-	
	Servente	4	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Execução de aterro				
	Execução de piso em concreto				
	Execução de alvenaria de pedra				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:		Contratada:		
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				sexta-feira, 23 de agosto de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024					
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA					
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	50 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	100 dias
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária				
	Serra Manual				
	Policorte				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro	-	Eletricista		
	Pedreiro	2	Pintor	-	
	Armador	-	Carpinteiro	-	
	Servente	4	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Execução de aterro				
	Execução de piso em concreto				
	Execução de alvenaria de pedra				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:			Contratada:	
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2			Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			sábado, 24 de agosto de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 51 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 99 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro		Motorista / Operador	
	Mestre de Obras/ Encarregado		Topografo	-
	Calceteiro		Eletricista	-
	Pedreiro		Pintor	-
	Armador		Carpinteiro	-
	Servente		Gesseiro	-
Serviços Executados	sem atividades			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				domingo, 25 de agosto de 2024		
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024						
 J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA						
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE						
DADOS DO DIA E DA OBRA						
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	52 dias	
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	98 dias	
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:			
Equipam.						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		-	Motorista / Operador		-
	Mestre de Obras/ Encarregado		-	Topografo		-
	Calceteiro		-	Eletricista		-
	Pedreiro		-	Pintor		-
	Armador		-	Carpinteiro		-
	Servente		-	Gesseiro		-
Serviços Executados	sem atividades					
Anotação da Fiscalização						
Vistos	Fiscalização:		Contratada:			
 Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil - RN - nº 271797661 - 2		 Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563579-2				

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

segunda-feira, 26 de agosto de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024



J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:

07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Corridos

53 dias

Prazo da Obra

150

dias

Restantes

97 dias

Condições Climáticas:

Manhã: Boa. / Tarde:

Equipam.

Betoneira estacionária

Serra Manual

Policorte

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Motorista / Operador

-

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Topografo

-

Calceteiro

-

Eletricista

-

Pedreiro

2

Pintor

-

Armador

-

Carpinteiro

-

Servente

4

Gesseiro

-

Serviços Executados

Execução de aterro

Execução de piso em concreto

Execução de alvenaria de pedra

Anotação da Fiscalização

Fiscalização:

Contratada:

Vistos

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil BA - nº 271797661 - 2

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

terça-feira, 27 de agosto de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024



J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:	07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00	Corridos	54 dias
Prazo da Obra	150 dias	Restantes	96 dias

Condições Climáticas: Manhã: Boa. / Tarde:

Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	4	Gesseiro	-

Serviços Executados	Execução de aterro
	Execução de piso em concreto
	Execução de alvenaria de pedra
	Execução de alambrado

Anotação da Fiscalização	
--------------------------	--

Fiscalização: Contratada:

Vistos

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2


Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

quarta-feira, 28 de agosto de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024



J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:	07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00	Corridos	55 dias
Prazo da Obra	150 dias	Restantes	95 dias

Condições Climáticas:

Manhã: Boa. / Tarde:

Equipam.

Betoneira estacionária
Serra Manual
Policorte

Pessoal

Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
Calceteiro	-	Eletricista	-
Pedreiro	2	Pintor	-
Armador	-	Carpinteiro	-
Servente	4	Gesseiro	-

Serviços Executados

Execução de aterro
Execução de piso em concreto
Execução de alvenaria de pedra
Execução de alambrado
Execução pista de skate

Anotação da Fiscalização

Fiscalização:

Contratada:

Vistos

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - n° 271797661 - 2


Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563079-2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			quinta-feira, 29 de agosto de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 56 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 94 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	4	Gesseiro	-
Serviços Executados	Execução de aterro			
	Execução de piso em concreto			
	Execução de alvenaria de pedra			
	Execução de alambrado			
	Execução pista de skate			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			sexta-feira, 30 de agosto de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 57 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 93 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	4	Gesseiro	-
Serviços Executados	Execução de aterro			
	Execução de piso em concreto			
	Execução de alvenaria de pedra			
	Execução de alambrado			
	Execução pista de skate			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				sábado, 31 de agosto de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024					
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA					
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	58 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	92 dias
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Motorista / Operador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Topografo	-	
	Calceteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor	-	
	Armador		Carpinteiro	-	
	Servente		Gesseiro	-	
Serviços Executados	sem atividades				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:		Contratada:		
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil R.R. n° 271797661-2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2		



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 476414/2024
Emissão: 12/08/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: BADCA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Registro: 2715636792

CPF: 995.***.***-68

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 29/07/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE TIRADENTES

Data de Formação: 21/07/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000003307

CNPJ: 05.325.864/0001-05

Data Início: 10/04/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 476415/2024

Emissão: 12/08/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 18A1x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 05.325.864/0001-05

Registro: 0000003307

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 10/04/2019

Faixa: 2

Objetivo Social Pleno: CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DE QUALQUER TIPO, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS OLÍMPICAS E OUTRAS CONSTRUÇÕES SIMILARES; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, GESTÃO DE ATERROS SANITÁRIOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DO RESÍDUOS PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL E ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E RODAGENS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; ATIVIDADES DE CONSULTORIA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA; OS SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTE DE TELECOMUNICAÇÕES - SRTI; ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES MOVEIS, PARA PROMOVA A TRANSMISSÃO DE VOZ, DADOS E IMAGEM; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO E DE DIAGRAMAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO DOMÉSTICO OU INDUSTRIAL E DE ÁGUAS PLUVIAIS POR MEIO DE REDES DE COLETORES, TANQUES E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS. RODOVIAS, FERROVIAS E PORTOS; USINAS DE COMPOSTAGEM; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL (NÃO ESPECIALIZADA) DE PRÉDIOS DE QUALQUER TIPO: RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, FÁBRICAS, ARMAZÉNS, HOSPITAIS, PRÉDIOS PÚBLICOS E OUTROS PRÉDIOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA CORNO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, LIMPEZA DE RUAS; CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AUTO - ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NÃO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA: AS ATIVIDADES DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL SÃO: CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DE QUALQUER TIPO, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS OLÍMPICAS E OUTRAS CONSTRUÇÕES SIMILARES; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, GESTÃO DE ATERROS SANITÁRIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL E ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E URBANISMO; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E RODAGENS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA CIVIL; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES EM BAIXA TENSÃO; COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO DOMÉSTICO OU INDUSTRIAL E DE ÁGUAS PLUVIAIS POR MEIO DE REDES DE COLETORES, TANQUES E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODESIA; USINAS DE COMPOSTAGEM; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; LIMPEZA DE RUAS; CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AUTO - ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NÃO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS.

Endereço Matriz: RUA A, 75, LOT. ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO, CENTRO, JAPARATUBA, SE, 49960000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 26/05/2003

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000002659EMSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais co





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 476415/2024

Emissão: 12/08/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 18A1x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

quadro técnico.

- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Registro: 2715636792

CPF: 995.***-68

Data Início: 10/04/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240390999

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2715636792

Registro: 2715636792SE

Empresa contratada: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Registro : 0000003307-SE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE PIRAMBU ESTADO DE SERGIPE

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

PRAÇA Praça dos Esportes

Nº: 75

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PIRAMBU

UF: SE

CEP: 49190000

Contrato: 76/2024

Celebrado em: 07/05/2024

Valor: R\$ 1.389.046,13

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Calamidade Pública

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA Praça dos Esportes

Nº: 75

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PIRAMBU

UF: SE

CEP: 49190000

Data de Início: 04/07/2024

Previsão de término: 31/12/2024

Coordenadas Geográficas: -10.701820, -36.861510

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICÍPIO DE PIRAMBU ESTADO DE SERGIPE

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA	240,00	m3
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS	3.300,00	m2
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	3.300,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES	244,00	m2
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO	1.460,00	m3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03, CONTRATO Nº 76/2024, PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA/SE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

ABENC/SE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS DE SERGIPE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 995.239.735-68

_____, _____ de _____ de _____
Local data

MUNICÍPIO DE PIRAMBU ESTADO DE SERGIPE - CNPJ: 13.095.039/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YdDCZ
Impresso em: 19/07/2024 às 10:35:01 por: , ip: 45.161.179.118





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240390999

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 262,55**

Registrada em: **18/07/2024**

Valor pago: **R\$ 262,55**

Nosso Número: **8203225409**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YdDCZ
Impresso em: 19/07/2024 às 10:35:01 por: , ip: 45.161.179.118

www.crea-se.org.br
Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br
Fax: XXXX-XXXX



CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Sergipe





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240390555

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

MANOEL MESSIAS SOARES NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2717976612

Registro: 2717976612SE

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Pirambu

RUA RUA GIVALDO MOURA DA SILVA

Complemento:

Cidade: PIRAMBU

Bairro: CENTRO

UF: SE

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

Nº: 16

CEP: 49190000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA PIRAMBU

Complemento:

Cidade: PIRAMBU

Data de Início: 17/04/2024

Previsão de término: 31/12/2024

Bairro: CENTRO

UF: SE

Nº: s/n

CEP: 49190000

Coordenadas Geográficas: -10.738536, -36.856371

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: 49190-000

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pirambu

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

Quantidade

Unidade

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

2.000,00

m2

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

2.000,00

m2

60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO

1.000,00

m

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART referente ao serviço de elaboração do orçamento e fiscalização na construção da nova etapa da orla na Sede do Município de Pirambu-SE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Documento assinado digitalmente

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE



MANOEL MESSIAS SOARES NETO

Data: 03/09/2024 09:53:45-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MANOEL MESSIAS SOARES NETO - CPF: 049.126.295-70

_____, _____ de _____ de _____

Local

data

Prefeitura Municipal de Pirambu - CNPJ: 13.095.039/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em: 19/07/2024

Valor pago: R\$ 99,64

Nosso Número: 8203223990

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 56cWz
Impresso em: 03/09/2024 às 09:52:30 por: , ip: 177.37.182.61

www.crea-se.org.br

crea-se@crea-se.org.br

Tel: 3234-3000

Fax: XXXX-XXXX



CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Sergipe



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.325.864/0001-05
Razão Social: J A PROJECT E ENGENHARIA LTDA
Endereço: R A 75 LOT ARTHUR B DO ROS / CENTRO / JAPARATUBA / SE / 49960-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/08/2024 a 25/09/2024

Certificação Número: 2024082704071225508483

Informação obtida em 03/09/2024 09:49:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.325.864/0001-05

Razão

Social:

J A PROJECT E ENGENHARIA LTDA

Endereço:

R A 75 LOT ARTHUR B DO ROS / CENTRO / JAPARATUBA /
SE / 49960-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/08/2024 a 06/09/2024

Certificação Número: 2024080806461225508499

Informação obtida em 12/08/2024 17:58:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.325.864/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:23:06 do dia 18/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/09/2024.

Código de controle da certidão: **9D53.AB7A.32F7.747F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Japaratuba

Certidão N°
3722024

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

C.M.C
0533

Em cumprimento à solicitação do requerente, com as características acima e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, CERTIFICAMOS para fins de direito, que mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte.

CONTRIBUINTE

Código 3461	Nome ou Razão Social J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ 05.325.864/0001-05
Endereço LOT RUA A LOT ARTHUR BISPO DO ROSARIO Nº 75	Complemento	
Bairro CENTRO	Cidade Japaratuba	UF SE

Data Emissão

11/07/2024

Data Validade

09/09/2024

IMPORTANTE

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<http://municipioonline.com.br/se/prefeitura/japaratuba>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: FDAC354A

quinta-feira, 11 de julho de 2024



Declaração de Recolhimento do ICMS N. 451275 / 2024

Identificação do Solicitante: 05.325.864/0001-05

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **05.325.864/0001-05** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **05.325.864/0001-05** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **12/08/2024 às 17:40:13**, válida até **11/09/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 12 de Agosto de 2024

Autenticação: 20240812ATWLPS



Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 451271 / 2024

Identificação do Solicitante: 05.325.864/0001-05

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **05.325.864/0001-05** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **05.325.864/0001-05** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **12/08/2024 às 17:36:54, válida até 11/09/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 12 de Agosto de 2024

Autenticação: 20240812BVAA2G



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: **CÍVEL**

RESULTADO: **NEGATIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Tipo de Pessoa: Jurídica

CNPJ: 05.325.864/0001-05

Nome Fantasia: J A PROJECT & ENGENHARIA

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

NADA CONSTA


OBSERVAÇÕES

1. **Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0158605** expedida automaticamente em **27/08/2024** e válida até **26/09/2024**.

Código de Autenticidade nº **9685.6187.3582.1466**.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.325.864/0001-05

Certidão nº: 55266873/2024

Expedição: 12/08/2024, às 17:48:25

Validade: 08/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.325.864/0001-05, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra	Nome da obra	Data do cadastramento		
90.020.27538/76	J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA	01/08/2024 15:54		
Origem do cadastramento				
e-CAC				
Tipo Zona	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Zona Urbana	Nº SE20240390999			S/N
Data do início da obra	CNAE			
04/07/2024	4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas			

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	04/07/2024

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	PIRAMBU	SE	49.190-000
Bairro	Logradouro	Número	
CENTRO	AVENIDA MARIA A OLIVEIRA	S/N	

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA	05.325.864/0001-05	Construtora
Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade	
04/07/2024		

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
13.095.039/0001-81	MUNICIPIO DE PIRAMBU

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Residencial multifamiliar	Alvenaria	100,00 m²

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Residencial multifamiliar	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	20,00 m²	250,00 m²	270,00 m²
Obra Nova	Edifício de Garagens	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	15,00 m²	50,00 m²	65,00 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra
435,00 m²

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 05.325.864/0001-05

Aopção pelo SimplesNacional/ou SIMEIabrangetodosos estabelecimentosda empresa

Nome Empresarial: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 05.325.864/0001-05	Razão Social J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24228.4546885-2	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000256768454			Valor Total do Documento 289,88

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	147,83			147,83
	C1 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSCS	121,74			121,74
	C1 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNO:90.020.05463/78				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	20,31			20,31
	C1 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNO:90.020.05463/78				
	Totais	289,88			289,88

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

15/08/2024 15:53:11

85850000035 5 74710385242 6 33071624228 2 45468852663 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000035 5 74710385242 6 33071624228 2 45468852663 7



CNPJ: 05.325.864/0001-05
Número: 07.16.24228.4546885-2
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 289,38

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.02
1324213115 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: J PROJECT ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 2206-3 CONTA: 7.290-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: 07.16.24228.4546885-2
CNPJ DO PAGADOR: 05.325.864/0001-05
VALOR: R\$ 289,88
DATA: 20/08/2024 - 13:05:02
DESCRICAO: Pag. INSS

PAGO PARA: DAR- DOCUMENTO DE ARRE. REC. FEDERAL
COD.BARRA: 85850000035 5 74710385242 6 33071624228 2
45468852663 7

Notificacao enviada em: 20/08/2024 - 13:05:02

=====

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: 3.813.G64.B2S.2E3.J2Y

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CPF/CNPJ do Empregador
05.325.864

Nome/Razão Social do Empregador
J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124080822403311-0

Tag
40479861 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

289,38

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	03	289,38	0,00	0,00	0,00	289,38
Total Geral:		289,38	0,00	0,00	0,00	289,38

Data de geração da Guia: 08/08/2024 às 09:04:33 – Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.19
2206302206 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: J PROJECT ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 2206-3 CONTA: 7.290-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: 0124080822403311-0
CNPJ DO PAGADOR: 05.325.864/0001-05
VALOR: R\$ 289,38
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/08/2024 - 17:13:10
DESCRICAO:Pag. FGTS

PAGO PARA: GFD- GUIA DO FGTS DIGITAL

TAG: 40479861 07/2024

CHAVE PIX:

v2/cobv/cdb379b04bc04081adc42194a312e1f95204000
0053039865802B INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/08/2024 - 17:13:12

=====

DOCUMENTO: 082201

AUTENTICACAO SISBB: 2.726.F75.D3B.1A1.F1D

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

05.325.864

Nome Empregador:

J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores:

03

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2024

Número da Guia:

0124080822403311-0

Emitida por:

10.451.338/0001-13 - CONTEPA -

Data Emissão:

08/08/2024 09:04:33 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		05.325.864/0001-05		Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		CLEILTON MOURA BOMFIM	00284000016	588.104.715-04	101	20/08/2024	Mensal	658,83		52,72	0,00	0,00	0,00	52,72
07/2024		DANILO DOS SANTOS	00294000014	054.834.025-02	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		JOSE HUMBERTO DOS SANTOS	00284000015	311.983.175-15	101	20/08/2024	Mensal	1.546,21		123,70	0,00	0,00	0,00	123,70
			Total do Tomador		Sem Tomador									
			Total do Estabelecimento		40.479.861/0001-19									
					Total da Guia									
					289,38									
					289,38									
					289,38									

Empregador:



03 Origem: Gestão de Guias
08/08/2024 09:04:33 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.325.864/0001-05										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGT's Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024										
	Total do Estabelecimento	05.325.864/0001-05	3.617,14	289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,38

Estabelecimento:	90-020-0546378	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração										

(*) Encargamento - Geral, Incutave e impropriedade pública de assistência social direta ou indireta, contratado pela CLT.

- [illegible]



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

05.325.864 Nome Empregador: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores:

03

Origem: Gestão de Guias

08/08/2024 09:04:33 (Brasília)

Vencimento da Guia:

20/08/2024 Número da Guia: 0124080822403311-0

Emitida por:

10.451.338/0001-13 - CONTEPA -

Data Emissão:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	05.325.864/0001-05	3								
			3.617,14	289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,38
			Total da Guia							



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

05.325.864 Nome Empregador: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores:

12 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2024 Número da Guia: 0124080822403311-0 Emitida por: 10.451.338/0001-13 - CONTEPA -

Data Emissão:

08/08/2024 09:04:33 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

05.325.864/0001-05											
Comp. Apuração 07/2024	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total								
			Total do Estabelecimento								
		05.325.864/0001-05	3.617,14	289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,38



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.325.864 Nome Empregador: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores: 03 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124080822403311-0 Emitida por: 10.451.338/0001-13 - CONTEPA - Data Emissão: 08/08/2024 09:04:33 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	03	3.617,14	289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,38
	Total da Guia	3.617,14	289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,38
