

06/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:39:44
220602206 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME PIRAMBU-SE - FEB
AGENCIA: 2206-3 CONTA: 15.359-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2024
NR. DOCUMENTO	558.081.000.022.757
VALOR TOTAL	34.820,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIRIUS E C LTDA
AGENCIA: 8081-0 CONTA: 22.757-9
NR. DOCUMENTO 552.206.000.015.359

=====

NR.AUTENTICACAO	8.200.281.64A.AAC.AA8
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH648496 FABRICIO MUNIZ DOS SANTOS.

PAGO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME PIRAMBU-SE - FEB
Agência 2206-3
Conta corrente 15359-1

Creditado

Nome SIRIUS E C LTDA
Agência 8081-0
Conta corrente 22757-9
Valor 34.820,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH648495 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO	06/05/2024 15:36:28
	JH648496 FABRICIO MUNIZ DOS SANTOS	06/05/2024 15:39:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH648496 FABRICIO MUNIZ DOS SANTOS.



Entre contas correntes

Debitado

Nome SME PIRAMBU-SE - FEB
Agência 2206-3
Conta corrente 15359-1

Creditado

Nome SIRIUS E C LTDA
Agência 8081-0
Conta corrente 22757-9
Valor 34.820,01
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 325602777.

Usuário: JH648495 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO.



TERMO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 50.907.330/0001-33

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS

Bairro: INACIO BARBOSA

E-mail: secitda@gmail.com

Compl: SALA B

Cidade: Aracaju

Telefone: (79)88526-9620

UF: SE

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Conta:

EMPENHO

0503004

EMIÇÃO

03/05/2024

CLASSIFICAÇÃO

1011.44905100-15420000

TIPO

Global

FONTE

15420000 - Transferências do FUNDEB -
Complementação da União - VAAT

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 55/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO NA UNIDADE DE ENSINO LEONOR BARRETO FRANCO, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2024.

Documentação

Nota Fiscal 04
Valor R\$ 39.167,60
Emissão 09/04/2024
Horário de Entrega 03/05/2024 11:53:56

Para acompanhar o andamento do seu processo na fila pública, acesse o link abaixo:

<http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pirambu/fornecedor/filapagamento>

Cadastrado por: Santiago Santos Gois

Secretaria de Controle Interno

☒ Aprovado
☐ Reprovado

Obs. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Nota: 2024000

00000004

Código Verificação

EC7L-GGPQ



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

09/04/2024 17:19:25

Período de Competência

04/2024

Município de Prestação do

Serviço

Pirambu - SE

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte
(ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em
Pirambu

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Nome Fantasia

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES

Email

SECLTDA@GMAIL.COM

CPF/CNPJ

50.907.330/0001-33

Inscrição Municipal

1440598

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 98852-6962

Endereço

Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, SALA B, Inácio Barbosa - CEP: 49040-830 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS

CPF/CNPJ

13.095.039/0001-81

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3276-1693

E-mail

sec.obraseurbanismo@gmail.com

Endereço

PC NOSSA SRA DE LOURDES, 16 - CENTRO - CEP: 49190-000 - Pirambu - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4213800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Encaminhamos a Vossa Senhoria, nossa Fatura de Serviços Nº01/2024, referente aos serviços de Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco no município de Pirambu, Estado de Sergipe. Conforme Contrato nº 55/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECLARO QUE

☒ Os Serviços foram Prestados

☐ Os Produtos foram Entregues

☐ A Obra foi Executada

D. 22/04/24

Handwritten signature

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

39.167,60

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

39.167,60

Aliquota (%)

2,5000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

979,19

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

38.188,41

Valor Total da Nota (R\$)

39.167,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 5.268,04 Federal e R\$ 1.958,38 Municipal. Fonte: IBPT [D8CAC2]

Visualizado em: 09/04/2024 17:19:25

Para validação desta NFSe acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

FATURA DO BOLETIM 01/2024

CONTRATO Nº 55/2024

**SIRIUS ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕES**

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA
DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU,
ESTADO DE SERGIPE.**

Aracaju - SE. 08 de Abril de 2024

À
Prefeitura Municipal de Pirambu – SE.

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16, Centro.

Pirambu - Estado de Sergipe.

Prezado Senhor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, nossa **Fatura de serviços nº 01/2024**, referente a **Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco no município de Pirambu, Estado de Sergipe**. Conforme **Contrato nº 55/2024** ao mesmo tempo em que solicitamos de Vossa Senhoria se digne homologar.

BANCO: BANCO DO BRASIL
AG.: 8081-0
CONTA CORRENTE: 22757-9

Atenciosamente,



SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Ana Maria Santos
Sócia Administradora

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

FATURA Nº. 01/2024

CONTRATO Nº 55/2024 – PREFEITURA DE PIRAMBU-SE.

OBRA: Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco Localizada na Sede do município de Pirambu, Estado de Sergipe.

01 – VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 39.167,60
Importa a presente fatura em (Trinta e nove mil cento e sessenta e sete reais e sessenta centavos).

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.


Ana Maria Santos
Sócia Administradora

ARACAJU (SE) 08 de abril de 2024

RECIBO

R\$ 39.167,60

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pirambu – SE a importância de R\$39.167,60 (Trinta e nove mil cento e sessenta e sete reais e sessenta centavos), referente à Fatura de Serviços Nº. 01/2024, correspondente a Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco Localizada na Sede do município de Pirambu, Estado de Sergipe. Conforme contrato nº 55/2024.

Aracaju SE. de de

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.


Ana Maria Santos
Sócia Administradora

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33

Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa

Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962

EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO



OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.

Local : PIRAMBU/SE.

CONTRATO
55/2024

PERÍODO:
18/03/2024
a
08/04/2024

BOLETIM Nº
BM 01

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADES			QUANT. CONTRATADA	VALORES R\$			%
			ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	
01	REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO									
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES									
01.01.001	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un		1,00	1,00	1,00	-	862,55	862,55	100,0%
01.01.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3		11,80	11,80	11,80	-	334,65	334,65	100,0%
01.01.003	Pintura de meio fio (calçada)	m		144,90	0,00	144,90	-	-	-	0,0%
01.01.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022	m2		112,35	0,00	112,35	-	-	-	0,0%
01.01.005	Meio-fio pre-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m		144,90	0,00	144,90	-	40,98	1.197,20	7,4%
TOTAL DO ITEM 01.01										
01.02	ELEVAÇÕES									
01.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3		4,52	0,00	4,52	-	56,45	-	0,0%
01.02.002	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padrolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3		6,00	0,00	6,00	-	552,6	-	0,0%
01.02.003	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	m2		11,00	0,00	11,00	-	121,86	-	0,0%
01.02.004	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 09	m2		67,80	0,00	67,80	-	48,87	-	0,0%
01.02.005	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3		6,00	0,00	6,00	-	2.515,61	-	0,0%
01.02.006	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2		135,60	0,00	135,60	-	7,41	-	0,0%
01.02.007	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2		135,60	0,00	135,60	-	35,02	-	0,0%
01.02.008	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2		1233,60	0,00	1233,60	-	15,27	-	0,0%

Handwritten signature and initials

BC TITIM DE MEDIÇÃO

OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARREIROFRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.

Local : PIRAMBU/SE.

CONTRATO
55/2024

PERÍODO:
18/03/2024
a
08/04/2024

BOLETIM N°
BM 01



ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$			%
				ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	
01.02.009	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	1233,60			0,00	17,09	-	-	21.082,22	0,0%
01.02.010	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01	m	22,60			0,00	37,76	-	-	853,38	0,0%
01.02.011	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de camelo, a 95% do proctor normal	m3	213,360			0,00	4,65	-	-	992,12	0,0%
01.02.012	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	213,360			0,00	29,41	-	-	6.274,92	0,0%
01.02.013	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e encerramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	120,860			0,00	60,59	-	-	7.322,91	0,0%
01.02.014	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2	92,50			0,00	57,37	-	-	5.306,73	0,0%
01.02.015	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	101,86			0,00	120,18	-	-	12.241,53	0,0%
01.02.016	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02	m2	101,86			0,00	57,85	-	-	5.892,60	0,0%
TOTAL DO ITEM 01.02											
01.03	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS										
01.03.001	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	5,00			0,00	40,65	-	-	203,25	0,0%
01.03.002	Revisão de ponto de água tipo 1	un	7,00			0,00	30,19	-	-	211,33	0,0%
01.03.003	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 02	m	28,00			0,00	47,05	-	-	1.317,40	0,0%
01.03.004	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	50,00			0,00	21,83	-	-	1.091,50	0,0%
TOTAL DO ITEM 01.03											
01.04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
01.04.001	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	20,00			0,00	28,11	-	-	562,20	0,0%
01.04.002	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	20,00			0,00	116,34	-	-	2.326,80	0,0%
01.04.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	6,00			0,00	318,49	-	-	1.910,94	0,0%

[Handwritten signature]

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR
BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.

Local : PIRAMBU/SE.

CONTRATO
55/2024PERÍODO:
18/03/2024
a
08/04/2024BOLETIM Nº
BM 01SIRIUS
CONSTRUÇÕES

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$				% Medido
				ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	
01.04.004	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	un	6,00			0,00	286,42	-	-	-	1.718,52	0,0%
01.04.005	de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	5,00			0,00	299,56	-	-	-	1.497,80	0,0%
01.04.006	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	20,00			0,00	104,00	-	-	-	2.080,00	0,0%
01.04.007	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	2,00			0,00	62,90	-	-	-	125,80	0,0%
01.04.008	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	3,00			0,00	67,41	-	-	-	202,23	0,0%
01.04.009	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3,00			0,00	294,18	-	-	-	882,54	0,0%
01.04.010	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	300,00			0,00	7,43	-	-	-	2.229,00	0,0%
01.04.011	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	300,00			0,00	9,13	-	-	-	2.739,00	0,0%
	TOTAL DO ITEM 01.04							-	-	-	16.274,83	
01.05	MURO											
	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m2	131,05		120,00	120,00	316,42	-	37.970,40	37.970,40	41.466,84	91,6%
01.05.001	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (seção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios	m²	65,60			0,00	421,88	-	-	-	27.675,33	0,0%
01.05.002	TOTAL DO ITEM 01.05							-	37.970,40	37.970,40	69.142,17	
01.06	ESQUADRIAS											
	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	11,00			0,00	1.044,90	-	-	-	11.493,90	0,0%
01.06.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	46,20			0,00	22,34	-	-	-	1.032,11	0,0%
01.06.002	Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas	m2	9,20			0,00	368,59	-	-	-	3.391,03	0,0%
01.06.003	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo pantográfica, inclusive fechadura	m2	12,80			0,00	384,20	-	-	-	4.917,76	0,0%
01.06.004	TOTAL DO ITEM 01.06							-	-	-	20.834,80	0,0%

470.200

A

BOLETIM DE MEDIÇÃO										
OBRA : EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.										
Local : PIRAMBU/SE.										
CONTRATO		PERÍODO:		BOLETIM Nº		SIRIUS CONSTRUÇÕES				
55/2024		18/03/2024 a 08/04/2024		BM 01						
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	QUANTIDADES			VALORES R\$			Medido
				ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	
01.07	LOUÇAS E METAIS									
	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	4,000			0,00				0,0%
	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	1,000			0,00		0,001,00		0,0%
01.07.001										
01.07.002										
01.07.003										
01.07.004										

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2024

OBRA:: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LOCALIZAÇÃO	UNID	QUANT
01	REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01.001	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 Cálculo: 1,00 unid	unid	1,00
01.01.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento Cálculo: 43,70 x 1,80 x 0,15 = 11,80 m³	m³	11,80
01.02	MURO		
01.02.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar. Cálculo: 48,00 X 2,50 =120,00 m²	m²	120,00

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Ana Maria Santos
Resp. Técnico - CREA 2708814672



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240374873

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

MANOEL MESSIAS SOARES NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2717976612

Registro: 2717976612SE

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Pirambu

RUA RUA GIVALDO MOURA DA SILVA

Complemento:

Cidade: PIRAMBU

Bairro: CENTRO

UF: SE

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

Nº: 16

CEP: 49190000

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 4.000,00

Ação Institucional: Outros

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PIRAMBU

Complemento:

Cidade: PIRAMBU

Data de Início: 18/03/2024

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pirambu

Bairro: CENTRO

UF: SE

Previsão de término: 17/06/2024

Coordenadas Geográficas: -10.738536, -36.856371

Código: 49190-000

Nº: s/n

CEP: 49190000

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #TOS_1.1.6 - DE MURO

Quantidade

101,86

Unidade

m2

131,05

m2

5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

ART referente ao serviço de fiscalização, da Reforma da Escola Leonor Barreto Franco, na Sede do Município de Pirambu-SE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MANOEL MESSIAS SOARES NETO - CPF: 049.126.295-70

Local

data

Prefeitura Municipal de Pirambu - CNPJ: 13.095.039/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em: 18/04/2024

Valor pago: R\$ 99,64

Nosso Número: 8203107269



Documento assinado digitalmente

MANOEL MESSIAS SOARES NETO

Data: 19/04/2024 09:58:08-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Cd698
Impresso em: 19/04/2024 às 10:00:15 por: , ip: 179.181.210.163

www.crea-se.org.br

Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br




Fax: XXXX-XXXX



CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Sergipe





**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DA
ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

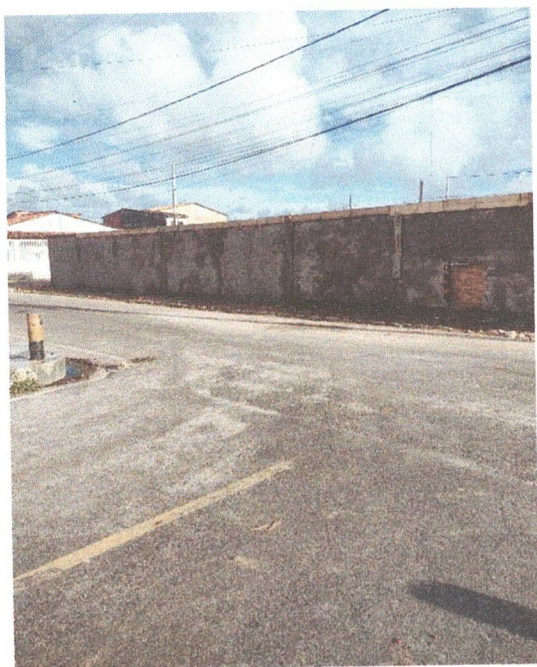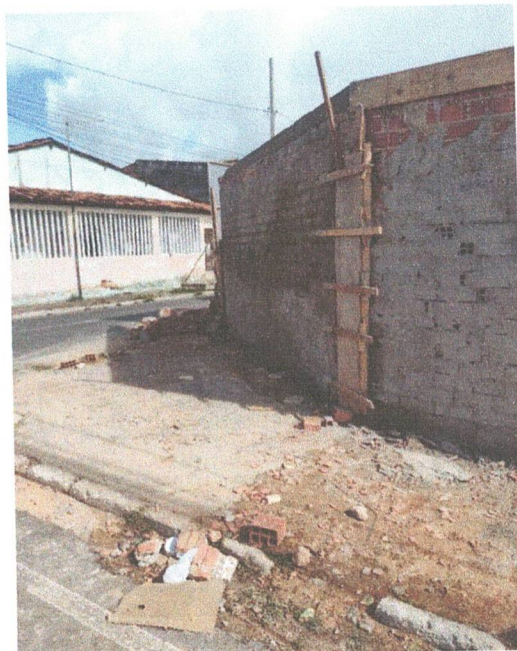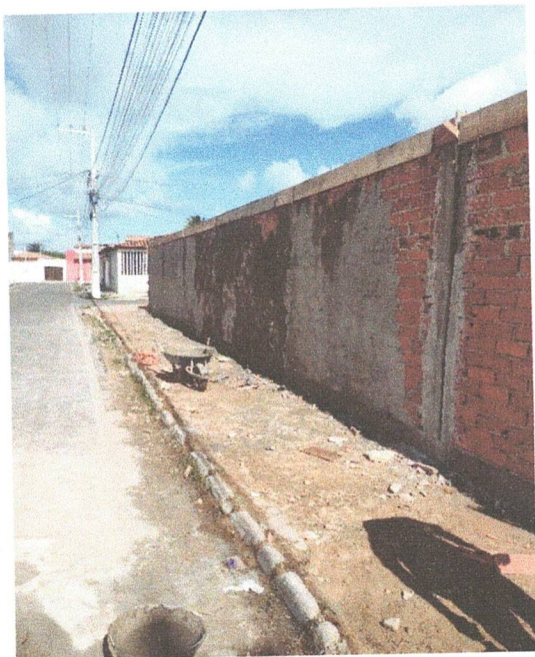

Handwritten signature in blue ink.




**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DA
ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

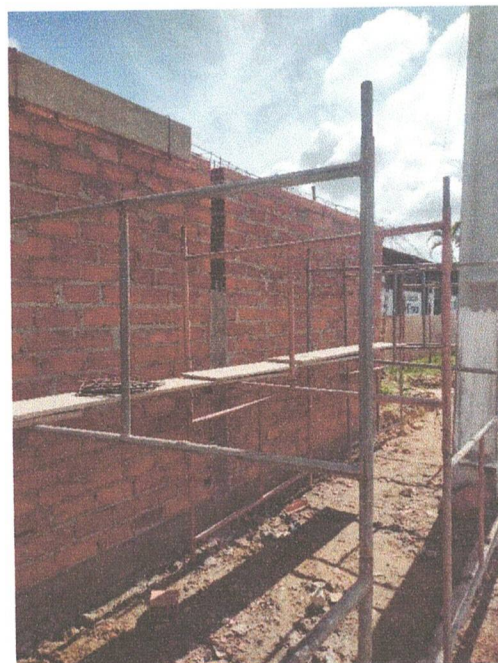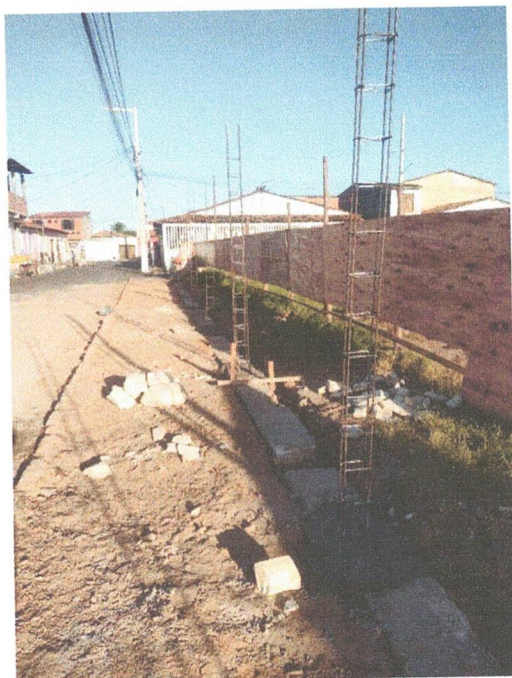

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com





**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DA
ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

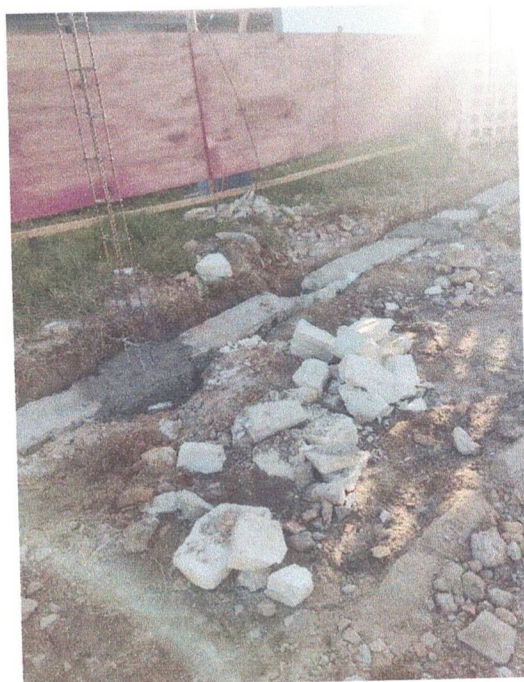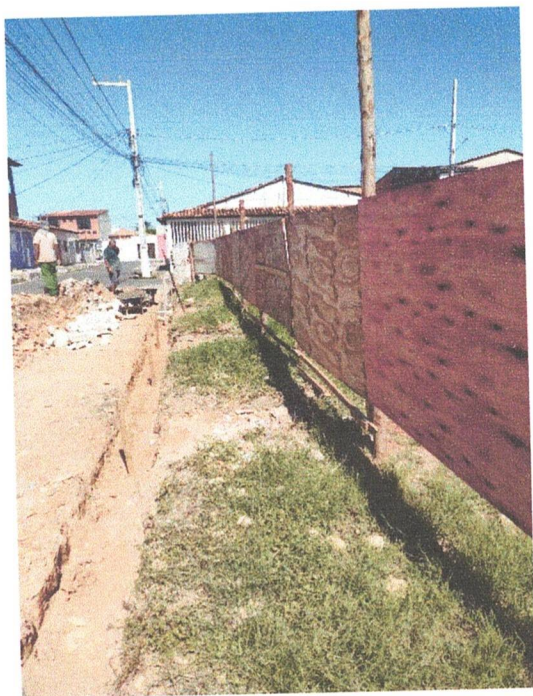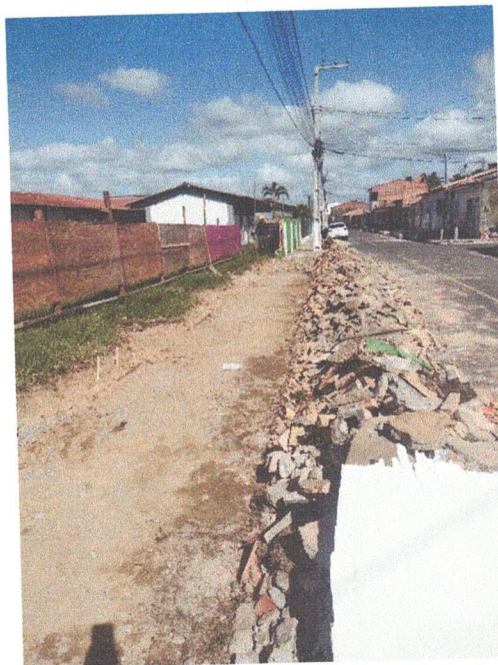

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DA
ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

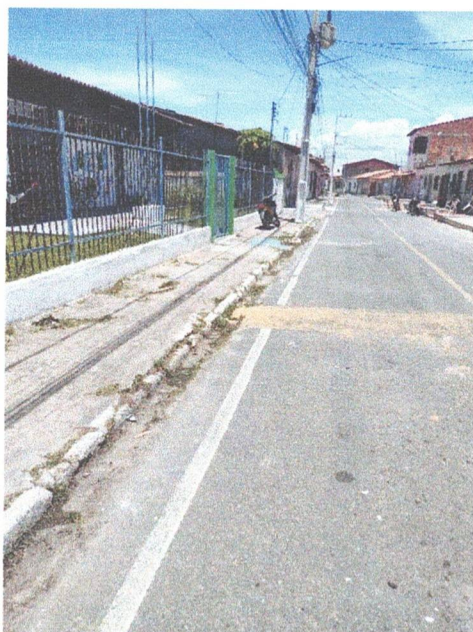

Handwritten signature in blue ink.



DIARIO DE OBRA

OBJETO:SERVIÇOS DE REFORNA DA ESCOLA LEONOR BARRETO
FRANCO - PIRAMBU-SERGIPE

CONTRATO Nº: 55/2024

SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES

DATA : 18/03/2024

Os serviços da obra iniciou se com a mobilização de equipamentos e pessoal como também a locação do barracão. Tempo bom.

DATA : 19/03/2024

Os serviços de mobilização de equipamentos e pessoal teve continuidade, bem como execução do barracão de obra e também chegaram as madeiras para execução do tapume, cobertura do barracão e para formas de concreto. Tempo bom.

DATA : 20/03/2024

Segue a execução do barracão da obra e iniciou-se a demolição do muro existente com a colocação do tapume no perímetro do muro demolido, como também chegaram os materiais agregados como: brita, areia lavada, pedra calcária e arenoso. Tempo bom.

DATA : 21/03/2024

Segue a execução do barracão da obra e iniciou a demolição do muro existente com a colocação do tapume no perímetro demolido. Tempo bom.

DATA : 22/03/2024

A execução do barracão da obra foi concluída e começou a demolição do muro existente com a colocação do tapume no perímetro demolido e início a execução do muro com a escavação manual para a alvenaria de pedra calcária. Chegou o aço para montagem das ferragens do cintamento inferior e pilares do muro. Tempo bom.

DATA : 25/03/2024

Continua a execução da base do muro com a alvenaria de pedra calcária e iniciou a demolição da calçada em concreto despolado existente na fachada da escola e montagem das armações dos pilares e cintamento inferior do muro. Tempo bom.

DATA : 26/03/2024

A demolição da calçada em concreto despolado existente na fachada da escola foi concluída. Continua a execução da alvenaria de pedra calcária do muro e montagem das ferragens das cinta e pilares e também foi colocado a placa de obra. Tempo bom.

DATA : 27/03/2024

Continua a execução da alvenaria de pedra calcária e início da colocação das ferragens e formas dos pilares e da cinta inferior do muro. Tempo bom.

DATA : 28/03/2024

Durante todo dia foi executada a concretagem do cintamento inferior e pilares do muro. Tempo bom.

DATA : 01/04/2024

Foi executada a retirada das formas de madeira do concreto armado da cinta inferior e pilares e iniciada a execução da alvenaria de bloco cerâmico do muro. Tempo bom.

DATA : 02/04/2024

Continua a execução dos serviços do dia anterior. Tempo bom.

Engenheiro civil:

Fiscal da obra:



DIARIO DE OBRA

OBJETO:SERVIÇOS DE REFORNA DA ESCOLA LEONOR BARRETO
FRANCO - PIRAMBU-SERGIPE

CONTRATO Nº: 55/2024

SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES

DATA : 03/04/2024

Continua a execução da alvenaria de bloco cerâmico do muro e montagem da armação do cintamento superior e o chapisco de parede das alvenarias de bloco do muro. Tempo bom.

DATA : 04/04/2024

Após a execução de parte das alvenarias de bloco e chapisco de parede do muro foi iniciado a execução do reboco . Tempo nublado

DATA : 05/04/2024

Continua a execução dos serviços do dia anterior. Tempo bom.

DATA : 08/04/2024

Continua a execução dos serviços do muro e iniciou se a retirada dos gradis de ferro da fachada. Tempo bom.

Engenheiro civil:

Fiscal da obra:

Aracaju - SE. 08 de Abril de 2024

À
Prefeitura Municipal de Pirambu – SE.

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16, Centro.

Pirambu - Estado de Sergipe.

Prezado Senhor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, nossa **Fatura de serviços nº 01/2024**, referente a **Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco no município de Pirambu, Estado de Sergipe.** Conforme **Contrato nº 55/2024** ao mesmo tempo em que solicitamos de Vossa Senhoria se digne homologar.

BANCO: BANCO DO BRASIL
AG.: 8081-0
CONTA CORRENTE: 22757-9

Atenciosamente,



SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Ana Maria Santos
Sócia Administradora



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 -
Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Nota: 2024000

00000004

Código Verificação

EC7L-GGPQ



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

09/04/2024 17:19:25

Período de Competência

04/2024

Município de Prestação do

Serviço

Pirambu - SE

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte
(ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em
Pirambu

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Nome Fantasia

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES

CPF/CNPJ

50.907.330/0001-33

Inscrição Municipal

1440598

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

SECLTDA@GMAIL.COM

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 98852-6962

Endereço

Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, SALA B, Inácio Barbosa - CEP: 49040-830 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS

CPF/CNPJ

13.095.039/0001-81

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3276-1693

E-mail

sec.obraseurbanismo@gmail.com

Endereço

PC NOSSA SRA DE LOURDES, 16 - CENTRO - CEP: 49190-000 - Pirambu - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4213800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Encaminhamos a Vossa Senhoria, nossa Fatura de Serviços Nº01/2024, referente aos serviços de Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco no município de Pirambu, Estado de Sergipe. Conforme Contrato nº 55/2024

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

39.167,60

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

39.167,60

Aliquota (%)

2,5000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

979,19

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

38.188,41

Valor Total da Nota (R\$)

39.167,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 5.268,04 Federal e R\$ 1.958,38 Municipal. Fonte: IBPT [D8CAC2]

Visualizado em: 09/04/2024 17:19:25

Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

FATURA Nº. 01/2024

CONTRATO Nº 55/2024 – PREFEITURA DE PIRAMBU-SE.

OBRA: Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco Localizada na Sede do município de Pirambu, Estado de Sergipe.

01 – VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 39.167,60
Importa a presente fatura em (Trinta e nove mil cento e sessenta e sete reais e sessenta centavos).

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Ana Maria Santos
Sócia Administradora

ARACAJU (SE) 08 de abril de 2024

R E C I B O

R\$ 39.167,60

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pirambu – SE a importância de **R\$39.167,60 (Trinta e nove mil cento e sessenta e sete reais e sessenta centavos)**, referente à **Fatura de Serviços Nº. 01/2024**, correspondente a **Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco Localizada na Sede do município de Pirambu, Estado de Sergipe.** Conforme contrato nº 55/2024.

Aracaju SE. de de

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Ana Maria Santos
Sócia Administradora

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33

Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa

Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962

EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO										SIRIUS CONSTRUÇÕES	
OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.										BOLETIM Nº BM 01	
Local : PIRAMBU/SE.										PERÍODO: 18/03/2024 a 08/04/2024	
										CONTRATO 55/2024	
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$			%
				ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	
01	REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO										
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES										
01.01.001	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00		1,00	1,00	862,55	-	862,55	862,55	100,0%
01.01.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	11,80		11,80	11,80	28,36	-	334,65	334,65	100,0%
01.01.003	Pintura de meio fio (caliação)	m	144,90			0,00	4,61	-	-	667,99	0,0%
01.01.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af. 08/2022	m2	112,35			0,00	73,68	-	-	8.277,95	0,0%
01.01.005	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	144,90			0,00	40,98	-	1.197,20	1.197,20	7,4%
TOTAL DO ITEM 01.01											
01.02	ELEVAÇÕES										
01.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,52			0,00	56,45	-	-	255,15	0,0%
01.02.002	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	6,00			0,00	552,6	-	-	3.315,60	0,0%
01.02.003	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	m2	11,00			0,00	121,86	-	-	1.340,46	0,0%
01.02.004	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	67,80			0,00	48,87	-	-	3.313,39	0,0%
01.02.005	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	6,00			0,00	2.515,61	-	-	15.093,66	0,0%
01.02.006	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	135,60			0,00	7,41	-	-	1.004,80	0,0%
01.02.007	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	135,60			0,00	35,02	-	-	4.748,71	0,0%
01.02.008	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	1233,60			0,00	15,27	-	-	18.837,07	0,0%

[Handwritten signature]

BOLETIM DE MEDIÇÃO										CONTRATO		PERÍODO:		BOLETIM Nº		SIRIUS	
OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARREIRO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.										55/2024		18/03/2024 a 08/04/2024		BM 01		CONSTRUÇÕES	
Local : PIRAMBU/SE.																	
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$			%						
				ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL		CONTRATO					
01.02.009	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	1233,60			0,00	17,09	-	-	-	21.082,22	0,0%					
01.02.010	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01	m	22,60			0,00	37,76	-	-	-	853,38	0,0%					
01.02.011	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal	m3	213,360			0,00	4,65	-	-	-	992,12	0,0%					
01.02.012	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	213,360			0,00	29,41	-	-	-	6.274,92	0,0%					
01.02.013	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	120,860			0,00	60,59	-	-	-	7.322,91	0,0%					
01.02.014	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2	92,50			0,00	57,37	-	-	-	5.306,73	0,0%					
01.02.015	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	101,86			0,00	120,18	-	-	-	12.241,53	0,0%					
01.02.016	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabalaninha ou similar - Rev 02	m2	101,86			0,00	57,85	-	-	-	5.892,60	0,0%					
TOTAL DO ITEM 01.02								-	-	-	107.875,25	0,0%					
01.03	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS																
01.03.001	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	5,00			0,00	40,65	-	-	-	203,25	0,0%					
01.03.002	Revisão de ponto de água tipo 1	un	7,00			0,00	30,19	-	-	-	211,33	0,0%					
01.03.003	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 02	m	28,00			0,00	47,05	-	-	-	1.317,40	0,0%					
01.03.004	Tubo pvc rígido c/anel borraça, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	50,00			0,00	21,83	-	-	-	1.091,50	0,0%					
TOTAL DO ITEM 01.03								-	-	-	2.823,48	0,0%					
01.04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																
01.04.001	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	20,00			0,00	28,11	-	-	-	562,20	0,0%					
01.04.002	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	20,00			0,00	116,34	-	-	-	2.326,80	0,0%					
01.04.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	6,00			0,00	318,49	-	-	-	1.910,94	0,0%					

Handwritten signature and initials

BOLETIM DE MEDIÇÃO										SIRIUS CONSTRUÇÕES	
OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.										CONTRATO	BOLETIM Nº
Local : PIRAMBU/SE.										55/2024	BM 01
										PERÍODO:	
										18/03/2024	
										a	
										08/04/2024	
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$			%
				ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	
01.04.004	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	un	6,00			0,00	286,42	-	-	1.718,52	0,0%
01.04.005	de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	5,00			0,00	299,56	-	-	1.497,80	0,0%
01.04.006	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	20,00			0,00	104,00	-	-	2.080,00	0,0%
01.04.007	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	2,00			0,00	62,90	-	-	125,80	0,0%
01.04.008	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	3,00			0,00	67,41	-	-	202,23	0,0%
01.04.009	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3,00			0,00	294,18	-	-	882,54	0,0%
01.04.010	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	300,00			0,00	7,43	-	-	2.229,00	0,0%
01.04.011	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	300,00			0,00	9,13	-	-	2.739,00	0,0%
	TOTAL DO ITEM 01.04							-	-	16.274,83	
01.05	MURO										
	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m2	131,05		120,00	120,00	316,42	-	37.970,40	41.466,84	91,6%
01.05.001	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (seção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios	m²	65,60			0,00	421,88	-	-	27.675,33	0,0%
01.05.002	TOTAL DO ITEM 01.05							-	37.970,40	69.142,17	
01.06	ESQUADRIAS										
	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af. 12/2019	un	11,00			0,00	1.044,90	-	-	11.493,90	0,0%
01.06.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	46,20			0,00	22,34	-	-	1.032,11	0,0%
01.06.002	Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas	m2	9,20			0,00	368,59	-	-	3.391,03	0,0%
01.06.003	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo pantográfica, inclusive fechadura	m2	12,80			0,00	384,20	-	-	4.917,76	0,0%
01.06.004	TOTAL DO ITEM 01.06							-	-	20.834,80	0,0%

Página 3 de 4

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

BOLETIM DE MEDIÇÃO										SIRIUS CONSTRUÇÕES	
OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.										CONTRATO	BOLETIM Nº
Local : PIRAMBU/SE.										55/2024	BM 01
										PERÍODO:	
										18/03/2024	
										a	
										08/04/2024	
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$			%
				ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	
01.07	LOUÇAS E METAIS										
	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	4,000			0,00	813,70	-	-	3.254,80	0,0%
01.07.001	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	1,000			0,00	551,57	-	-	-	0,0%
01.07.002	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2,000			0,00	2.656,52	-	-	-	0,0%
01.07.003	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	2,000			0,00	1.155,70	-	-	2.311,40 ;	0,0%
01.07.004								-	-	5.566,20	0,0%
TOTAL DO ITEM 01.07											
01.08	DIVERSOS										
01.08.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,000			0,00	2.420,29	-	-	2.420,29	0,0%
	TOTAL DO ITEM 01.08							-	-	2.420,29	
ANOTAÇÕES:											
Atesto que os serviços acima foram executados.											
Pirambu-Sergipe, 11/04/2024											
											
SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA											
Ana Maria Santos											
Resp. Técnico - CREA 2708814672											

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2024




OBRA:: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LOCALIZAÇÃO	UNID	QUANT
01	REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01.001	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 Cálculo: 1,00 unid	unid	1,00
01.01.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento Cálculo: $43,70 \times 1,80 \times 0,15 = 11,80 \text{ m}^3$	m³	11,80
01.02	MURO		
01.02.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar. Cálculo: $48,00 \times 2,50 = 120,00 \text{ m}^2$	m²	120,00

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ana Maria Santos
Resp. Técnico - CREA 2708814672

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DA
ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

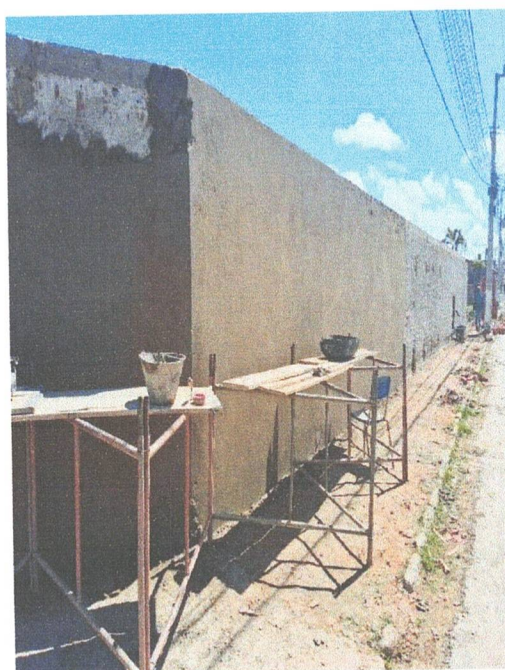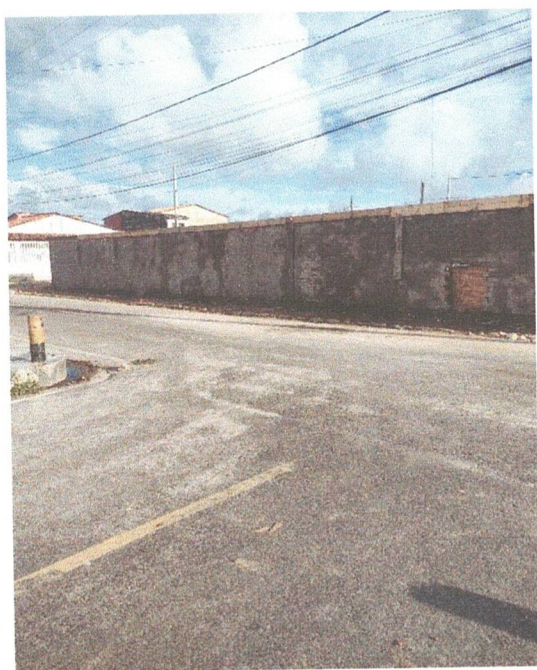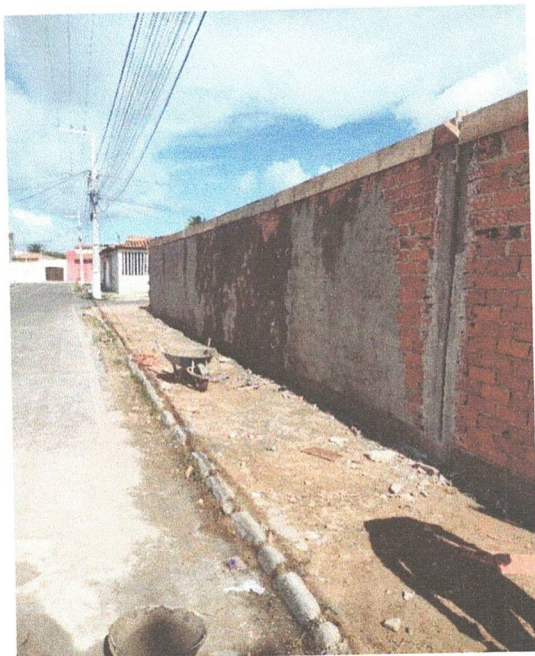

[Handwritten signature]



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DA
ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**



SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

[Handwritten signature]

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DA
ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

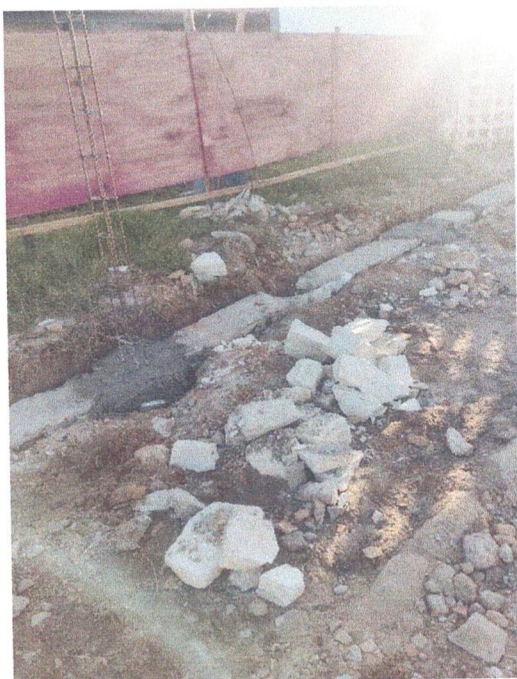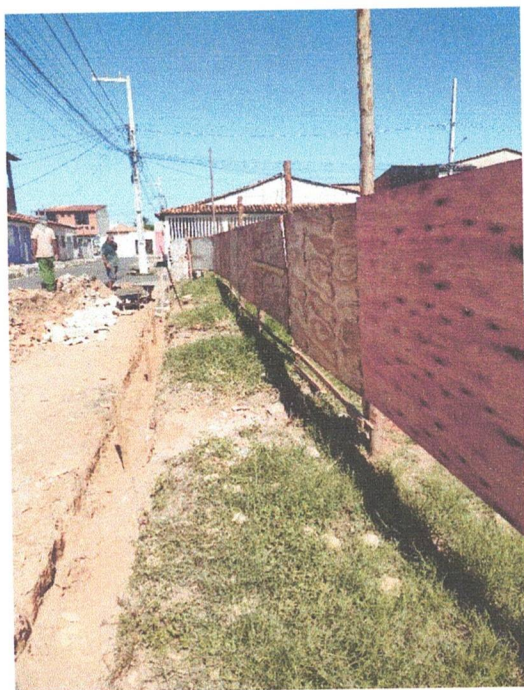

[Handwritten signature]

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DA
ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



DIARIO DE OBRA

OBJETO:SERVIÇOS DE REFORNA DA ESCOLA LEONOR BARRETO
FRANCO - PIRAMBU-SERGIPE

CONTRATO Nº: 55/2024

SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES

DATA : 18/03/2024

Os serviços da obra iniciou se com a mobilização de equipamentos e pessoal como também a locação do barracão. Tempo bom.

DATA : 19/03/2024

Os serviços de mobilização de equipamentos e pessoal teve continuidade, bem como execução do barracão de obra e também chegaram as madeiras para execução do tapume, cobertura do barracão e para formas de concreto. Tempo bom.

DATA : 20/03/2024

Segue a execução do barracão da obra e iniciou-se a demolição do muro existente com a colocação do tapume no perímetro demolido, como também chegaram os materiais agregados como: brita, areia lavada, pedra calcária e arenoso. Tempo bom.

DATA : 21/03/2024

Segue a execução do barracão da obra e iniciou a demolição do muro existente com a colocação do tapume no perímetro demolido. Tempo bom.

DATA : 22/03/2024

A execução do barracão da obra foi concluída e começou a demolição do muro existente com a colocação do tapume no perímetro demolido e início a execução do muro com a escavação manual para a alvenaria de pedra calcária. Chegou o aço para montagem das ferragens do cintamento inferior e pilares do muro. Tempo bom.

DATA : 25/03/2024

Continua a execução da base do muro com a alvenaria de pedra calcária e iniciou a demolição da calçada em concreto despolado existente na fachada da escola e montagem das armações dos pilares e cintamento inferior do muro. Tempo bom.

DATA : 26/03/2024

A demolição da calçada em concreto despolado existente na fachada da escola foi concluída. Continua a execução da alvenaria de pedra calcária do muro e montagem das ferragens das cinta e pilares e também foi colocado a placa de obra. Tempo bom.

DATA : 27/03/2024

Continua a execução da alvenaria de pedra calcária e início da colocação das ferragens e formas dos pilares e da cinta inferior do muro. Tempo bom.

DATA : 28/03/2024

Durante todo dia foi executada a concretagem do cintamento inferior e pilares do muro. Tempo bom.

DATA : 01/04/2024

Foi executada a retirada das formas de madeira do concreto armado da cinta inferior e pilares e iniciada a execução da alvenaria de bloco cerâmico do muro. Tempo bom.

DATA : 02/04/2024

Continua a execução dos serviços do dia anterior. Tempo bom.

Engenheiro civil:

Fiscal da obra:



DIARIO DE OBRA

OBJETO:SERVIÇOS DE REFORNA DA ESCOLA LEONOR BARRETO
FRANCO - PIRAMBU-SERGIPE

CONTRATO Nº: 55/2024

SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES

DATA : 03/04/2024

Continua a execução da alvenaria de bloco cerâmico do muro e montagem da armação do cintamento superior e o chapisco de parede das alvenarias de bloco do muro. Tempo bom.

DATA : 04/04/2024

Após a execução de parte das alvenarias de bloco e chapisco de parede do muro foi iniciado a execução do reboco . Tempo nublado

DATA : 05/04/2024

Continua a execução dos serviços do dia anterior. Tempo bom.

DATA : 08/04/2024

Continua a execução dos serviços do muro e iniciou se a retirada dos gradis de ferro da fachada. Tempo bom.

Engenheiro civil:

Fiscal da obra:



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra	Nome da obra	Data do cadastramento		
90.018.68401/71	SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	04/04/2024 17:36		
Origem do cadastramento				
e-CAC				
Tipo Zona	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Zona Urbana	SE20240373270			55/2024
Data do início da obra	CNAE			
18/03/2024	4399103 Obras de alvenaria			

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	18/03/2024

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	PIRAMBU	SE	49.190-000
Bairro	Logradouro	Número	
CENTRO	RUA GEMIRO DOS SANTOS	S/N	

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	50.907.330/0001-33	Construtora
Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade	
18/03/2024		

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
13.095.039/0001-81	MUNICIPIO DE PIRAMBU

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Comercial salas e lojas	Alvenaria	131,05 m²

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Reforma	Comercial salas e lojas	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	131,05 m²	0,00 m²	131,05 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra
131,05 m²



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

ORDEM DE SERVIÇO

**VIGÊNCIA:
13/03/2024**

CONTRATO: Nº _55/2024

OBJETO DO CONTRATO: Contrato de empreitada por preço global para
**REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO LOCALIZADA NA SEDE
DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU, SERGIPE "**

PRAZO DO CONTRATO: 12 meses

DATA DO CONTRATO: 13 de Março de 2024

RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


CONTRATADA: SIRIUS ENGENHARIA E

CONSTRUÇÕES LTDA

Tendo em vista o instrumento contratual acima descrito, celebrado com esta Prefeitura, fica Vossa Senhoria cientificado de que o prazo para início dos serviços objeto do contrato começará a partir de 18/03/2024.

Outrossim, informamos que foi designado pela Prefeitura Municipal de Pirambu, o engenheiro Manoel Messias Soares Neto, para fiscalização dos serviços.

Pirambu, 18 de Março de 2024



Prefeitura de Pirambu
Guilherme Jullius Zacarias de Melo
PREFEITO


CIENTE:



Documento assinado digitalmente
MANOEL MESSIAS SOARES NETO
Data: 18/03/2024 11:31:03-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Engº Fiscal: _____

Firma Contratada: _____





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240373270

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANA MARIA SANTOS

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: 2708814672

Registro: 0000001279SE

Empresa contratada: **SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro : 0000207977-SE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU -SERGIPE**

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

PRAÇA NOSSA SENHORA DE LURDES

Nº: 16

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PIRAMBU**

UF: **SE**

CEP: 49190000

Contrato: **55/2024**

Celebrado em: **13/03/2024**

Valor: **R\$ 246.882,77**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA GEMIRO DOS SANTOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PIRAMBU**

UF: **SE**

CEP: 49190000

Data de Início: **18/03/2024**

Previsão de término: **15/06/2024**

Coordenadas Geográficas: **-10.633969, -36.803492**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU -SERGIPE**

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

4. Atividade Técnica

16 - Execução

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

101,86

m2

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #TOS_1.1.6 - DE MURO

131,05

m2

5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRAMBU SERGIPE CONFORME CONTRATO n.º 55/2024

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SERGIPE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data

ANA MARIA SANTOS - CPF: 312.095.995-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU -SERGIPE - CNPJ:
13.095.039/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 262,55**

Registrada em: **01/04/2024**

Valor pago: **R\$ 262,55**

Nosso Número: **8203074143**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 99ZA3
 Impresso em: 07/04/2024 às 18:15:10 por: , ip: 189.70.218.124

www.crea-se.org.br

crea-se@crea-se.org.br

Tel: 3234-3000

Fax: XXXX-XXXX



CREA-SE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia de Sergipe





PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL

RESULTADO: NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Tipo de Pessoa: Jurídica

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Nome Fantasia: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

1. Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO



Certidão **2024.0055021** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **07/04/2024** e válida até **07/05/2024**.

Código de Autenticidade nº **9798.9847.0149.0236**.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Certidão n°: 4503342/2024

Expedição: 19/01/2024, às 05:34:52

Validade: 17/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 50.907.330/0001-33, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 05 de Março de 2024
Nº. 202400484225

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Contribuinte: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 03/06/2024 ✓

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: CH.0027.0018.BI.079C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 164704 / 2024

Inscrição Estadual: 271975350

Razão Social: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 50907330000133

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Endereço: RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS 229 , INACIO BARBOSA
ARACAJU CEP: 49040830

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **07/04/2024**, válida até **07/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 2024040752BHIQ

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE****Declaração de Recolhimento do ICMS N. 164705/2024**

Inscrição Estadual: 27.197.535-0
Razão Social: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 50.907.330/0001-33
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Endereço: RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS 229
INACIO BARBOSA - ARACAJU CEP: 49040830

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está regular com os recolhimentos do ICMS, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade da empresa aqui qualificada, após a emissão deste documento.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790, de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **07/04/2024 14:26:14**, é válida até **07/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 7 de Abril de 2024

Autenticação:20240407525X71

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 50.907.330/0001-33
Razão Social: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: R MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS 229 SALA B / INACIO BARBOSA /
ARACAJU / SE / 49040-830

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/04/2024 a 06/05/2024 ✓

Certificação Número: 2024040704290686205727

Informação obtida em 07/04/2024 14:38:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 50.907.330/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:32:22 do dia 19/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/07/2024.

Código de controle da certidão: **2D63.4F9E.3C98.3557**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
