



Emissão de comprovantes

G3352315347047061
23/08/2024 15:40:07

23/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:38:15
220602206 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME PIRAMBU-SE - FEB
AGENCIA: 2206-3 CONTA: 15.359-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2024
NR. DOCUMENTO	558.081.000.022.757
VALOR TOTAL	29.034,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIRIUS E C LTDA
AGENCIA: 8081-0 CONTA: 22.757-9
NR. DOCUMENTO 552.206.000.015.359
=====

NR.AUTENTICACAO	1.393.245.EE7.2CD.0DD
-----------------	-----------------------

PAGO

Transação efetuada com sucesso por: JH648495 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO.



G335231534704706008
23/08/2024 15:38:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SME PIRAMBU-SE - FEB
Agência	2206-3
Conta corrente	15359-1

Creditado

Nome	SIRIUS E C LTDA
Agência	8081-0
Conta corrente	22757-9
Valor	29.034,06
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JH648496 FABRICIO MUNIZ DOS SANTOS

23/08/2024 15:36:07

JH648495 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO

23/08/2024 15:38:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH648495 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO.



Entre contas correntes

G3382315286778581
23/08/2024 15:36:07

Debitado

Nome SME PIRAMBU-SE - FEB
Agência 2206-3
Conta corrente 15359-1

Creditado

Nome SIRIUS E C LTDA
Agência 8081-0
Conta corrente 22757-9
Valor 29.034,06
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 349550830.

Usuário: JH648496 FABRICIO MUNIZ DOS SANTOS.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

AGOSTO/2024

Data: 23/08/2024

Nota de Liquidação: 0823054

Fonte: 15420000 - Transferências do FUNDEB -
Complementação da União - VAAT

FORNECEDOR

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 50907330000133

Endereço: RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS, 229

Compl: SALA B

Bairro: INACIO BARBOSA

Cidade: Aracaju

UF: SE

E-mail: secitda@gmail.com

Telefone: (79)88526-9620

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
Subfunção: 365 Educação Infantil
Programa: 0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
Ação: 1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações
Subelemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo
Fonte: 15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Marcador: 15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Centro Custo:

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0730001	30/07/2024	107.897,10	32.659,23	75.237,87

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº 55/2024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO NA UNIDADE DE ENSINO LEONOR BARRETO FRANCO, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDACÃO

COMP. 08/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO NA UNIDADE DE ENSINO LEONOR BARRETO FRANCO, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2024.

Documento	Valor
Nota Fiscal (11 / Série: A / UF: SE / Emissão: 17/08/2024)	32.659,23

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	32.659,23
Retenção		Valor
21881010201-Inss		2.155,50
21881010403-Imposto de Renda - Outros rendimentos		489,80
21881010801-Iss		979,70

TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

Total Retido: 3.625,10
Total Liquido: 29.034,00



TERMO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 50.907.330/0001-33

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS

Compl: SALA B

Bairro: INACIO BARBOSA

Cidade: Aracaju

UF: SE

E-mail: seclda@gmail.com

Telefone: (79)88526-9620

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Conta:

EMPENHO	EMIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	FONTE
0730001	30/07/2024	1011.44905100-15420000	Global	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº 55/2024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO NA UNIDADE DE ENSINO LEONOR BARRETO FRANCO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2024.

Documentação	
Nota Fiscal	11
Valor	R\$ 32.659,23
Emissão	17/08/2024
Horário de Entrega	23/08/2024 13:31:52

Para acompanhar o andamento do seu processo na fila pública, acesse o link abaixo:

<http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pirambu/fornecedor/filapagamento>

Cadastrado por: Santiago Santos Gois



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 -
Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
17/08/2024 17:59:37

Período de Competência
08/2024

Município de Prestação do
Serviço
Pirambu - SE

Reg. Especial Tributação
**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte
(ME EPP)**

Exigibilidade do ISS
**Exigível em
Pirambu**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Nome Fantasia

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES

CPF/CNPJ

50.907.330/0001-33

Inscrição Municipal

1440598

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

SECLTDA@GMAIL.COM

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 98852-6962

Endereço

Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, SALA B, Inácio Barbosa - CEP: 49040-830 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PIRAMBU

CPF/CNPJ

13.095.039/0001-81

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3276-1693

E-mail

sec.obraseurbanismo@gmail.com

Endereço

AV CESAR VALDEMIRO BOMFIM ROCHA, 16 - Centro - CEP: 49190-000 - Pirambu - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços nº 02/2024 do 1º Termo do Aditivo referente a Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco no Município de Pirambu, Estado de Sergipe, CONFORME CONTRATO Nº: 55/2024.

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

2.155,51

IR (R\$)

489,89

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

32.659,23

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

32.659,23

Alíquota (%)

2,5000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

816,48

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

29.197,35

Valor Total da Nota (R\$)

32.659,23

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 4.392,67 Federal e R\$ 1.632,96 Municipal. Fonte: IBPT [B047CD]

Visualizado em: 17/08/2024 17:59:38

Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
CONTROLADORIA MUNICIPAL

CHECK LIST

PARA PAGAMENTO DE OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA

Processo nº: Vigência:
Empresa Contratada: *Serius Engenharia*
Contrato nº:
Resumo do objeto:

Fonte de Recurso:

Medição:

07/08 a 16/08

ITENS	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Nota Fiscal contendo Nº do empenho/Ano, Modalidade – Número/Ano da Licitação e Nº do Contrato/Ano.			<i>32.659,23</i>
Laudo de medição da obra, assinado pelo Engenheiro responsável.	<i>X</i>		
ORDEM DE SERVIÇOS	<i>X</i>		
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<i>X</i>		
RELATÓRIO DIÁRIO DA OBRA	<i>X</i>		<i>MAIS RECEBIDO</i>
CERTIDÃO DO CREA - PESSOA FÍSICA	<i>X</i>		
CERTIDÃO DO CREA - PESSOA JURÍDICA	<i>X</i>		
Cópia do comprovante de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART DE EXECUÇÃO	<i>X</i>		
Cópia do comprovante de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART DE FISCALIZAÇÃO	<i>X</i>		<i>RT</i>
Certidão de Regularidade do FGTS	<i>X</i>		
Certidão Negativa de Tributos Municipais	<i>X</i>		
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais e Dívida Ativa da União	<i>X</i>		
Certidão Negativa de Tributos Estaduais	<i>X</i>		
Certidão de Regularidade Trabalhista	<i>X</i>		
Extrato de Optante ou de Não Optante pelo Simples	<i>X</i>		
Cadastro Nacional de Obras - CNO	<i>X</i>		
Recolhimento do INSS relativo aos funcionários (Guia da Previdência Social – (GPS).	<i>X</i>		
Recolhimento do FGTS relativo aos funcionários (Guia de Recolhimento do FGTS – (GRF).	<i>X</i>		

VALOR DO CONTRATO	MEDIÇÃO	VALOR	SALDO

FATURA DO 1º TERMO DE ADITIVO Nº. 02/2024

CONTRATO Nº 55/2024 – PREFEITURA DE PIRAMBU-SE.

OBRA: Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco Localizada na Sede do município de Pirambu, Estado de Sergipe.

01 – VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 32.659,23
Importa a presente fatura em (Trinta e dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos).

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.


Ana Maria Santos
Resp. Técnico – CREA 2708814672

Aracaju (SE) 16 de agosto de 2024

R E C I B O

R\$ 32.659,23

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pirambu – SE a importância de **R\$32.659,23(trinta e dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos)**, referente à **Fatura de serviços nº 02/2024 do 1º termo de aditivo**, referente a **Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco no município de Pirambu, Estado de Sergipe**. Conforme **Contrato nº 55/2024**

Aracaju SE. de de

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.


Ana Maria Santos
Resp. Técnico – CREA 2708814672

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

FATURA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2024

BOLETIM Nº 02/2024

**SIRIUS ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕES**

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA
DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU,
ESTADO DE SERGIPE.**

Aracaju - SE. 16 de agosto de 2024

À
Prefeitura Municipal de Pirambu – SE.

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16, Centro.

Pirambu - Estado de Sergipe.

Prezado Senhor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, nossa **Fatura de serviços nº 02/2024 do 1º termo de aditivo**, referente a **Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco no município de Pirambu, Estado de Sergipe**. Conforme **Contrato nº 55/2024** ao mesmo tempo em que solicitamos de Vossa Senhoria se digne homologar.

BANCO: BANCO DO BRASIL
AG.: 8081-0
CONTA CORRENTE: 22757-9

Atenciosamente,


SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Ana Maria Santos
Sócia Administradora

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.

Local : PIRAMBU/SE.

CONTRATO
55/2024

PERÍODO:
07/08/2024
a
16/08/2024

BOLETIM Nº
BM 02

SIRIUS
ENGENHARIA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$				Medido %
				ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	
01	REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO											
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES											
01.01.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	6,88	6,88		6,88	28,36	195,12	-	195,12	195,12	100,0%
01.01.004	Execução de passelo (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022	m2	45,50		25,00	25,00	73,68	-	1.842,00	1.842,00	3.352,44	54,9%
01.01.001.006	Barração para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	20,10	20,10		20,10	248,67	4.998,27	-	4.998,27	4.998,27	100,0%
01.01.001.007	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	139,50	139,50		139,50	9,43	1.315,49	-	1.315,49	1.315,49	100,0%
01.01.001.008	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 (CALÇADA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO)	m²	205,11	205,11		205,11	24,16	4.955,46	-	4.955,46	4.955,46	100,0%
01.01.001.009	Demolição de concreto manualmente (CINTA DE CONCRETOS DOS MURO EXISTENTE)	m³	2,24	2,24		2,24	241,73	541,48	-	541,48	541,48	100,0%
01.01.001.010	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	94,00	94,00		94,00	9,28	872,32	-	872,32	872,32	100,0%
01.01.001.011	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m²	34,40	34,40		34,40	19,06	655,66	-	655,66	655,66	100,0%
01.01.001.012	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	197,20	197,20		197,20	4,11	810,49	-	810,49	810,49	100,0%
01.01.001.013	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	unid	2,00			0,00	386,10	-	-	-	772,20	0,0%
01.01.001.014	Lona plástica preta	m²	276,65		150,00	150,00	5,28	-	792,00	792,00	1.460,71	54,2%
01.01.001.015	Demolição de reboco	m2	86,40	86,40		86,40	8,18	706,75	-	706,75	706,75	100,0%
TOTAL DO ITEM 01.01								15.051,04	2.634,00	17.685,04	20.636,38	85,7%
01.02	ELEVAÇÕES											
01.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	29,12		29,12	29,12	56,45	-	1.643,82	1.643,82	1.643,82	100,0%
01.02.003	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão de tinta asfáltica tipo Neutrol da Veoquímica, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	m2	21,70		21,70	21,70	121,86	-	2.644,36	2.644,36	2.644,36	100,0%
01.02.004	Alvenaria bloco cerâmico vedação: 9x19x24cm, 1ª demão Argamassa f5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), 1ª demão Argamassa f5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), 1ª demão Argamassa f5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia)	m2	49,95			0,00	48,87	-	-	-	2.441,06	0,0%

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.

Local : PIRAMBU/SE.

CONTRATO

PERÍODO:
07/08/2024
a
16/08/2024

BOLETIM Nº

BM 02



ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$				Medido %
				ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	
02.02.001.027	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	KG	170,60		80,00	80,00	13,21	-	1.056,80	1.056,80	2.253,63	46,9%
02.02.001.028	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos	m²	49,28		49,28	49,28	82,13	-	4.047,37	4.047,37	4.047,37	100,0%
02.02.001.029	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	90,18			0,00	113,43	-	-	-	10.229,12	0,0%
02.02.001.030	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	9,29		4,80	4,80	614,77	-	2.950,90	2.950,90	5.711,21	51,7%
TOTAL DO ITEM 01.02												
01.07	LOUÇAS E METAIS											
	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	3,00			0,00	652,32	-	-	-	1.956,96	0,0%
01.01.007.005		un	4,00			0,00	67,01	-	-	-	268,04	0,0%
01.01.007.006	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	2,00			0,00	33,25	-	-	-	66,50	0,0%
01.01.007.007	Chuveiro plástico sem registro	un										
01.01.007.008	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	2,00			0,00	86,47	-	-	-	172,94	0,0%
TOTAL DO ITEM 01.07												
01.08	DIVERSOS											
01.01.008.002	Limpeza geral	m²	237,67			0,00	2,26	-	-	-	537,13	
TOTAL DO ITEM 01.08												
								15.051,86	32.659,23	47.711,09	122.948,96	38,81%

Alesto que os serviços acima foram executados.
Pirambu-Sergipe, _ _ / _ _ / 2024

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ana Maria Santos
RESP. TÉCNICA - CREA 27088145/2

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

ANOTAÇÕES:

Manoel Messias Soares Neto

Engenheiro Civil - R.N. nº 271797661-7

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.

CONTRATO
55/2024

PERÍODO:
07/08/2024
a
16/08/2024

BOLETIM Nº
BM 02



Local : PIRAMBU/SE.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$				Medido %
				ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	
01.02.006	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	196,62		100,00	100,00	7,41	-	741,00	741,00	1.456,95	50,9%
01.02.007	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	196,62		100,00	100,00	35,02	-	3.502,00	3.502,00	6.885,63	50,9%
01.02.013	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	52,88			0,00	60,59	-	-	-	3.204,00	0,0%
01.02.015	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	105,41			0,00	120,18	-	-	-	12.668,17	0,0%
01.02.016	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02	m2	105,41			0,00	57,85	-	-	-	6.097,97	0,0%
02.02.001.017	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m³	40,00		40,00	40,00	168,57	-	6.742,80	6.742,80	6.742,80	100,0%
02.02.001.018	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	146,11			0,00	34,84	-	-	-	5.090,47	0,0%
02.02.001.019	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	141,50			0,00	62,26	-	-	-	8.809,79	0,0%
02.02.001.020	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	58,30			0,00	128,63	-	-	-	7.499,13	0,0%
02.02.001.021	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JELI, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 02 (TUBO P/ÁGUA PLUVIAL)	m	16,00			0,00	47,05	-	-	-	752,80	0,0%
02.02.001.022	Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 horas por dia	h	96,00		96,00	96,00	6,15	-	590,40	590,40	590,40	100,0%
02.02.001.023	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. af_08/2022	m³	1,83		1,83	1,83	531,15	-	972,00	972,00	969,66	100,2%
02.02.001.024	Concreto magro para lastro, traço 1:4:5,4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m³	0,70		0,70	0,70	411,03	-	287,72	287,72	287,72	100,0%
02.02.001.025	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	m³	19,97		19,97	19,97	51,22	-	1.022,86	1.022,86	1.022,86	100,0%
02.02.001.026	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas estruturas de concreto, superestruturas e fundações	Kg	583,48		270,00	270,00	14,16	-	3.823,20	3.823,20	8.262,08	46,3%

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.907.330/0001-33
Razão Social: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
Endereço: R MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS 229 SALA B / INACIO BARBOSA / ARACAJU / SE / 49040-830

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/07/2024 a 28/08/2024 ✓

Certificação Número: 2024073020116105315439

Informação obtida em 06/08/2024 10:04:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 06 de Junho de 2024
Nº. 202400502851

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Contribuinte: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 04/09/2024 ✓

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: CF.0025.0059.FJ.081C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 50.907.330/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 00:42:08 do dia 21/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/11/2024. ✓

Código de controle da certidão: **CF72.90D1.80DB.E10E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 461036 / 2024

Inscrição Estadual: 27.197.535-0
Razão Social: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 50.907.330/0001-33
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Endereço: RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS SALAB 229
INACIO BARBOSA - ARACAJU CEP: 49040830

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **18/08/2024 às 07:58:02, válida até 17/09/2024** deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 18 de Agosto de 2024

Autenticação: 20240818M5QDLJ



Declaração de Recolhimento do ICMS N. 461038 / 2024

Identificação do Solicitante: 50.907.330/0001-33

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **50.907.330/0001-33** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **50.907.330/0001-33** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **18/08/2024 às 08:04:02, válida até 17/09/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 18 de Agosto de 2024

Autenticação: 20240818AXDQYX



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Certidão nº: 39819294/2024

Expedição: 07/06/2024, às 07:14:18

Validade: 04/12/2024 ✓ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 50.907.330/0001-33, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: **CÍVEL**

RESULTADO: **NEGATIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Tipo de Pessoa: Jurídica

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Nome Fantasia: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

1. Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0151046** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **18/08/2024** e válida até **17/09/2024**.

Código de Autenticidade nº **7467.0146.4278.6516**.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 471918/2024

Emissão: 07/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 20159

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Registro: 0000207977

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 50.000,00

Data do Capital: 01/06/2023

Faixa: 1

Objetivo Social Pleno: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA: AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, E DIVISÓRIAS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS.

Endereço Matriz: RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS, 229, SALA B, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU, SE, 49040830

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 26/06/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000020842DDSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANA MARIA SANTOS

Registro: 2708814672

CPF: 312.***-**-20

Data Início: 28/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE

Registro: 2702649815

CPF: 103.***-**-91





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 471918/2024

Emissão: 07/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 20159

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Data Inicio: 06/09/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGOS 7º e 25 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 470378/2024

Emissão: 11/02/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 5b2d7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: ANA MARIA SANTOS

Registro: 2708814672

CPF: 312.***-**-20

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 03/10/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Restrições: PORTOS E VIAS NAVEGAVEIS, POCOS, AEROPORTOS E FERROVIAS.

Instituição de Ensino: ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA PIO DECIMO

Data de Formação: 07/08/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000207977

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Data Início: 28/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANA MARIA SANTOS

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 2708814672

Registro: 0000001279SE

Empresa contratada: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000207977-SE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU -SERGIPE

PRAÇA NOSSA SENHORA DE LURDES

Complemento:

Cidade: PIRAMBU

Bairro: CENTRO

UF: SE

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

Nº: 16

CEP: 49190000

Contrato: 55/2024

Valor: R\$ 246.882,77

Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 13/03/2024

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA GEMIRO DOS SANTOS

Complemento:

Cidade: PIRAMBU

Data de Início: 18/03/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU -SERGIPE

Bairro: CENTRO

UF: SE

Previsão de término: 15/06/2024

Coordenadas Geográficas: -10.633969, -36.803492

Código: Não Especificado

Nº: S/N

CEP: 49190000

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

4. Atividade Técnica

16 - Execução

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #TOS_1.1.6 - DE MURO

Quantidade

101,86

Unidade

m2

131,05

m2

5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRAMBU
SERGIPE CONFORME CONTRATO n.º 55/2024

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SERGIPE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data

ANA MARIA SANTOS - CPF: 312.095.995-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU -SERGIPE - CNPJ:
13.095.039/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 262,55 Registrada em: 01/04/2024 Valor pago: R\$ 262,55 Nosso Número: 8203074143

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 99ZA3
Impresso em: 07/04/2024 às 18:15:10 por: , ip: 189.70.218.124





CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.018.68401/71	Nome da obra SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Data do cadastramento 04/04/2024 17:36
Origem do cadastramento e-CAC		
Tipo Zona Zona Urbana	ART SE20240373270	RRT CIB Cadastro Imobiliário 55/2024
Data do início da obra 18/03/2024	CNAE 4399103 Obras de alvenaria	

Situação da obra

Situação Ativa	Data 18/03/2024
-------------------	--------------------

Endereço

País BRASIL	Município PIRAMBU	UF SE	CEP 49.190-000
Bairro CENTRO	Logradouro RUA GEMIRO DOS SANTOS	Número S/N	

Responsável

Nome SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	CPF/CNPJ 50.907.330/0001-33	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 18/03/2024	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
13.095.039/0001-81	MUNICIPIO DE PIRAMBU

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Comercial salas e lojas	Alvenaria	131,05 m²

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Reforma	Comercial salas e lojas	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	131,05 m²	0,00 m²	131,05 m²

Área Resultante



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

ORDEM DE SERVIÇO

**VIGÊNCIA:
13/03/2024**

CONTRATO: N° _55/2024

OBJETO DO CONTRATO: Contrato de empreitada por preço global para
**REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO LOCALIZADA NA SEDE
DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU, SERGIPE "**

PRAZO DO CONTRATO: 12 meses

DATA DO CONTRATO: 13 de Março de 2024

RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


CONTRATADA: SIRIUS ENGENHARIA E

CONSTRUÇÕES LTDA

Tendo em vista o instrumento contratual acima descrito, celebrado com esta Prefeitura, fica Vossa Senhoria cientificado de que o prazo para início dos serviços objeto do contrato começará a partir de 18/03/2024.

Outrossim, informamos que foi designado pela Prefeitura Municipal de Pirambu, o engenheiro Manoel Messias Soares Neto, para fiscalização dos serviços.

Pirambu, 18 de Março de 2024



Prefeitura de Pirambu
Guilherme Jullius Zacarias de Melo
PREFEITO

CIENTE:



Documento assinado digitalmente


MANOEL MESSIAS SOARES NETO

Data: 18/03/2024 11:31:03-0300

Verifique em <https://validar.id.gov.br>

Engº Fiscal: _____

Firma Contratada: _____





MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2024 DO 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 55/2024

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO
MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LOCALIZAÇÃO	UNID	QUANT
02.02.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m Cálculo: $1,30 \times 1,60 \times 1,50 \times 8 \text{unid} = 24,96 \text{ m}^3$ $23,10 \times 0,30 \times 0,60 = 4,16 \text{ m}^3$ Total= 29,12 m³	m3	29,12
02.02.001.003	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm Cálculo: $28,95 \times 0,75 = 21,70 \text{ m}^2$ Total= 21,70 m²	m2	21,70
02.02.001.006	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 Cálculo: $20,00 \times 2,50 \times 2 = 100,00 \text{ m}^2$ Total=100,00 m²	m2	100,00
02.02.001.007	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm Cálculo: $20,00 \times 2,50 \times 2 = 100,00 \text{ m}^2$ Total=100,00 m²	m2	100,00
02.02.001.017	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água Cálculo: $16,35 \times 7,00 \times 0,20 = 22,89 \text{ m}^3$ $17,33 \times 3,95 \times 0,25 = 17,11 \text{ m}^3$ Total=40,00 m³	m³	40,00
02.02.001.022	Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 horas por dia Cálculo: 96,00 horas Total= 96,00 horas	h	96,00
02.02.001.023	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. af_08/2022 Cálculo: $0,80 \times 0,85 \times 0,34 \times 8 \text{unid} = 1,83 \text{ m}^3$ Total =1,83 m³	m³	1,83
02.02.001.024	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 Cálculo: $1,00 \times 1,25 \times 0,07 \times 8 \text{unid} = 0,70 \text{ m}^3$ Total= 0,70 m³	m³	0,70
02.02.001.025	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 Calculo : Escavação manual - (pedra argamassada +concreto magro+concreto das sapatas e arranque + alvenaria de pedra) $33,64 - (1,83+0,70+1,95+9,19=13,67\text{m}^3)$ Total=19,97 m³	m³	19,97
02.02.001.026	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 Cálculo: 270,00 kg Total=270,00 Kg	Kg	270,00

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Ana Maria Santos
RESP. Técnico - CREA 2708814572

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661



MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2024 DO 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 55/2024

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO
MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.




ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LOCALIZAÇÃO	UNID	QUANT
02.02.001.027	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 Cálculo: 80,00 kg Total=80,00 Kg	kg	80,0
02.02.001.028	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos Cálculo: 49,28 m ² Total=49,28 m ²	m ²	49,28
02.02.001.030	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado Cálculo: 4,80 m ³ Total= 4,80m ³	m ³	4,80

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Ana Maria Santos
Eng. Técnico - CREA 2708814672

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO DO ADITIVO
DA OBRA REFORMA DA ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

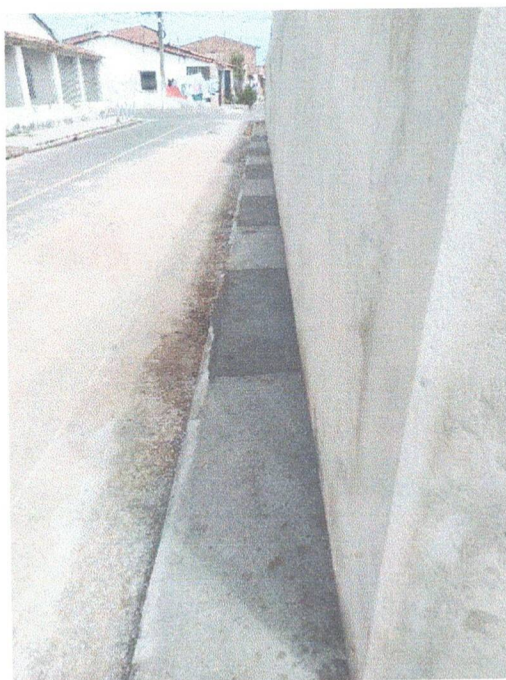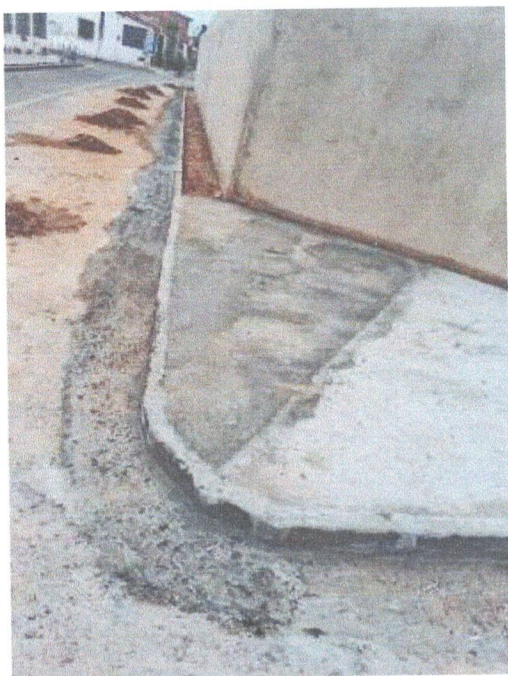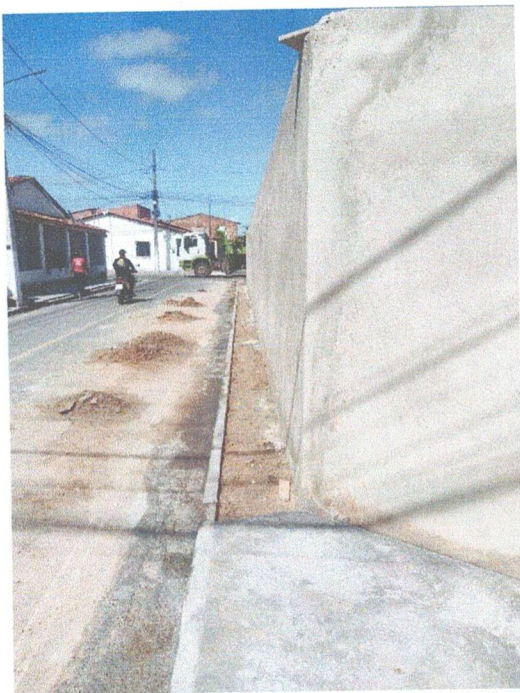



SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ana Maria Santos
Resp. Técnico - CREA 2708814672

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO DO ADITIVO
DA OBRA REFORMA DA ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**


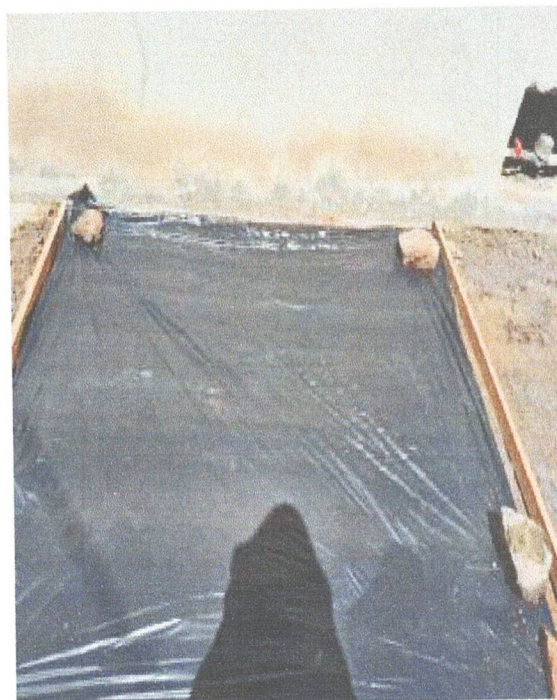
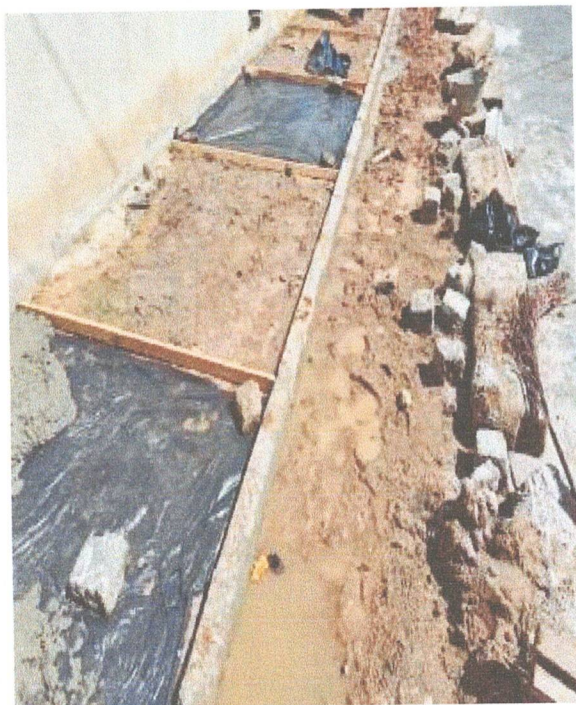


SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Ana Maria Santos
Resp. Técnico - CREA 2708814672

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO DO ADITIVO
DA OBRA REFORMA DA ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

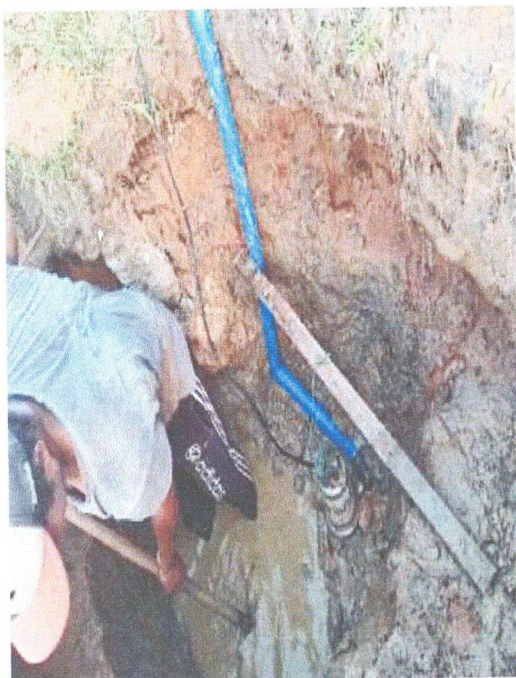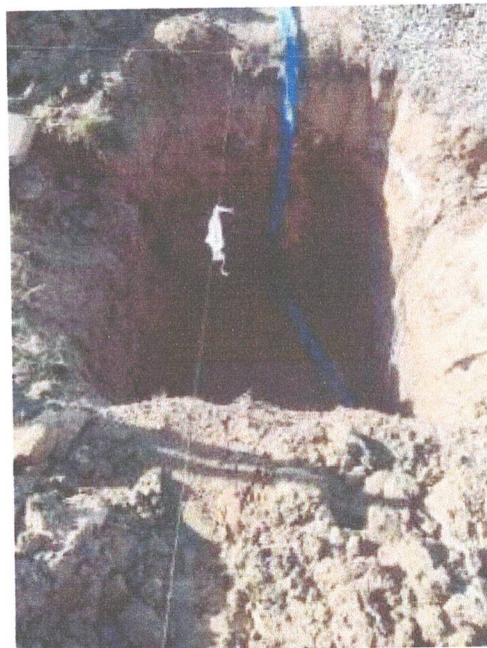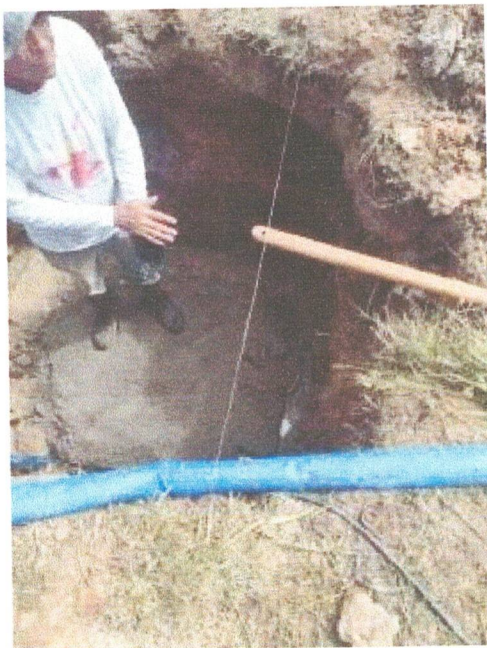

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com
Ana Maria Santos
Resp. Técnico – CREA 2708814672

Manoel Mesias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO DO ADITIVO
DA OBRA REFORMA DA ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

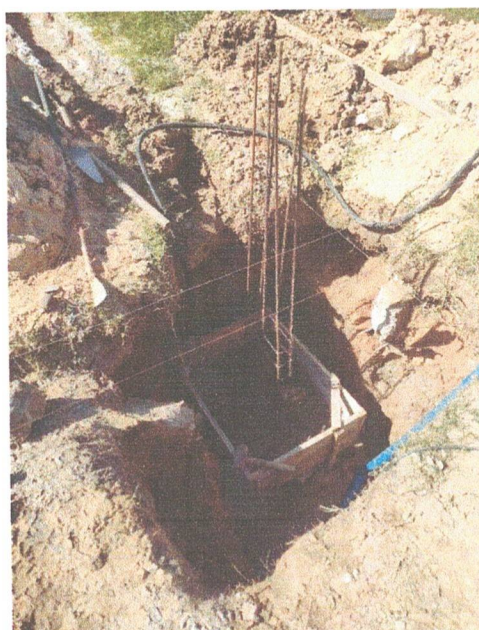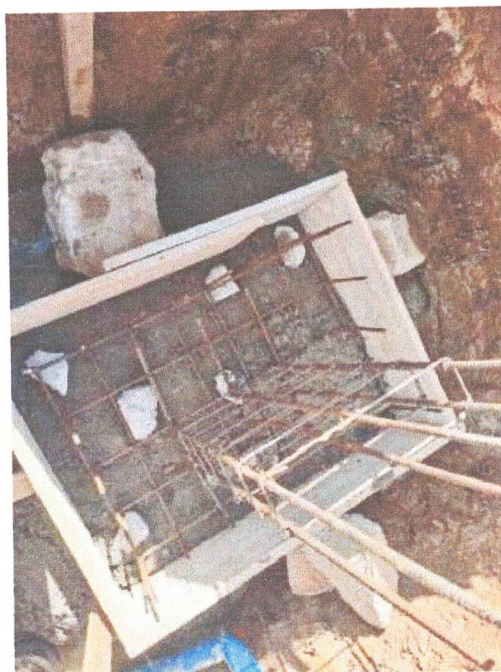


SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962

Ana Maria Santos
Resp. Técnico - CREA 2708814672

EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2


**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO DO ADITIVO
DA OBRA REFORMA DA ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

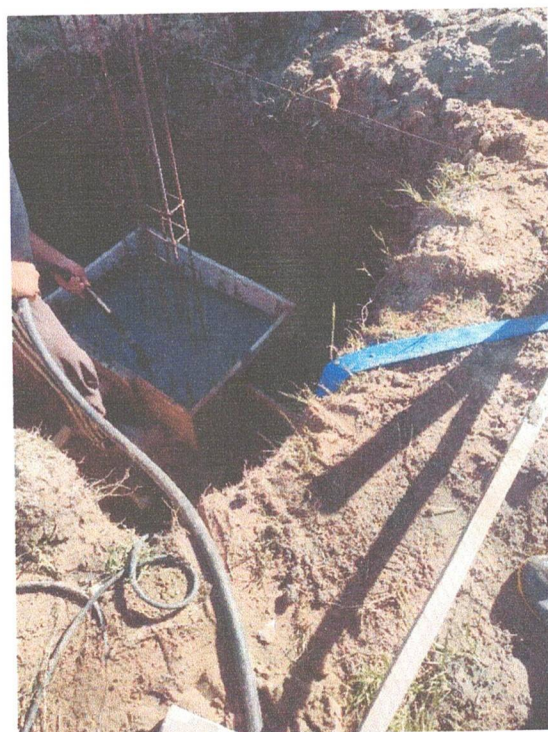

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com
Ana Maria Santos
Resp. Técnico - CREA 2708814672

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO DO ADITIVO
DA OBRA REFORMA DA ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

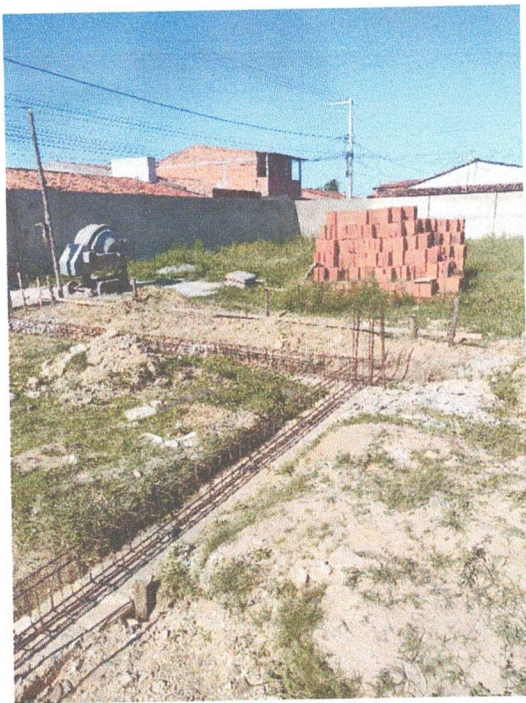

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com
Ana Maria Santos
Resp. Técnico - CREA 2708814672

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO DO
ADITIVO DA OBRA REFORMA DA ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU
SERGIPE**

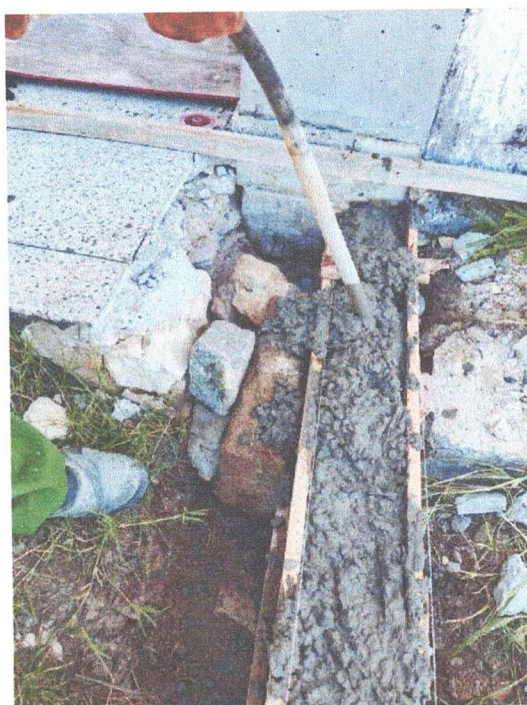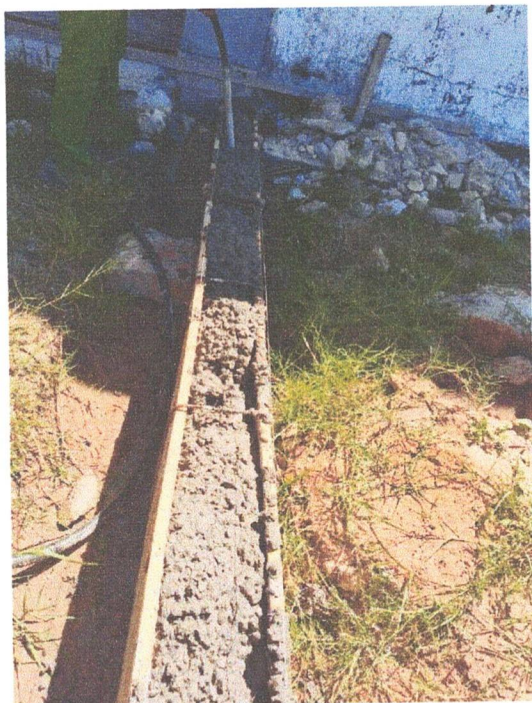


SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

Ana Maria Santos
Resp. Técnico - CREA 2708814672

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO DO
ADITIVO DA OBRA REFORMA DA ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU
SERGIPE**



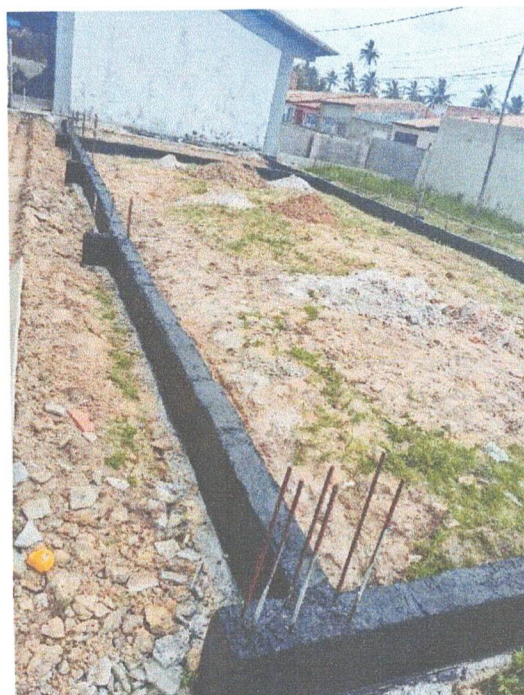


SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Ania Maria Santos
Resp. Técnico - CREA 2708814672



SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO DO
ADITIVO DA OBRA REFORMA DA ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU
SERGIPE**

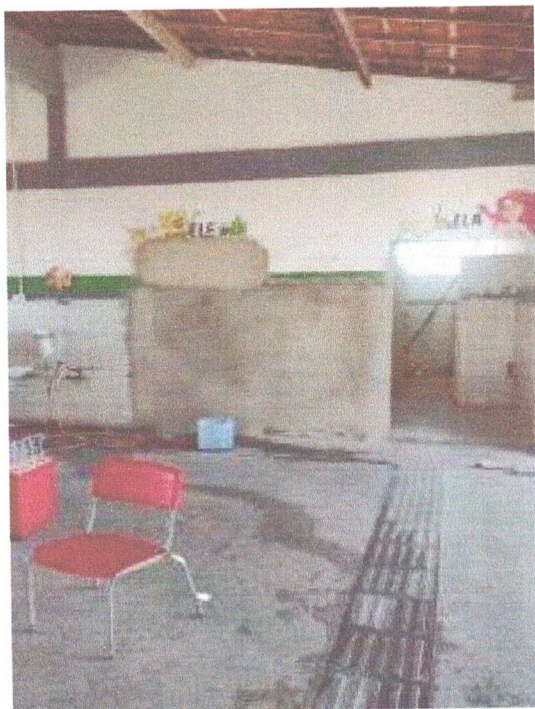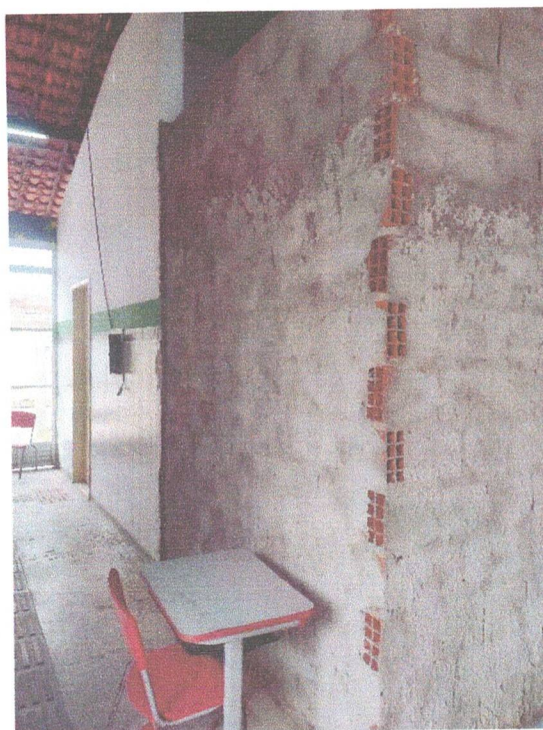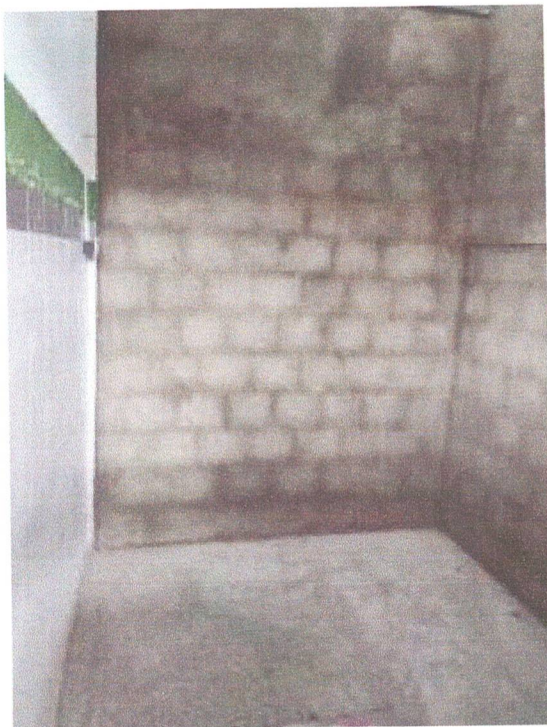

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO DO
ADITIVO DA OBRA REFORMA DA ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU
SERGIPE**

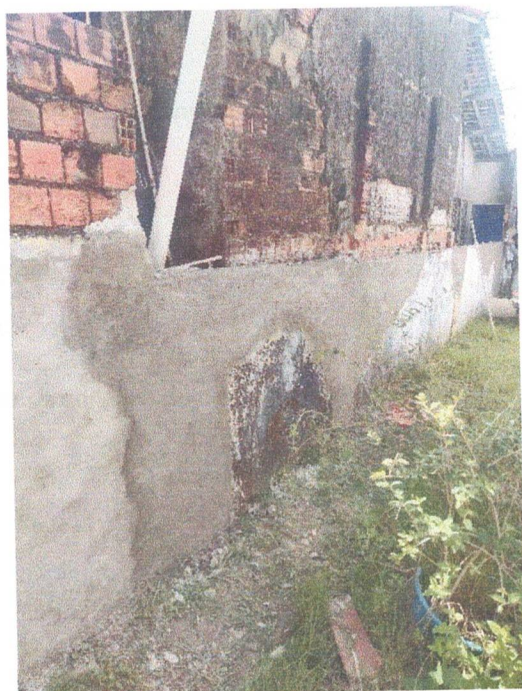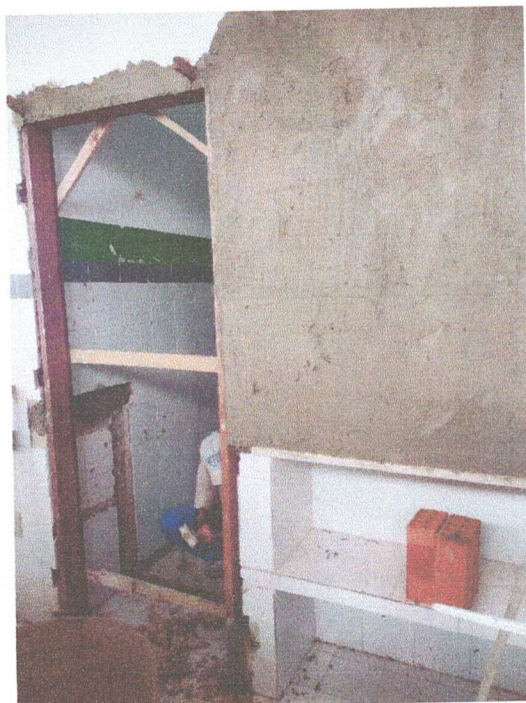

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
Ana Maria Santos
Resp. Técnico - CREA 2708814672 EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2



DIARIO DE OBRA

OBJETO:SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO
FRANCO - PIRAMBU-SERGIPE

1º TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 55/2024

DATA 07/08/2024

Iniciamos a execução dos serviços de fundação do prédio da área de lazer com a escavação manual para as sapatas, devido o lençol freático ser alto colocamos bomba para o esgotamento de água suja. Como também e o concreto desempolado de calçadas externas sendo usado lona plástica preta. Tem bom

DATA : 08/08/2024

Continua a execução dos serviços do dia anterior, sendo iniciado a execução da base de pedra e o concreto magro das sapatas e o concreto das calçadas foi concluído. Tempo bom.

DATA : 09/08/2024

Continua os serviços do dia anterior e o lançamento das armações de ferro e formas para concretagem das sapatas. Tempo bom

DATA : 12/08/2024

Os serviços do dia anterior foram concluídos e iniciamos a concretagem das sapatas, cintamento inferior e tronco de pilar. Tempo bom.

DATA : 13/08/2024

Foi concluído os serviços de concretagem e iniciamos a execução dos serviços de chapisco e reboco em diversas áreas da escola. Tempo bom.

DATA : 14/08/2024

Continua a execução dos serviços do dia anterior. Tempo bom.

DATA : 15/08/2024

Iniciamos os serviços de cobertura as áreas interna com a execução de pilares para sustentação e a impermeabilização de emulsão asfáltica das vigas baldrames. Tempo bom.

DATA : 16/08/2024

Foi concluído os serviços do dia anterior e iniciamos os serviços de estrutura do prédio da área de lazer. Tempo bom.

Engenheiro civil: **SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**
Ana Maria Santos
Resp. Técnico - CREA 27088146/2

Fiscal da obra:

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 50.907.330/0001-33

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/06/2023

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações



Voltar

Gerar PDF

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	50.907.330/0001-33
Nome	SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	26489949146 / eSocial 77857404/ Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 593,96	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 787,42	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.381,39	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANA MARIA SANTOS
CPF	312.095.995-20
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	06/08/2024 17:40:19
Nº do recibo de entrega	000005000024429295
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	50.907.330/0001-33

CPF/CNPJ do Empregador
50.907.330

Nome/Razão Social do Empregador
SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124080622099757-6

Tag
50907330 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

271,35

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	2	271,35	0,00	0,00	0,00	271,35
Total Geral:		271,35	0,00	0,00	0,00	271,35

Data de geração da Guia: 06/08/2024 às 16:46:26 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.58
8081008081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SIRIUS E C LTDA

AGENCIA: 8081-0 CONTA: 22.757-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240807212028545566900
CNPJ DO PAGADOR: 50.907.330/0001-33
VALOR: R\$271,35
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/08/2024 - 18:20:46
COD PRODUTO: 01a152a71b104b5aaac072378973d7c5
DEVEDOR: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-33

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/08/2024 - 18:20:47

DOCUMENTO: 080702

AUTENTICACAO SISBB: 0.163.A9F.1DB.8CC.C2D

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



DIARIO DE OBRA

OBJETO:SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO
FRANCO - PIRAMBU-SERGIPE

1º TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 55/2024

DATA 07/08/2024

Iniciamos a execução dos serviços de fundação do prédio da área de lazer com a escavação manual para as sapatas, devido o lençol freático ser alto colocamos bomba para o esgotamento de água suja. Como também e o concreto desempolado de calçadas externas sendo usado lona plástica preta. Tem bom

DATA : 08/08/2024

Continua a execução dos serviços do dia anterior, sendo iniciado a execução da base de pedra e o concreto magro das sapatas e o concreto das calçadas foi concluído. Tempo bom.

DATA : 09/08/2024

Continua os serviços do dia anterior e o lançamento das armações de ferro e formas para concretagem das sapatas. Tempo bom

DATA : 12/08/2024

Os serviços do dia anterior foram concluídos e iniciamos a concretagem das sapatas, cintamento inferior e tronco de pilar. Tempo bom.

DATA : 13/08/2024

Foi concluído os serviços de concretagem e iniciamos a execução dos serviços de chapisco e reboco em diversas áreas da escola. Tempo bom.

DATA : 14/08/2024

Continua a execução dos serviços do dia anterior. Tempo bom.

DATA : 15/08/2024

Iniciamos os serviços de cobertura as áreas interna com a execução de pilares para sustentação e a impermeabilização de emulsão asfáltica das vigas baldrame. Tempo bom.

DATA : 16/08/2024

Foi concluído os serviços do dia anterior e iniciamos os serviços de estrutura do prédio da área de lazer. Tempo bom.

Engenheiro civil:

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Ana Maria Santos

Eng. Técnico - CREA 2708814672

Fiscal da obra:

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2
