

G3380512273558831  
05/12/2024 12:37:52



## Emissão de comprovantes

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:36:49  
220602206 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME PIRAMBU-SE - FEB  
AGENCIA: 2206-3 CONTA: 15.359-1  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/12/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 558.081.000.022.757 |
| VALOR TOTAL           | 5.848,89            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIRIUS E C LTDA  
AGENCIA: 8081-0 CONTA: 22.757-9  
NR. DOCUMENTO 552.206.000.015.359  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.83A.2E0.AE4.E0A.A05 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JH648496 FABRICIO MUNIZ DOS SANTOS.

PAGO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME PIRAMBU-SE - FEB  
Agência 2206-3  
Conta corrente 15359-1

Creditado

Nome SIRIUS E C LTDA  
Agência 8081-0  
Conta corrente 22757-9  
Valor 5.848,89  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                             |                     |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH648495 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO | 05/12/2024 12:35:05 |
|              | JH648496 FABRICIO MUNIZ DOS SANTOS          | 05/12/2024 12:36:49 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH648496 FABRICIO MUNIZ DOS SANTOS.



Entre contas correntes

G3310512273554661  
05/12/2024 12:35:03

Debitado

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nome           | SME PIRAMBU-SE - FEB |
| Agência        | 2206-3               |
| Conta corrente | 15359-1              |

Creditado

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Nome           | SIRIUS E C LTDA |
| Agência        | 8081-0          |
| Conta corrente | 22757-9         |
| Valor          | 5.848,89        |
| Data           | Nesta data      |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 371242838.

Usuário: JH648495 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU  
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

DEZEMBRO/2024

Data: 05/12/2024

Nota de Liquidação: 1205001

FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 50.907.330/0001-33

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA  
Endereço: RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS, 229  
Bairro: INACIO BARBOSA  
E-mail: secltda@gmail.com

Compl: SALA B  
Cidade: Aracaju  
UF: SE  
Telefone: (79)88526-9620  
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Função: 12 Educação  
SubFunção: 365 Educação Infantil  
Programa: 0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE  
Ação: 1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações  
SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo  
Fonte: 15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT  
Marcador: 15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT  
Centro Custo:

| EMPENHO | EMIÇÃO     | SALDO ANTERIOR | VALOR    | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 0503004 | 03/05/2024 | 15.839,17      | 6.526,51 | 9.312,66    |

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 55/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO NA UNIDADE DE ENSINO LEONOR BARRETO FRANCO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2024 E CONTRATO 2024/55.

HISTÓRICO DA LIQUIDACÃO

NOTA FISCAL 0016/2024 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO NA UNIDADE DE ENSINO LEONOR BARRETO FRANCO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE.

Documento

Nota Fiscal ( 16 / Série: A / UF: SE / Emissão: 27/11/2024 )

Valor

6.526,51

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

| Conta Débito                                      | Conta Crédito                                   | Valor    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| 123210601 - Obras em Andamento                    | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 6.526,51 |
| Retenção                                          |                                                 | Valor    |
| 21881010201-Inss                                  |                                                 | 430,75   |
| 21881010403-Imposto de Renda - Outros rendimentos |                                                 | 97,90    |
| 21881010801-Iss                                   |                                                 | 626,33   |

SEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Total Retido:

1.154,98

Total Liquido:

5.371,53

Data: 05/12/2024

DECLARAÇÃO DE LIQUIDACÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

CARLAS ANDREA DOS SANTOS NUNES  
SOUZA

ENCARREGADO DE EMPENHO Mat.0001426





Nº Processo  
0001122

Nº Fila  
1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU



## TERMO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

### FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 50.907.330/0001-33

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS

Bairro: INACIO BARBOSA

E-mail: secltda@gmail.com

Compl: SALA B

Cidade: Aracaju

Telefone: (79)88526-9620

UF: SE

RG:

### DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Conta:

### EMPENHO

0503004

### EMIÇÃO

03/05/2024

### CLASSIFICAÇÃO

1011.44905100-15420000

### TIPO

Global

### FONTE

15420000 - Transferências do FUNDEB -  
Complementação da União - VAAT

### HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 55/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO NA UNIDADE DE ENSINO LEONOR BARRETO FRANCO, LOCALIZADA NA SEDE DESTES MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2024 E CONTRATO 2024/55.

### Documentação

Nota Fiscal 16  
Valor R\$ 6.526,51  
Emissão 27/11/2024  
Horário de Entrega 05/12/2024 09:23:37

Para acompanhar o andamento do seu processo na fila pública, acesse o link abaixo:

<http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pirambu/fornecedor/filapagamento>

Cauastrado por: Santiago Santos Gois

Secretaria de Controle Interno

☒ Aprovado  
☐ Reprovado

Obs. \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

27/11/2024 08:57:10

Período de Competência

11/2024

Município de Prestação do Serviço

Pirambu - SE

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Pirambu

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Nome Fantasia

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES

Email

SECLTDA@GMAIL.COM

CPF/CNPJ

50.907.330/0001-33

Inscrição Municipal

1440598

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 98852-6962

Endereço

RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS, 229, SALA B, Grageru - CEP: 49040-830 - Aracaju - SE

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PIRAMBU

CPF/CNPJ

13.095.039/0001-81

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3276-1693

E-mail

sec.obraseurbanismo@gmail.com

Endereço

AV CESAR VALDEMIR BOMFIM ROCHA, 16 - Centro - CEP: 49190-000 - Pirambu - SE

### SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Fatura de Serviços nº 08/2024, referente aos Serviços de Execução da Reforma da Escola Leonor Barreto Franco no Município de Pirambu, Estado de Sergipe, Conforme contrato nº: 55/2024.

Manoel Mendes Soares Neto  
Engenheiro Civil - nº 27.101.001-2

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

430,75

IR (R\$)

97,90

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

6.526,51

Deduções (R\$)

0,00 -

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

6.526,51

Alíquota (%)

5,0000

ISS (R\$)

\*\*\*\*\*

ISS Retido (R\$)

326,33 -

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

6.671,53

Valor Total da Nota (R\$)

6.526,51

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 877,82 Federal e R\$ 326,33 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]

Visualizado em: 27/11/2024 08:57:11

Para validação desta NFSe acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.



# **FATURA DO BOLETIM**

## **08/2024**

**CONTRATO Nº 55/2024**

**SIRIUS ENGENHARIA**  
**E**  
**CONSTRUÇÕES**

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA  
DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO  
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU,  
ESTADO DE SERGIPE.**

RECEBIDO  
28/11/24  
Kalia Silvana Cardoso dos Santos  
Secretária de Contratos Internos  
Decreto: 05/2021

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33  
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa  
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962  
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

Aracaju - SE. 26 de novembro de 2024

À  
Prefeitura Municipal de Pirambu – SE.

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16, Centro.

Pirambu - Estado de Sergipe.

Prezado Senhor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, nossa **Fatura de serviços nº 08/2024**, referente a **Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco no município de Pirambu, Estado de Sergipe**. Conforme **Contrato nº 55/2024** ao mesmo tempo em que solicitamos de Vossa Senhoria se digne homologar.

BANCO: BANCO DO BRASIL  
AG.: 8081-0  
CONTA CORRENTE: 22757-9

Atenciosamente,



**SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**  
Ana Maria Santos  
Sócia Administradora

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA      CNPJ: 50.907.330/0001-33  
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa  
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962  
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com




FATURA Nº. 08/2024

**CONTRATO Nº 55/2024 – PREFEITURA DE PIRAMBU-SE.**

**OBRA: Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco Localizada na Sede do município de Pirambu, Estado de Sergipe.**

**01 – VALOR DOS SERVIÇOS ..... R\$ 6.526,51**  
**Importa a presente fatura em (Seis mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos).**

  
SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
Sócia Administradora

**ARACAJU (SE) 26 de novembro de 2024**

## **R E C I B O**

**R\$ 6.526,51**

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pirambu – SE a importância de **R\$6.526,51(seis mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos)**, referente à Fatura de Serviços Nº. 08/2024, correspondente a Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco Localizada na Sede do município de Pirambu, Estado de Sergipe. Conforme contrato nº 55/2024.

**Aracaju SE. de de**

  
SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
Ana Maria Santos  
Sócia Administradora

**SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** CNPJ: 50.907.330/0001-33  
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa  
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962  
EMAIL: siriustrucoeseng@gmail.com

| BOLETIM DE MEDIÇÃO                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |    |                  |                    |        |                 |                |                    |          | CONTRATO        |           | PERÍODO:                |        | BOLETIM Nº |  | SIRIUS ENGENHARIA |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------|--------|-----------------|----------------|--------------------|----------|-----------------|-----------|-------------------------|--------|------------|--|-------------------|--|
| OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE. |                                                                                                                                                                        |    |                  |                    |        |                 |                |                    |          | 55/2024         |           | 11/07/2024 a 30/07/2024 |        | BM 08      |  |                   |  |
| Local : PIRAMBU/SE.                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |    |                  |                    |        |                 |                |                    |          |                 |           |                         |        |            |  |                   |  |
| ITEM                                                                                                                | DESCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                          | UN | QUANT CONTRATADA | QUANTIDADES        |        |                 | PREÇO UNITÁRIO | VALORES R\$        |          |                 | %         |                         |        |            |  |                   |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |    |                  | ACUMULADO ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADO ATUAL |                | ACUMULADO ANTERIOR | DO MÊS   | ACUMULADO ATUAL |           | CONTRATO                | Medido |            |  |                   |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |    |                  |                    |        |                 |                |                    |          |                 |           |                         |        |            |  |                   |  |
| 01                                                                                                                  | REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO                                                                                                                                |    |                  |                    |        |                 |                |                    |          |                 |           |                         |        |            |  |                   |  |
| 01.01                                                                                                               | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                  |    |                  |                    |        |                 |                |                    |          |                 |           |                         |        |            |  |                   |  |
|                                                                                                                     | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021                         | un | 1,00             | 1,00               |        | 1,00            | 862,55         | 862,55             | -        | 862,55          | 862,55    | 100,0%                  |        |            |  |                   |  |
| 01.01.001                                                                                                           | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento                                                                                                      | m3 | 11,80            | 11,80              |        | 11,80           | 28,36          | 334,65             | -        | 334,65          | 334,65    | 100,0%                  |        |            |  |                   |  |
| 01.01.002                                                                                                           |                                                                                                                                                                        | m  | 144,90           |                    | 144,90 | 144,90          | 4,61           | -                  | 667,99   | 667,99          | 667,99    | 100,0%                  |        |            |  |                   |  |
| 01.01.003                                                                                                           | Pintura de meio fio (caliação)                                                                                                                                         |    |                  |                    |        |                 |                |                    |          |                 |           |                         |        |            |  |                   |  |
|                                                                                                                     | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af. 08/2022                  | m2 | 112,35           | 112,35             |        | 112,35          | 73,68          | 8.277,95           | -        | 8.277,95        | 8.277,95  | 100,0%                  |        |            |  |                   |  |
| 01.01.004                                                                                                           | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3                  | m  | 144,90           | 144,90             |        | 144,90          | 40,98          | 5.938,00           | -        | 5.938,00        | 5.938,00  | 100,0%                  |        |            |  |                   |  |
| 01.01.005                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |    |                  |                    |        |                 |                | 15.413,15          | 667,99   | 16.081,14       | 16.081,14 | 100,0%                  |        |            |  |                   |  |
| TOTAL DO ITEM 01.01                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |    |                  |                    |        |                 |                |                    |          |                 |           |                         |        |            |  |                   |  |
| 01.02                                                                                                               | ELEVAÇÕES                                                                                                                                                              |    |                  |                    |        |                 |                |                    |          |                 |           |                         |        |            |  |                   |  |
| 01.02.001                                                                                                           | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                   | m3 | 4,52             | 4,52               |        | 4,52            | 56,45          | 255,15             | -        | 255,15          | 255,15    | 100,0%                  |        |            |  |                   |  |
| 01.02.002                                                                                                           | Alvenaria pedra calcêrea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte | m3 | 6,00             | 6,00               |        | 6,00            | 552,6          | 3.315,60           | -        | 3.315,60        | 3.315,60  | 100,0%                  |        |            |  |                   |  |
| 01.02.003                                                                                                           | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm            | m2 | 11,00            | 11,00              |        | 11,00           | 121,86         | 1.340,46           | -        | 1.340,46        | 1.340,46  | 100,0%                  |        |            |  |                   |  |
| 01.02.004                                                                                                           | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2,8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09                                                   | m2 | 67,80            | 67,80              |        | 67,80           | 48,87          | 3.313,39           | -        | 3.313,39        | 3.313,39  | 100,0%                  |        |            |  |                   |  |
| 01.02.005                                                                                                           | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                               | m3 | 6,00             | 6,00               |        | 6,00            | 2.515,61       | 15.093,66          | -        | 15.093,66       | 15.093,66 | 100,0%                  |        |            |  |                   |  |
| 01.02.006                                                                                                           | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                                   | m2 | 135,60           | 135,60             |        | 135,60          | 7,41           | 1.004,80           | -        | 1.004,80        | 1.004,80  | 100,0%                  |        |            |  |                   |  |
| 01.02.007                                                                                                           | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm                                                         | m2 | 135,60           | 135,60             |        | 135,60          | 35,02          | 4.748,71           | -        | 4.748,71        | 4.748,71  | 100,0%                  |        |            |  |                   |  |
| 01.02.008                                                                                                           | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03                                                     | m2 | 1233,60          | 1158,40            | 75,20  | 1.233,60        | 19,27          | 17.688,77          | 1.148,30 | 18.837,07       | 18.837,07 | 100,0%                  |        |            |  |                   |  |

Manoel Mendes Soares Neto

Página 1 de 4



| BOLETIM DE MEDIÇÃO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                               |                     |                       |           |                    |                   |                       |            |                    |        |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------|----------|--------|
| OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE. |                                                                                                                                                                                         |                               |                     |                       |           |                    |                   |                       |            |                    |        |          |        |
| Local : PIRAMBU/SE.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                               |                     |                       |           |                    |                   |                       |            |                    |        |          |        |
| CONTRATO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | PERÍODO:                      |                     | BOLETIM Nº            |           |                    |                   |                       |            |                    |        |          |        |
| 55/2024                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         | 11/07/2024<br>a<br>30/07/2024 |                     | BM 08                 |           |                    |                   |                       |            |                    |        |          |        |
| SIRIUS ENGENHARIA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                               |                     |                       |           |                    |                   |                       |            |                    |        |          |        |
| ITEM                                                                                                                | DESCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                           | UN                            | QUANT<br>CONTRATADA | QUANTIDADES           |           |                    | PREÇO<br>UNITÁRIO | VALORES R\$           |            |                    | %      |          |        |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                               |                     | ACUMULADO<br>ANTERIOR | DO<br>MÊS | ACUMULADO<br>ATUAL |                   | ACUMULADO<br>ANTERIOR | DO<br>MÊS  | ACUMULADO<br>ATUAL |        | CONTRATO | Medido |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                               |                     |                       |           |                    |                   |                       |            |                    |        |          |        |
| 01.02.009                                                                                                           | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1                                                                                                             | m2                            | 1233,60             | 1.160,00              | 73,60     | 17,09              | 19.824,40         | 1.257,82              | 21.082,22  | 21.082,22          | 100,0% |          |        |
|                                                                                                                     | Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01                                                                     | m                             | 22,60               | 22,60                 |           | 37,76              | 853,38            | -                     | 853,38     | 853,38             | 100,0% |          |        |
| 01.02.010                                                                                                           | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal                                                                                                     | m3                            | 213,36              | 213,360               |           | 4,65               | 992,12            | -                     | 992,12     | 992,12             | 100,0% |          |        |
| 01.02.011                                                                                                           | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm                                                                                                      | m2                            | 213,36              | 213,36                |           | 29,41              | 6.274,92          | -                     | 6.274,92   | 6.274,92           | 100,0% |          |        |
| 01.02.012                                                                                                           | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e encerramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado                                | m2                            | 120,86              | 120,860               |           | 60,59              | 7.322,91          | -                     | 7.322,91   | 7.322,91           | 100,0% |          |        |
| 01.02.013                                                                                                           | Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada | m2                            | 92,50               | 92,50                 |           | 57,37              | 5.306,73          | -                     | 5.306,73   | 5.306,73           | 100,0% |          |        |
| 01.02.014                                                                                                           | Madreimento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais                                                       | m2                            | 101,86              | 101,86                |           | 120,18             | 12.241,53         | -                     | 12.241,53  | 12.241,53          | 100,0% |          |        |
| 01.02.015                                                                                                           | Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, itabaianinha ou similar - Rev 02                                                                                     | m2                            | 101,86              | 101,86                |           | 57,85              | 5.892,60          | -                     | 5.892,60   | 5.892,60           | 100,0% |          |        |
| 01.02.016                                                                                                           | TOTAL DO ITEM 01.02                                                                                                                                                                     |                               |                     |                       |           |                    | 105.469,13        | 2.406,12              | 107.875,25 | 107.875,25         | 100,0% |          |        |
| 01.03                                                                                                               | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS                                                                                                                                                             |                               |                     |                       |           |                    |                   |                       |            |                    |        |          |        |
| 01.03.001                                                                                                           | Revisão de ponto de esgoto tipo 1                                                                                                                                                       | un                            | 5,00                | 5,00                  |           | 40,65              | 203,25            | -                     | 203,25     | 203,25             | 100,0% |          |        |
| 01.03.002                                                                                                           | Revisão de ponto de água tipo 1                                                                                                                                                         | un                            | 7,00                | 7,00                  |           | 30,19              | 211,33            | -                     | 211,33     | 211,33             | 100,0% |          |        |
| 01.03.003                                                                                                           | Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 02                                                                        | m                             | 28,00               | 28,00                 |           | 47,05              | 1.317,40          | -                     | 1.317,40   | 1.317,40           | 100,0% |          |        |
| 01.03.004                                                                                                           | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm                                                                                                               | m                             | 50,00               | 50,00                 |           | 21,83              | 1.091,50          | -                     | 1.091,50   | 1.091,50           | 100,0% |          |        |
| 01.03.004                                                                                                           | TOTAL DO ITEM 01.03                                                                                                                                                                     |                               |                     |                       |           |                    | 2.823,48          | -                     | 2.823,48   | 2.823,48           | 100,0% |          |        |
| 01.04                                                                                                               | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                   |                               |                     |                       |           |                    |                   |                       |            |                    |        |          |        |
| 01.04.001                                                                                                           | Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede                                                                                                                                       |                               |                     | 20,00                 |           | 28,11              | 562,20            | -                     | 562,20     | 562,20             | 100,0% |          |        |
| 01.04.002                                                                                                           | Revisão de ponto de tomada simples com reposição de tomada p/anel simples                                                                                                               |                               |                     | 20,00                 |           | 116,34             | 2.326,80          | -                     | 2.326,80   | 2.326,80           | 100,0% |          |        |
| 01.04.002                                                                                                           | da fiação                                                                                                                                                                               |                               |                     | 20,00                 |           | 116,34             | 2.326,80          | -                     | 2.326,80   | 2.326,80           | 100,0% |          |        |
| 01.04.003                                                                                                           | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"                                                                                                               | un                            | 6,00                | 6,00                  |           | 318,49             | 1.910,94          | -                     | 1.910,94   | 1.910,94           | 100,0% |          |        |
| 01.04.003                                                                                                           | TOTAL DO ITEM 01.04                                                                                                                                                                     |                               |                     |                       |           |                    |                   |                       |            |                    |        |          |        |

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

Ass: Técnico

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
ANIL MARIA SANTOS  
Ress. Técnico  
Ass. Técnico



| BOLETIM DE MEDIÇÃO                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |    |                   |                    |        |                 |                |                    |          | CONTRATO        |           | PERÍODO:                      |  | BOLETIM Nº |  | SIRIUS ENGENHARIA |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|--------------------|--------|-----------------|----------------|--------------------|----------|-----------------|-----------|-------------------------------|--|------------|--|-------------------|--|
| OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |    |                   |                    |        |                 |                |                    |          | 55/2024         |           | 11/07/2024<br>a<br>30/07/2024 |  | BM 08      |  |                   |  |
| Local : PIRAMBU/SE.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |    |                   |                    |        |                 |                |                    |          |                 |           |                               |  |            |  |                   |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                | UN | QUANT. CONTRATADA | QUANTIDADES        |        |                 | PREÇO UNITÁRIO | VALORES R\$        |          |                 | %         |                               |  |            |  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |    |                   | ACUMULADO ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADO ATUAL |                | ACUMULADO ANTERIOR | DO MÊS   | ACUMULADO ATUAL |           | CONTRATO                      |  |            |  |                   |  |
| 01.04.004                                                                                                                                                                                                                                        | Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"                                                  | un | 6,00              | 6,00               |        | 6,00            | 286,42         | 1.718,52           | -        | 1.718,52        | 1.718,52  | 100,0%                        |  |            |  |                   |  |
| 01.04.005                                                                                                                                                                                                                                        | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 5,00              | 5,00               |        | 5,00            | 299,56         | 1.497,80           | -        | 1.497,80        | 1.497,80  | 100,0%                        |  |            |  |                   |  |
| 01.04.006                                                                                                                                                                                                                                        | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01                                                                                            | un | 20,00             | 20,00              |        | 20,00           | 104,00         | 2.080,00           | -        | 2.080,00        | 2.080,00  | 100,0%                        |  |            |  |                   |  |
| 01.04.007                                                                                                                                                                                                                                        | Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)                                                                                 | un | 2,00              | 2,00               |        | 2,00            | 62,90          | 125,80             | -        | 125,80          | 125,80    | 100,0%                        |  |            |  |                   |  |
| 01.04.008                                                                                                                                                                                                                                        | Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B                                                                          | un | 3,00              | 3,00               |        | 3,00            | 67,41          | 202,23             | -        | 202,23          | 202,23    | 100,0%                        |  |            |  |                   |  |
| 01.04.009                                                                                                                                                                                                                                        | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores                               | un | 3,00              | 1,00               |        | 1,00            | 294,18         | 294,18             | -        | 294,18          | 882,54    | 33,3%                         |  |            |  |                   |  |
| 01.04.010                                                                                                                                                                                                                                        | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c                                                                                                  | m  | 300,00            | 300,00             |        | 300,00          | 7,43           | 2.229,00           | -        | 2.229,00        | 2.229,00  | 100,0%                        |  |            |  |                   |  |
| 01.04.011                                                                                                                                                                                                                                        | Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c                                                                                                  | m  | 300,00            | 300,00             |        | 300,00          | 9,13           | 2.739,00           | -        | 2.739,00        | 2.739,00  | 100,0%                        |  |            |  |                   |  |
| TOTAL DO ITEM 01.04                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |    |                   |                    |        |                 |                | 15.686,47          | -        | 15.686,47       | 16.274,83 | 100,0%                        |  |            |  |                   |  |
| 01.05                                                                                                                                                                                                                                            | MURO                                                                                                                                                         |    |                   |                    |        |                 |                |                    |          |                 |           |                               |  |            |  |                   |  |
| Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.                  |                                                                                                                                                              |    |                   |                    |        |                 |                |                    |          |                 |           |                               |  |            |  |                   |  |
| 01.05.001                                                                                                                                                                                                                                        | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (seção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios  | m2 | 131,05            | 131,05             |        | 131,05          | 316,42         | 41.466,84          | -        | 41.466,84       | 41.466,84 | 100,0%                        |  |            |  |                   |  |
| 01.05.002                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              | m² | 65,60             | 65,60              |        | 65,60           | 421,88         | 27.675,33          | -        | 27.675,33       | 27.675,33 | 100,0%                        |  |            |  |                   |  |
| TOTAL DO ITEM 01.05                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |    |                   |                    |        |                 |                | 69.142,17          | -        | 69.142,17       | 69.142,17 | 100,0%                        |  |            |  |                   |  |
| 01.06                                                                                                                                                                                                                                            | ESQUADRIAS                                                                                                                                                   |    |                   |                    |        |                 |                |                    |          |                 |           |                               |  |            |  |                   |  |
| Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 |                                                                                                                                                              |    |                   |                    |        |                 |                |                    |          |                 |           |                               |  |            |  |                   |  |
| 01.06.001                                                                                                                                                                                                                                        | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1                                                         | un | 11,00             | 11,00              |        | 11,00           | 1.044,90       | 11.493,90          | -        | 11.493,90       | 11.493,90 | 100,0%                        |  |            |  |                   |  |
| 01.06.002                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              | m2 | 46,20             | 46,20              |        | 46,20           | 22,34          | -                  | 1.032,11 | 1.032,11        | 1.032,11  | 100,0%                        |  |            |  |                   |  |
| 01.06.003                                                                                                                                                                                                                                        | Portão em tubo de aço galvanizado de 1" painéis escolares                                                                                                    | m2 | 9,20              | 9,20               |        | 9,20            | 368,59         | 3.391,03           | -        | 3.391,03        | 3.391,03  | 100,0%                        |  |            |  |                   |  |

Ana Maria Santos  
Resp. Técnico - CREA 2708814572



| BOLETIM DE MEDIÇÃO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |                       |           |                    |                   |                       |           | CONTRATO           | PERÍODO:                      | BOLETIM Nº | SIRIUS<br>ENGENHARIA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-------------------------------|------------|----------------------|
| OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE. |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |                       |           |                    |                   |                       |           | 55/2024            | 11/07/2024<br>a<br>30/07/2024 | BM 08      |                      |
| Local : PIRAMBU/SE.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |                       |           |                    |                   |                       |           |                    |                               |            |                      |
| ITEM                                                                                                                | DESCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                   | UN | QUANT<br>CONTRATADA | QUANTIDADES           |           |                    | PREÇO<br>UNITÁRIO | VALORES R\$           |           |                    | % Medido                      |            |                      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                     | ACUMULADO<br>ANTERIOR | DO<br>MÊS | ACUMULADO<br>ATUAL |                   | ACUMULADO<br>ANTERIOR | DO<br>MÊS | ACUMULADO<br>ATUAL | CONTRATO                      |            |                      |
| 01.06.004                                                                                                           | Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo pantográfica, inclusive fechadura                                                                                                                                                            | m2 | 12,80               |                       |           | 0,00               | 384,20            | -                     | 1.032,11  | 15.917,04          | 20.834,80                     | 4.917,76   | 0,0%                 |
| TOTAL DO ITEM 01.06                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |                       |           |                    |                   |                       |           |                    |                               |            |                      |
| 01.07                                                                                                               | LOUÇAS E METAIS                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |                       |           |                    |                   |                       |           |                    |                               |            |                      |
|                                                                                                                     | Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar. incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico              | un | 4,00                |                       |           | 0,00               | 813,70            | -                     | -         | -                  | 3.254,80                      | 0,0%       |                      |
| 01.07.001                                                                                                           | Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev.03 | un | 1,00                |                       |           | 0,00               | 551,57            | -                     | -         | -                  | 551,57                        | 0,0%       |                      |
| 01.07.002                                                                                                           | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada                   | un | 2,00                | 2,00                  |           | 2,00               | 2.656,52          | 5.313,04              | -         | 5.313,04           | 5.313,04                      | 100,0%     |                      |
| 01.07.003                                                                                                           | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.                                | un | 2,00                | 2,00                  |           | 2,00               | 1.155,70          | 2.311,40              | -         | 2.311,40           | 2.311,40                      | 100,0%     |                      |
| 01.07.004                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |                       |           |                    |                   | 7.624,44              | -         | 7.624,44           | 11.430,81                     | 66,7%      |                      |
| TOTAL DO ITEM 01.07                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |                       |           |                    |                   |                       |           |                    |                               |            |                      |
| 01.08                                                                                                               | DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                        |    |                     |                       |           |                    |                   |                       |           |                    |                               |            |                      |
| 01.08.001                                                                                                           | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m                                                                                                                                                                          | un | 1,00                | 1,00                  |           | 1,00               | 2.420,29          | -                     | 2.420,29  | 2.420,29           | 2.420,29                      | 100,0%     |                      |
| TOTAL DO ITEM 01.08                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |                       |           |                    |                   |                       |           |                    |                               |            |                      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |                       |           |                    |                   | 231.043,60            | 6.526,51  | 237.570,11         | 246.882,77                    | 96,23%     |                      |
| ANOTAÇÕES:                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |                       |           |                    |                   |                       |           |                    |                               |            |                      |
| Atesto que os serviços acima foram executados.<br>Pirambu-Sergipe, __/__/2024                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |                       |           |                    |                   |                       |           |                    |                               |            |                      |
| SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |                       |           |                    |                   |                       |           |                    |                               |            |                      |
| Ana Maria Santos<br>Resp. Técnico - CREA 2708814572                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |                       |           |                    |                   |                       |           |                    |                               |            |                      |
| SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |                       |           |                    |                   |                       |           |                    |                               |            |                      |
| Mauricio Mendes Soares Neto<br>Engenheiro Civil - CREA 11.411.911/2                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |                       |           |                    |                   |                       |           |                    |                               |            |                      |



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 50.907.330/0001-33

**Razão Social:** SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**Endereço:** R MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS 229 SALA B / INACIO BARBOSA / ARACAJU / SE / 49040-830

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 22/11/2024 a 21/12/2024

**Certificação Número:** 2024112205446105315413

Informação obtida em 24/11/2024 16:49:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Aracaju  
Secretaria Municipal da Fazenda

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 24 de Novembro de 2024  
Nº. 202400532268

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Contribuinte: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 22/02/2025

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: FE.0054.0033.DD.085C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA**  
**CNPJ: 50.907.330/0001-33**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:29:24 do dia 24/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/05/2025.

Código de controle da certidão: **519F.1323.98A1.878E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 637821 / 2024**

**Inscrição Estadual:** 27.197.535-0  
**Razão Social:** SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA  
**CNPJ:** 50.907.330/0001-33  
**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
**Atividade Econômica:** CONSTRUCAO DE EDIFICIOS  
**Endereço:** RUA - MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS - SALAB - 229  
INACIO BARBOSA - ARACAJU - CEP:49040830

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **26/11/2024 às 10:00:03, válida até 26/12/2024** deve ser conferida na Internet no endereço [www.sefaz.se.gov.br](http://www.sefaz.se.gov.br) pelo agente recebedor.

Aracaju, 26 de Novembro de 2024

**Autenticação: 20241126PDWDSC**





**Declaração de Recolhimento do ICMS N. 637871 / 2024**

**Identificação do Solicitante: 50.907.330/0001-33**


Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **50.907.330/0001-33** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **50.907.330/0001-33** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria N°.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **26/11/2024 às 10:14:43**, válida até **26/12/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 26 de Novembro de 2024

**Autenticação: 20241126LRGSUQ**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Certidão nº: 76166251/2024

Expedição: 02/11/2024, às 18:02:19

Validade: 01/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 50.907.330/0001-33, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





PODER JUDICIÁRIO  
DO ESTADO DE SERGIPE

## CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: **CRIMINAL**

RESULTADO: **NEGATIVA**

### IDENTIFICAÇÃO

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Tipo de Pessoa: Jurídica

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Nome Fantasia: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

### NADA CONSTA

OUTROSSIM, EM ATENDIMENTO AO ART. 7º, V, DA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEGUE LISTA DE FEITOS EM TRAMITAÇÃO QUE NÃO POSITIVAM ESTA CERTIDÃO JUDICIAL:

### NADA CONSTA

### OBSERVAÇÕES

1. Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. A pesquisa realizada abrange todos os processos criminais, inclusive aqueles dos Juizados Especiais Criminais e da Auditoria Militar.
7. A pesquisa realizada NÃO abrange os processos em que foram concedidas transação penal ou suspensão condicional da pena.
8. Esta certidão judicial substitui a Folha Corrida.

### PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0215775** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **24/11/2024** e válida até **24/12/2024**.

Código de Autenticidade nº **9530.8194.5264.0576**.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-SE**

**Nº 471918/2024**

**Emissão: 07/04/2024**

**Validade: 31/03/2025**

**Chave: 20159**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Registro: 0000207977

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 50.000,00

Data do Capital: 01/06/2023

Faixa: 1

Objetivo Social Pleno: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA: AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, E DIVISÓRIAS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS.

Endereço Matriz: RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS, 229, SALA B, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU, SE, 49040830

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 26/06/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000020842DDSE

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ANA MARIA SANTOS

Registro: 2708814672

CPF: 312.\*\*\*.\*\*\*-20

Data Início: 28/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE

Registro: 2702649815

CPF: 103.\*\*\*.\*\*\*-91





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-SE**

**Nº 471918/2024**  
**Emissão: 07/04/2024**  
**Validade: 31/03/2025**  
**Chave: 20159**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe**

Data Inicio: 06/09/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGOS 7º e 25 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-SE**

**Nº 470378/2024**

**Emissão: 11/02/2024**

**Validade: 31/03/2025**

**Chave: 5b2d7**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

**Interessado(a)**

Profissional: ANA MARIA SANTOS

Registro: 2708814672

CPF: 312.\*\*\*-\*\*-20

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 03/10/2011

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Restrições: PORTOS E VIAS NAVEGAVEIS, POCOS, AEROPORTOS E FERROVIAS.

Instituição de Ensino: ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA PIO DECIMO

Data de Formação: 07/08/2010

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000207977

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Data Início: 28/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANA MARIA SANTOS

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 2708814672

Registro: 0000001279SE

Empresa contratada: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro : 0000207977-SE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU -SERGIPE

PRAÇA NOSSA SENHORA DE LURDES

Complemento:

Cidade: PIRAMBU

Bairro: CENTRO

UF: SE

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

Nº: 16

CEP: 49190000

Contrato: 55/2024

Valor: R\$ 246.882,77

Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 13/03/2024

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA GEMIRO DOS SANTOS

Complemento:

Cidade: PIRAMBU

Data de Início: 18/03/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU -SERGIPE

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: SE

CEP: 49190000

Previsão de término: 15/06/2024

Coordenadas Geográficas: -10.633969, -36.803492

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

4. Atividade Técnica

16 - Execução

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE  
EDIFICAÇÃO > #TOS\_1.1.2.1 - DE ALVENARIA

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #TOS\_1.1.6 - DE MURO

Quantidade

Unidade

101,86

m2

131,05

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRAMBU  
SERGIPE CONFORME CONTRATO n.º 55/2024

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SERGIPE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

ANA MARIA SANTOS - CPF: 312.095.995-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU -SERGIPE - CNPJ:  
13.095.039/0001-81

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 262,55

Registrada em: 01/04/2024

Valor pago: R\$ 262,55

Nosso Número: 8203074143

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 99ZA3  
Impresso em: 07/04/2024 às 18:15:10 por: , ip: 189.70.218.124





# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

### Informações da obra

|                                                       |                                                             |                                                                            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de inscrição da obra</b><br>90.018.68401/71 | <b>Nome da obra</b><br>SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | <b>Data do cadastramento</b><br>04/04/2024 17:36                           |
| <b>Origem do cadastramento e-CAC</b>                  |                                                             |                                                                            |
| <b>Tipo Zona</b><br>Zona Urbana                       | <b>ART</b><br>SE20240373270                                 | <b>RRT</b><br><br><b>CIB</b><br><br><b>Cadastro Imobiliário</b><br>55/2024 |
| <b>Data do início da obra</b><br>18/03/2024           | <b>CNAE</b><br>4399103 Obras de alvenaria                   |                                                                            |

### Situação da obra

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>Situação</b><br>Ativa | <b>Data</b><br>18/03/2024 |
|--------------------------|---------------------------|

### Endereço

|                         |                                            |                      |                          |
|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Pais</b><br>BRASIL   | <b>Município</b><br>PIRAMBU                | <b>UF</b><br>SE      | <b>CEP</b><br>49.190-000 |
| <b>Bairro</b><br>CENTRO | <b>Logradouro</b><br>RUA GEMIRO DOS SANTOS | <b>Número</b><br>S/N |                          |

### Responsável

|                                                         |                                            |                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Nome</b><br>SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA     | <b>CPF/CNPJ</b><br>50.907.330/0001-33      | <b>Vínculo</b><br>Construtora |
| <b>Data de início da responsabilidade</b><br>18/03/2024 | <b>Data de término da responsabilidade</b> |                               |

### Contratantes

| CPF/CNPJ           | Nome                 |
|--------------------|----------------------|
| 13.095.039/0001-81 | MUNICIPIO DE PIRAMBU |

### Áreas Principais

| Categoria | Destinação              | Tipo de Obra | Área      |
|-----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Existente | Comercial salas e lojas | Alvenaria    | 131,05 m² |

### Áreas Complementares

| Categoria | Destinação              | Tipo de Obra | Tipo de Área                     | Área Coberta | Área Descoberta | Área Total |
|-----------|-------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|
| Reforma   | Comercial salas e lojas | Alvenaria    | Quadra Esportiva e Poliesportiva | 131,05 m²    | 0,00 m²         | 131,05 m²  |

### Área Resultante





**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**ORDEM DE SERVIÇO**

**VIGÊNCIA:**

**13/03/2024**

**CONTRATO: N°\_55/2024**

**OBJETO DO CONTRATO:** Contrato de empreitada por preço global para  
**REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO LOCALIZADA NA SEDE  
DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU, SERGIPE "**

**PRAZO DO CONTRATO:** 12 meses

**DATA DO CONTRATO:** 13 de Março de 2024

**RECURSOS:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**CONTRATADA:** SIRIUS ENGENHARIA E

**CONSTRUÇÕES LTDA**

Tendo em vista o instrumento contratual acima descrito, celebrado com esta Prefeitura, fica Vossa Senhoria cientificado de que o prazo para início dos serviços objeto do contrato começará a partir de 18/03/2024.

Outrossim, informamos que foi designado pela Prefeitura Municipal de Pirambu, o engenheiro Manoel Messias Soares Neto, para fiscalização dos serviços.

**Pirambu, 18 de Março de 2024**

  
\_\_\_\_\_  
Prefeitura de Pirambu  
Guilherme Jullius Zacarias de Melo  
**PREFEITO**


**CIENTE:**



Documento assinado digitalmente  
**MANOEL MESSIAS SOARES NETO**  
Data: 18/03/2024 11:31:03-0200  
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

**Eng° Fiscal:** \_\_\_\_\_

**Firma Contratada:** \_\_\_\_\_



OBRA:: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.


| ÍTEM      | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LOCALIZAÇÃO                                                                                                                                                                               | UNID           | QUANT  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 01        | REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO                                                                                                                                                                          |                |        |
| 01.01     | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                            |                |        |
| 01.01.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interior - cores convencionais - Rev 03<br>Cálculo:<br>144,90 m<br>Total = 144,90 m                                                     | m              | 144,90 |
| 01.02     | ELEVAÇÕES                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| 01.02.013 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interior - cores convencionais - Rev 03<br>Cálculo:<br>$30,08 \times 2,50 = 75,20 \text{ m}^2$<br>Total = 75,20 m <sup>2</sup>          | m2             | 75,20  |
| 01.02.014 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1<br>Cálculo:<br>$29,44 \times 2,50 = 73,60 \text{ m}^2$<br>Total = 73,60 m <sup>2</sup>                                               | m2             | 73,60  |
| 01.06     | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| 01.06.002 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1<br>Cálculo:<br>$0,80 \times 2,10 \times 2,50 \times 11 = 46,20 \text{ m}^2$<br>Total = 46,20 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 46,20  |
| 01.08     | DIVERSOS                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| 01.04.003 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m<br>Cálculo:<br>Total = 1,00 unid                                                                                                                          | un             | 1,00   |

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Ana Maria Santos  
Resp. Técnico - CREA 2708814672



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DA  
ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

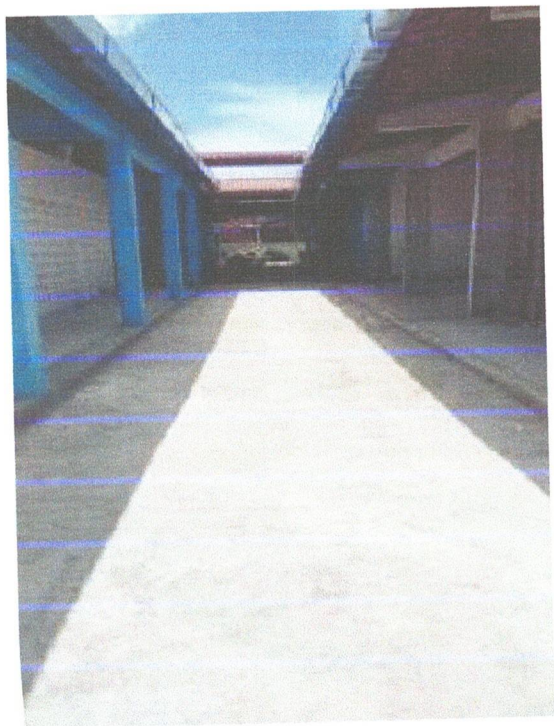


SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA      CNPJ: 50.907.330/0001-33  
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa  
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962  
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

Manoel Mesias Soares Neto  
Engenheiro Civil - CR 270881-2

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.  
Ana Maria Santos  
Resp. Técnico - CREA 2708814672



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DA  
ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

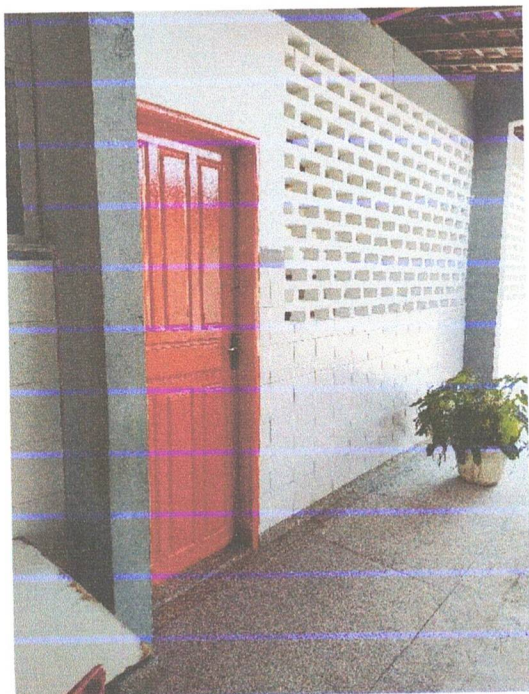

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33  
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa  
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962  
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com




Manoel Messias Soares Neto  
Engenheiro Civil - CR 171700-2

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ana Maria Santos  
Resp. Técnico - CREA 2708814672



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DA  
ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

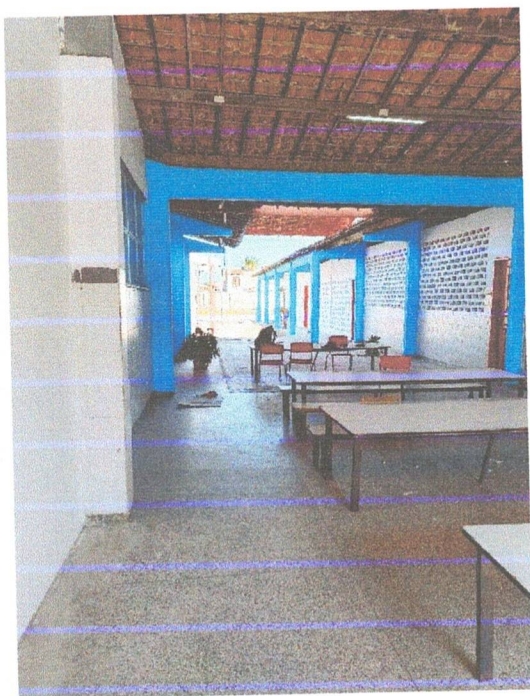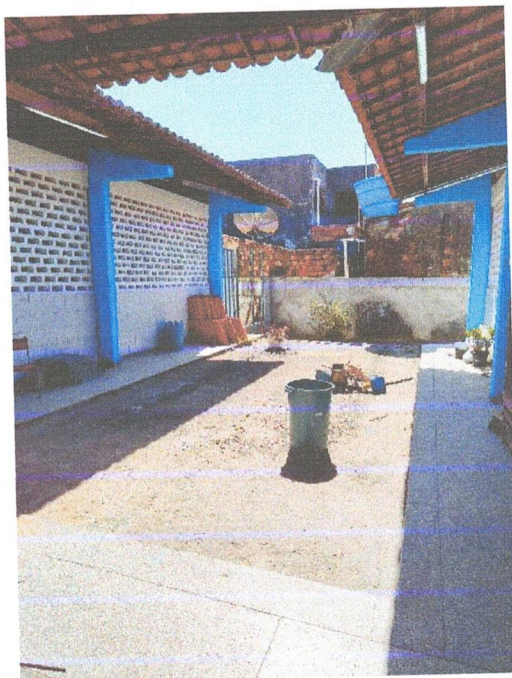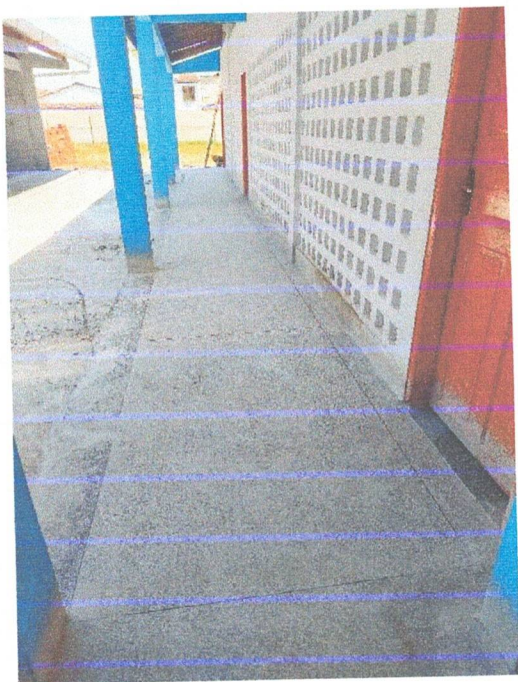

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33

Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa

Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962

EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com



Manoel Medeiros Costa Neto  
Engenheiro Civil - R. 27.070.001-2

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ana Maria Santos  
Resp. Técnico - CREA 2708814672



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DA  
ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

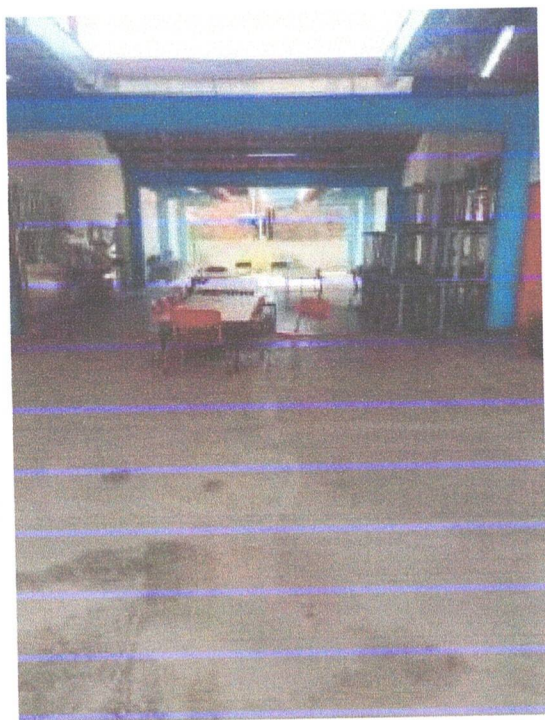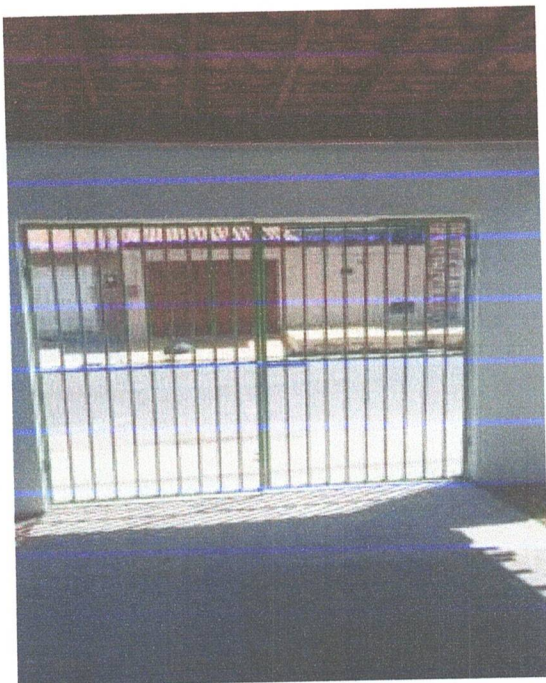

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33

Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa

Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962

EMAIL: siriustconstrucoeseng@gmail.com

Manoel Messias Soares Neto  
Engenheiro Civil - Matr. 27770/001-2

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
Ana Maria Santos  
Resp. Técnica - CREA 2708814572





## DIARIO DE OBRA

OBJETO:SERVIÇOS DE REFORNA DA ESCOLA LEONOR BARRETO  
FRANCO - PIRAMBU-SERGIPE

CONTRATO Nº: 55/2024

### SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES

DATA 11/07/2024

Continuamos a execução dos serviços de pintura de parede nas áreas interna e externa da escola. Tempo bom

DATA 12/07/2024

Seguimos a execução dos serviços do dia anterior. Tempo Bom

DATA 15/07/2024

Segue a execução dos serviços de pintura de parede nas áreas interna e externa da escola. Tempo bom.

DATA 16/07/2024

Segue a execução dos serviços do dia anterior. Tempo bom

DATA 17/07/2024

Segue a execução dos gradis metálicos na fachada da escola. Tempo bom

DATA 18/07/2024

Segue a execução dos serviços de pintura de parede nas áreas interna e externa da escola e iniciamos a pintura dos meios fios. Tempo bom

DATA 19/07/2024

Segue a execução dos serviços do dia anterior. Tempo bom

DATA 22/07/2024

Continua os serviços de pinturas internas e externa da escola e pintura do meio fio. Tempo bom

DATA 23/07/2024

Segue a execução dos serviços do dia anterior. Tempo bom

DATA 24/07/2024

Segue a execução dos serviços do dia anterior. Tempo bom

DATA 25/07/2024

Concluimos os serviços de pintura das paredes internas e externas da escola. Tempo bom

DATA 26/07/2024

Iniciamos a pintura das esquadrias de madeira e ferro da escola. Tempo bom

DATA 29/07/2024

Segue a execução dos serviços de pintura do dia anterior. Tempo bom

DATA 30/07/2024

Concluimos os serviços de pintura das esquadrias de madeira e ferro da escola Tempo bom

Engenheiro civil:

Ana Maria Santos  
Resp. Técnico CREA 2708814672

Fiscal da obra:

Manoel Messias Soares Neto  
Engenheiro Civil - nº 271111111-2

Data da consulta: 26/11/2024 10:44:51

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **50.907.330/0001-33**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/06/2023**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



CPF/CNPJ do Empregador  
50.907.330

Nome/Razão Social do Empregador  
SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124072920175665-0

Tag  
50907330 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até  
**29/07/2024**  
às 21:59:59 (Brasil)

Observações

Valor a recolher

**393,57**

### Composição do Documento

| Competência  | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total  |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|--------|
| 06/2024      | 3                           | 373,00      | 0,00            | 0,00                      | 20,57         | 393,57 |
| Total Geral: |                             | 373,00      | 0,00            | 0,00                      | 20,57         | 393,57 |

Data de geração da Guia: 29/07/2024 às 15:04:51 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| CNPJ/CPF                             | 50.907.330/0001-33                          |
| Nome                                 | SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA        |
| Período de apuração                  | 07/2024                                     |
| Declaração Retificadora              | Sim                                         |
| Identificação da apuração de débitos | 26489949146 / eSocial<br>77857404/ Reinf CP |

Totalização dos tributos apurados no período

| Tributos                                    | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|---------------------------------------------|------------------|---------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados       | R\$ 593,96       | R\$ 0,00      |
| Contribuição Previdenciária Patronal        | R\$ 787,42       | R\$ 0,00      |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| IRRF                                        | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| COFINS                                      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| PIS                                         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| CSRF                                        | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| COSIRF                                      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| TOTAL                                       | R\$ 1.381,39     | R\$ 0,00      |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

|          |                  |
|----------|------------------|
| Nome     | ANA MARIA SANTOS |
| CPF      | 312.095.995-20   |
| Telefone | -                |

Recibo de Entrega da DCTFWeb

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em  | 06/08/2024 17:40:19 |
| Nº do recibo de entrega                                       | 000005000024429295  |
| DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por | 50.907.330/0001-33  |





## Comprovante de transferência

29 JUL 2024 - 18:08:54

Valor

**R\$ 393,57**

Tipo de transferência

**Pix**

Destino

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00360305000104

Tipo de conta

Conta corrente

Origem

Nome

 Maria Santos

Conta

41101019-5

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

CPF

...095.995-...

Agência

0001

Informações adicionais

|                                                                |                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b><br>18ba6c383bdd42518b1446d1468405cf       | <b>TAG</b><br>50907330 06/2024 MENSAL                 |
| <b>Vencimento</b><br>29/07/2024                                | <b>Nome do recebedor</b><br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |
| <b>Expiração</b><br>29/07/2024 23:59:59                        | <b>CNPJ do recebedor</b><br>00360305000104            |
| <b>Valor original</b><br>R\$ 393,57                            | <b>Logradouro do recebedor</b><br>SBS QUADRA 4 LT 3/4 |
| <b>Nome do devedor</b><br>SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | <b>Cidade do recebedor</b><br>Brasília                |
| <b>CNPJ do devedor</b><br>50907330000133                       | <b>UF do recebedor</b><br>DF                          |
| <b>IDENTIFICADOR GFD</b><br>0124072920175685-0                 | <b>CEP do recebedor</b><br>70092900                   |

**Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento**  
**CNPJ 18.236.120/0001-58**

**ID da transação: E18236120202407292108s11d080f922**

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida  
Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU  
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

DEZEMBRO/2024

Data: 05/12/2024

Nota de Liquidação: 1205002

FORNECEDOR

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA CNPJ/CPF: 50.907.330/0001-33  
Endereço: RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS, 229 Compl: SALA B  
Bairro: INACIO BARBOSA Cidade: Aracaju UF: SE  
E-mail: secltda@gmail.com Telephone: (79)88526-9620 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Função: 12 Educação  
SubFunção: 365 Educação Infantil  
Programa: 0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE  
Ação: 1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações  
SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo  
Fonte: 15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT  
Marcador: 15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT  
Centro Custo:

| EMPENHO | EMIÇÃO     | SALDO ANTERIOR | VALOR  | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|--------|-------------|
| 0730001 | 30/07/2024 | 533,96         | 533,96 | 0,00        |

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº 55/2024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO NA UNIDADE DE ENSINO LEONOR BARRETO FRANCO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

NOTA FISCAL 0017/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO NA UNIDADE DE ENSINO LEONOR BARRETO FRANCO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE.

Documento

Nota Fiscal ( 17 / Série: A / UF: SE / Emissão: 27/11/2024 )

Valor

533,96

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

| Conta Débito                                      | Conta Crédito                                   | Valor  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| 123210601 - Obras em Andamento                    | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 533,96 |
| Retenção                                          |                                                 | Valor  |
| 21881010201-Inss                                  |                                                 | 35,24  |
| 21881010403-Imposto de Renda - Outros rendimentos |                                                 | 8,01   |
| 21881010801-Iss                                   |                                                 | 13,35  |

QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Total Retido:

56,60

Total Liquido:

477,36

Data: 05/12/2024

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

CARLAS ANDREA DOS SANTOS NUNES  
SOUZA

ENCARREGADO DE EMPENHO Mat.0001426





Nº Processo  
0001123

Nº Fila  
1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

TERMO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 50.907.330/0001-33

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS

Bairro: INACIO BARBOSA

E-mail: secltda@gmail.com

Compl: SALA B

Cidade: Aracaju

Telefone: (79)88526-9620

UF: SE

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Conta:

| EMPENHO | EMIÇÃO     | CLASSIFICAÇÃO          | TIPO   | FONTE                                                                |
|---------|------------|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 0730001 | 30/07/2024 | 1011.44905100-15420000 | Global | 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº 55/2024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO NA UNIDADE DE ENSINO LEONOR BARRETO FRANCO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2024.

Documentação

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Nota Fiscal        | 17                  |
| Valor              | R\$ 533,96          |
| Emissão            | 27/11/2024          |
| Horário de Entrega | 05/12/2024 09:34:37 |

Para acompanhar o andamento do seu processo na fila pública, acesse o link abaixo:

<http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pirambu/fornecedor/filapagamento>

Cadastrado por: Santiago Santos Gois

Secretaria de Controle Interno

- ☒ Aprovado
- ☐ Reprovado

Obs. \_\_\_\_\_





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ  
Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 -  
Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)  
27/11/2024 09:05:43

Período de Competência  
11/2024  
Município de Prestação do  
Serviço  
Pirambu - SE

Reg. Especial Tributação  
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte  
(ME EPP)

Exigibilidade do ISS  
Exigível em  
Pirambu



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Nome Fantasia

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES

CPF/CNPJ

50.907.330/0001-33

Inscrição Municipal

1440598

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

SECLTDA@GMAIL.COM

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 98852-6962

Endereço

RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS, 229, SALA B, Grageru - CEP: 49040-830 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PIRAMBU

PF/CNPJ

13.095.039/0001-81

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3276-1693

E-mail

sec.obraseurbanismo@gmail.com

Endereço

AV CESAR VALDEMIR BOMFIM ROCHA, 16 - Centro - CEP: 49190-000 - Pirambu - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Fatura de Serviços nº 05/2024, do 1º Termo do Aditivo referente a Execução dos Serviços da Reforma da Escola Leonor Barreto Franco no Município de Pirambu, Estado de Sergipe, Conforme contrato nº: 55/2024.

Manoel Messias Soares Neto  
Engenheiro Civil

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)  
0,00

COFINS (R\$)  
0,00

INSS (R\$)  
35,24

IR (R\$)  
8,01

CSLL (R\$)  
0,00

Outras Retenções (R\$)  
0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)  
533,96

Deduções (R\$)  
0,00

Desconto Incondicionado (R\$)  
0,00

Base de Cálculo (R\$)  
533,96

Alíquota (%)  
2,5000

ISS (R\$)  
\*\*\*\*\*

ISS Retido (R\$)  
13,35

Desconto Condicionado (R\$)  
0,00

Valor Líquido (R\$)  
477,36

Valor Total da Nota (R\$)  
533,96

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.  
Optante do Simples Nacional.  
Trib. aprox. R\$ 71,82 Federal e R\$ 26,70 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]

Visualizado em: 27/11/2024 09:05:44  
Para validação desta NFSe acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>  
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

# **FATURA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2024**

## **BOLETIM Nº 05/2024**

**SIRIUS ENGENHARIA  
E  
CONSTRUÇÕES**

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA  
DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO  
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU,  
ESTADO DE SERGIPE.**



Aracaju - SE. 26 de novembro de 2024

À  
Prefeitura Municipal de Pirambu – SE.

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16, Centro.


Pirambu - Estado de Sergipe.

Prezado Senhor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, nossa **Fatura de serviços nº 05/2024 do 1º termo de aditivo**, referente a **Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco no município de Pirambu, Estado de Sergipe**. Conforme **Contrato nº 55/2024** ao mesmo tempo em que solicitamos de Vossa Senhoria se digne homologar.

BANCO: BANCO DO BRASIL  
AG.: 8081-0  
CONTA CORRENTE: 22757-9

Atenciosamente,



**SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**  
Ana Maria Santos  
Sócia Administradora

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA      CNPJ: 50.907.330/0001-33  
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa  
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962  
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

**FATURA DO 1º TERMO DE ADITIVO Nº. 05/2024**

**CONTRATO Nº 55/2024 – PREFEITURA DE PIRAMBU-SE.**

**OBRA: Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco Localizada na Sede do município de Pirambu, Estado de Sergipe.**

**01 – VALOR DOS SERVIÇOS ..... R\$ 533,96**  
Importa a presente fatura em (quinhentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos).

**SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

**Aracaju (SE) 26.de novembro de 2024**

*Ana Maria Santos*  
Sócia Administradora

## **R E C I B O**

**R\$ 533,96**

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pirambu – SE a importância de **R\$ 533,96 (quinhentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos)**, referente à **Fatura de serviços nº 05/2024 do 1º termo de aditivo**, referente a **Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco no município de Pirambu, Estado de Sergipe. Conforme Contrato nº 55/2024**

**Aracaju SE.**

**de**

**de**

**SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

*Ana Maria Santos*  
Sócia Administradora

**SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** CNPJ: 50.907.330/0001-33

Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa

Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962

EMAIL: siriustconstrucoeseng@gmail.com



BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.

Local : PIRAMBU/SE.

CONTRATO  
55/2024

PERÍODO:  
14/09/2024  
a  
17/09/2024

BOLETIM Nº  
BM 05



| ITEM                | DESCRIMINAÇÃO                                                                                                                                               | UN   | QUANT. CONTRATADA | QUANTIDADES        |        |                 | PREÇO UNITÁRIO | VALORES R\$        |        |                 | %      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|--------|-----------------|----------------|--------------------|--------|-----------------|--------|
|                     |                                                                                                                                                             |      |                   | ACUMULADO ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADO ATUAL |                | ACUMULADO ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADO ATUAL |        |
|                     |                                                                                                                                                             |      |                   |                    |        |                 |                |                    |        |                 |        |
| 01                  | REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO                                                                                                                     |      |                   |                    |        |                 |                |                    |        |                 |        |
| 01.01               | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                       |      |                   |                    |        |                 |                |                    |        |                 |        |
| 01.01.002           | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento                                                                                           | m3   | 6,88              | 6,88               |        | 6,88            | 28,36          | 195,12             | -      | 195,12          | 100,0% |
| 01.01.004           | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022        | m2   | 45,50             | 45,50              |        | 45,50           | 73,68          | 3.352,44           | -      | 3.352,44        | 100,0% |
| 01.01.001.006       | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes                                                                                                 | m²   | 20,10             | 20,10              |        | 20,10           | 248,67         | 4.998,27           | -      | 4.998,27        | 100,0% |
| 01.01.001.007       | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira                                                                    | m²   | 139,50            | 139,50             |        | 139,50          | 9,43           | 1.315,49           | -      | 1.315,49        | 100,0% |
| 01.01.001.008       | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 ( CALÇADA EXTERNA E INTERMA DO PRÉDIO)                                                 | m²   | 205,11            | 205,11             |        | 205,11          | 24,16          | 4.955,46           | -      | 4.955,46        | 100,0% |
| 01.01.001.009       | Demolição de concreto manualmente ( CINTA DE CONCRETOS DOS MURO EXISTENTE)                                                                                  | m³   | 2,24              | 2,24               |        | 2,24            | 241,73         | 541,48             | -      | 541,48          | 100,0% |
| 01.01.001.010       | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado                                                                                                              | m    | 94,00             | 94,00              |        | 94,00           | 9,28           | 872,32             | -      | 872,32          | 100,0% |
| 01.01.001.011       | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022                                                                                | m²   | 34,40             | 34,40              |        | 34,40           | 19,06          | 655,66             | -      | 655,66          | 100,0% |
| 01.01.001.012       | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima                                                                                | m²   | 197,20            | 197,20             |        | 197,20          | 4,11           | 810,49             | -      | 810,49          | 100,0% |
| 01.01.001.013       | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos          | unid | 2,00              | 2,00               |        | 2,00            | 386,10         | 772,20             | -      | 772,20          | 100,0% |
| 01.01.001.014       | Lona plástica preta                                                                                                                                         | m²   | 276,65            | 276,65             |        | 276,65          | 5,28           | 1.460,71           | -      | 1.460,71        | 100,0% |
| 01.01.001.015       | Demolição de reboco                                                                                                                                         | m2   | 86,40             | 86,40              |        | 86,40           | 8,18           | 706,75             | -      | 706,75          | 100,0% |
| TOTAL DO ITEM 01.01 |                                                                                                                                                             |      |                   |                    |        |                 |                | 20.636,39          | -      | 20.636,39       | 100,0% |
| 01.02               | ELEVAÇÕES                                                                                                                                                   |      |                   |                    |        |                 |                |                    |        |                 |        |
| 01.02.001           | Escavação manual de vala ou para categoria, profundidade até 1,50m                                                                                          | m3   | 29,12             | 29,12              |        | 29,12           | 56,45          | 1.643,82           | -      | 1.643,82        | 100,0% |
| 01.02.003           | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m2   | 21,70             | 21,70              |        | 21,70           | 121,86         | 2.644,36           | -      | 2.644,36        | 100,0% |
| 01.02.004           | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09                                       | m2   | 49,95             | 49,95              |        | 49,95           | 48,87          | 2.441,06           | -      | 2.441,06        | 100,0% |

7/11/2024  
SIRIUS ENGENHARIA

29,12  
21,70  
49,95



## BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR  
BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.

Local : PIRAMBU/SE.



BOLETIM Nº

PERÍODO:  
14/09/2024  
a  
17/09/2024

CONTRATO

55/2024

BM 05

| ITEM          | DESCRIMINAÇÃO                                                                                                                                           | UN | QUANT<br>CONTRATADA | QUANTIDADES           |           |                    | PREÇO<br>UNITÁRIO | VALORES R\$           |           |                    | Medido    | %      |          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------|----------|
|               |                                                                                                                                                         |    |                     | ACUMULADO<br>ANTERIOR | DO<br>MÊS | ACUMULADO<br>ATUAL |                   | ACUMULADO<br>ANTERIOR | DO<br>MÊS | ACUMULADO<br>ATUAL |           |        | CONTRATO |
|               |                                                                                                                                                         |    |                     |                       |           |                    |                   |                       |           |                    |           |        |          |
| 01.02.006     | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                    | m2 | 196,62              | 196,62                |           | 196,62             | 7,41              | 1.456,95              | -         | 1.456,95           | 1.456,95  | 100,0% |          |
| 01.02.007     | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm                                          | m2 | 196,62              | 196,62                |           | 196,62             | 35,02             | 6.885,63              | -         | 6.885,63           | 6.885,63  | 100,0% |          |
| 01.02.013     | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 52,88               | 52,880                |           | 52,88              | 60,59             | 3.204,00              | -         | 3.204,00           | 3.204,00  | 100,0% |          |
| 01.02.015     | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais                      | m2 | 105,41              | 105,41                |           | 105,41             | 120,18            | 12.668,17             | -         | 12.668,17          | 12.668,17 | 100,0% |          |
| 01.02.016     | Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabatianinha ou similar - Rev 02                                                    | m2 | 105,41              | 105,41                |           | 105,41             | 57,85             | 6.097,97              | -         | 6.097,97           | 6.097,97  | 100,0% |          |
| 02.02.017     | Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água                                                                                 | m³ | 40,00               | 40,00                 |           | 40,00              | 168,57            | 6.742,80              | -         | 6.742,80           | 6.742,80  | 100,0% |          |
| 02.02.001.018 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa                                                                                   | m2 | 146,11              | 146,110               |           | 146,11             | 34,84             | 5.090,47              | -         | 5.090,47           | 5.090,47  | 100,0% |          |
| 02.02.001.019 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes                                                           | m  | 141,50              | 141,50                |           | 141,50             | 62,26             | 8.809,79              | -         | 8.809,79           | 8.809,79  | 100,0% |          |
| 02.02.001.020 | Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm                                                                                                       | m  | 58,30               | 58,30                 |           | 58,30              | 128,63            | 7.499,13              | -         | 7.499,13           | 7.499,13  | 100,0% |          |
| 02.02.001.021 | Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 02 (TUBO P/ÁGUA PLUVIAL)                  | m  | 16,00               | 16,0                  |           | 16,00              | 47,05             | 752,80                | -         | 752,80             | 752,80    | 100,0% |          |
| 02.02.001.022 | Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 horas por dia                                                                                    | h  | 96,00               | 96,00                 |           | 96,00              | 6,15              | 590,40                | -         | 590,40             | 590,40    | 100,0% |          |
| 02.02.001.023 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. af_08/2022       | m³ | 1,83                | 1,83                  |           | 1,83               | 531,15            | 969,66                | -         | 969,66             | 969,66    | 100,0% |          |
| 02.02.001.024 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021         | m³ | 0,70                | 0,70                  |           | 0,70               | 411,03            | 287,72                | -         | 287,72             | 287,72    | 100,0% |          |
| 02.02.001.025 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017                                                                                                        | m³ | 19,97               | 19,97                 |           | 19,97              | 51,22             | 1.022,86              | -         | 1.022,86           | 1.022,86  | 100,0% |          |
| 02.02.001.026 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive montagem e colocação de ferragens nas lajes, pilares, vigas e fundações - R1                                      | Kg | 583,48              | 583,48                |           | 583,48             | 14,16             | 8.262,08              | -         | 8.262,08           | 8.262,08  | 100,0% |          |

Ana Maria Santos  
Resp. Técnico - CREA 2708814572



| BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |                       |           |                    |                   |                       |           | CONTRATO                                                         | PERÍODO:                      | BOLETIM Nº | SIRIUS ENGENHARIA |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|--|
| OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE. |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |                       |           |                    |                   |                       |           | 55/2024                                                          | 14/09/2024<br>a<br>17/09/2024 | BM 05      |                   |  |
| Local : PIRAMBU/SE.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |                       |           |                    |                   |                       |           |                                                                  |                               |            |                   |  |
| ITEM                                                                                                                | DESCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                   | UN | QUANT<br>CONTRATADA | QUANTIDADES           |           |                    | PREÇO<br>UNITÁRIO | VALORES R\$           |           |                                                                  | %                             |            |                   |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                     | ACUMULADO<br>ANTERIOR | DO<br>MÊS | ACUMULADO<br>ATUAL |                   | ACUMULADO<br>ANTERIOR | DO<br>MÊS | ACUMULADO<br>ATUAL                                               |                               | CONTRATO   | Medido            |  |
| 02.02.001.027                                                                                                       | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1                                                                                       | KG | 170,60              | 170,60                |           | 170,60             | 13,21             | 2.253,63              | -         | 2.253,63                                                         | 2.253,63                      | 100,0%     |                   |  |
| 02.02.001.028                                                                                                       | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos                                                                                                                                                                         | m² | 49,28               | 49,28                 |           | 49,28              | 82,13             | 4.047,37              | -         | 4.047,37                                                         | 4.047,37                      | 100,0%     |                   |  |
| 02.02.001.029                                                                                                       | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015                                                                                                              | m² | 90,18               | 90,18                 |           | 90,18              | 113,43            | 10.229,12             | -         | 10.229,12                                                        | 10.229,12                     | 100,0%     |                   |  |
| 02.02.001.030                                                                                                       | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado                                                                                                                                                              | m³ | 9,29                | 9,29                  |           | 9,29               | 614,77            | 5.711,21              | -         | 5.711,21                                                         | 5.711,21                      | 100,0%     |                   |  |
| TOTAL DO ITEM 01.02                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |                       |           |                    |                   | 99.311,00             | -         | 99.311,00                                                        | 99.311,01                     | 100,0%     |                   |  |
| 01.07                                                                                                               | LOUÇAS E METAIS                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |                       |           |                    |                   |                       |           |                                                                  |                               |            |                   |  |
|                                                                                                                     | Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico | un | 3,00                | 3,00                  |           | 3,00               | 652,32            | 1.956,96              | -         | 1.956,96                                                         | 1.956,96                      | 100,0%     |                   |  |
| 01.01.007.005                                                                                                       | Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar                                                                                                                                                                         | un | 4,00                | 4,00                  |           | 4,00               | 67,01             | 268,04                | -         | 268,04                                                           | 268,04                        | 100,0%     |                   |  |
| 01.01.007.006                                                                                                       | Chuveiro plástico sem registro                                                                                                                                                                                                  | un | 2,00                | 2,00                  |           | 2,00               | 33,25             | 66,50                 | -         | 66,50                                                            | 66,50                         | 100,0%     |                   |  |
| 01.01.007.007                                                                                                       | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021                                                                                                     | un | 2,00                | 2,00                  |           | 2,00               | 86,47             | 172,94                | -         | 172,94                                                           | 172,94                        | 100,0%     |                   |  |
| TOTAL DO ITEM 01.07                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |                       |           |                    |                   | 2.464,44              | -         | 2.464,44                                                         | 2.464,44                      | 100,0%     |                   |  |
| 01.08                                                                                                               | DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                        |    |                     |                       |           |                    |                   |                       |           |                                                                  |                               |            |                   |  |
| 01.01.008.002                                                                                                       | Limpeza geral                                                                                                                                                                                                                   | m² | 237,67              |                       | 237,67    | 237,67             | 2,26              | -                     | 533,96    | 533,96                                                           | 533,96                        | 100,0%     |                   |  |
| TOTAL DO ITEM 01.08                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |                       |           |                    |                   | -                     | 533,96    | 533,96                                                           | 533,96                        | 100,0%     |                   |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |                       |           |                    |                   | 122.415,00            | 533,96    | 122.948,96                                                       | 122.948,96                    | 100,00%    |                   |  |
| SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |                       |           |                    |                   |                       |           | ANOTAÇÕES:                                                       |                               |            |                   |  |
| Atesto que os serviços acima foram executados.<br>Pirambu-Sergipe, ____/____/2024                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |                       |           |                    |                   |                       |           |                                                                  |                               |            |                   |  |
| Ana Maria Santos<br>Resp. Técnico - CREA 2708814572                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |                       |           |                    |                   |                       |           | Manoel Messias Soares Neto<br>Engenheiro Civil - CREA 2708814572 |                               |            |                   |  |
| SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                     |                       |           |                    |                   |                       |           |                                                                  |                               |            |                   |  |

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 50.907.330/0001-33

**Razão**

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**Social:**

**Endereço:** R MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS 229 SALA B / INACIO  
BARBOSA / ARACAJU / SE / 49040-830

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 22/11/2024 a 21/12/2024

**Certificação Número:** 2024112205446105315413

Informação obtida em 24/11/2024 16:49:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Aracaju  
Secretaria Municipal da Fazenda

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 24 de Novembro de 2024  
Nº. 202400532268

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Contribuinte: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 22/02/2025

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: FE.0054.0033.DD.085C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 50.907.330/0001-33**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:29:24 do dia 24/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/05/2025.

Código de controle da certidão: **519F.1323.98A1.878E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 637821 / 2024**

**Inscrição Estadual:** 27.197.535-0  
**Razão Social:** SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA  
**CNPJ:** 50.907.330/0001-33  
**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
**Atividade Econômica:** CONSTRUCAO DE EDIFICIOS  
**Endereço:** RUA - MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS - SALAB - 229  
INACIO BARBOSA - ARACAJU - CEP:49040830

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **26/11/2024 às 10:00:03, válida até 26/12/2024** deve ser conferida na Internet no endereço [www.sefaz.se.gov.br](http://www.sefaz.se.gov.br) pelo agente recebedor.

Aracaju, 26 de Novembro de 2024

**Autenticação: 20241126PDWDSC**



**Declaração de Recolhimento do ICMS N. 637871 / 2024**

**Identificação do Solicitante: 50.907.330/0001-33**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **50.907.330/0001-33** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **50.907.330/0001-33** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria N°.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **26/11/2024 às 10:14:43, válida até 26/12/2024** deve ser conferida na Internet no endereço [www.sefaz.se.gov.br](http://www.sefaz.se.gov.br) pelo agente recebedor.

Aracaju, 26 de Novembro de 2024

**Autenticação: 20241126LRGSUQ**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Certidão nº: 76166251/2024

Expedição: 02/11/2024, às 18:02:19

Validade: 01/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 50.907.330/0001-33, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO  
DO ESTADO DE SERGIPE

## CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: **CRIMINAL**

RESULTADO: **NEGATIVA**

### IDENTIFICAÇÃO

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Tipo de Pessoa: Jurídica

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Nome Fantasia: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

### NADA CONSTA

OUTROSSIM, EM ATENDIMENTO AO ART. 7º, V, DA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEGUE LISTA DE FEITOS EM TRAMITAÇÃO QUE NÃO POSITIVAM ESTA CERTIDÃO JUDICIAL:

### NADA CONSTA

### OBSERVAÇÕES

1. Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. A pesquisa realizada abrange todos os processos criminais, inclusive aqueles dos Juizados Especiais Criminais e da Auditoria Militar.
7. A pesquisa realizada NÃO abrange os processos em que foram concedidas transação penal ou suspensão condicional da pena.
8. Esta certidão judicial substitui a Folha Corrida.

### PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0215775** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **24/11/2024** e válida até **24/12/2024**.

Código de Autenticidade nº **9530.8194.5264.0576**.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-SE**

**Nº 471918/2024**

**Emissão: 07/04/2024**

**Validade: 31/03/2025**

**Chave: 20159**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Registro: 0000207977

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 50.000,00

Data do Capital: 01/06/2023

Faixa: 1

Objetivo Social Pleno: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA: AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, E DIVISÓRIAS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS.

Endereço Matriz: RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS, 229, SALA B, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU, SE, 49040830

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 26/06/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000020842DDSE

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ANA MARIA SANTOS

Registro: 2708814672

CPF: 312.\*\*\*.\*\*\*-20

Data Início: 28/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE

Registro: 2702649815

CPF: 103.\*\*\*.\*\*\*-91





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-SE**

**Nº 471918/2024**  
Emissão: 07/04/2024  
Validade: 31/03/2025  
Chave: 20159

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe**

Data Início: 06/09/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGOS 7º e 25 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-SE**

**Nº 470378/2024**  
**Emissão: 11/02/2024**  
**Validade: 31/03/2025**  
**Chave: 5b2d7**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

**Interessado(a)**

Profissional: ANA MARIA SANTOS

Registro: 2708814672

CPF: 312.\*\*\*-\*\*-20

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 03/10/2011

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Restrições: PORTOS E VIAS NAVEGAVEIS, POCOS, AEROPORTOS E FERROVIAS.

Instituição de Ensino: ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA PIO DECIMO

Data de Formação: 07/08/2010

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000207977

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Data Início: 28/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANA MARIA SANTOS

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 2708814672

Registro: 0000001279SE

Empresa contratada: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro : 0000207977-SE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU -SERGIPE  
PRAÇA NOSSA SENHORA DE LURDES

Complemento:

Cidade: PIRAMBU

Bairro: CENTRO

UF: SE

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

Nº: 16

CEP: 49190000

Contrato: 55/2024

Valor: R\$ 246.882,77

Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 13/03/2024

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA GEMIRO DOS SANTOS

Complemento:

Cidade: PIRAMBU

Data de Início: 18/03/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU -SERGIPE

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: SE

CEP: 49190000

Previsão de término: 15/06/2024

Coordenadas Geográficas: -10.633969, -36.803492

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

4. Atividade Técnica

16 - Execução

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE  
EDIFICAÇÃO > #TOS\_1.1.2.1 - DE ALVENARIA

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #TOS\_1.1.6 - DE MURO

Quantidade

101,86

Unidade

m2

131,05

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRAMBU  
SERGIPE CONFORME CONTRATO n.º 55/2024

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SERGIPE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data

ANA MARIA SANTOS - CPF: 312.095.995-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU -SERGIPE - CNPJ:  
13.095.039/0001-81

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 262,55

Registrada em: 01/04/2024

Valor pago: R\$ 262,55

Nosso Número: 8203074143

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 99ZA3  
Impresso em: 07/04/2024 às 18:15:10 por: , ip: 189.70.218.124







# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



### Informações da obra

|                                                       |                                                             |                                                                            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de inscrição da obra</b><br>90.018.68401/71 | <b>Nome da obra</b><br>SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | <b>Data do cadastramento</b><br>04/04/2024 17:36                           |
| <b>Origem do cadastramento e-CAC</b>                  |                                                             |                                                                            |
| <b>Tipo Zona</b><br>Zona Urbana                       | <b>ART</b><br>SE20240373270                                 | <b>RRT</b><br><br><b>CIB</b><br><br><b>Cadastro Imobiliário</b><br>55/2024 |
| <b>Data do início da obra</b><br>18/03/2024           | <b>CNAE</b><br>4399103 Obras de alvenaria                   |                                                                            |

### Situação da obra

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>Situação</b><br>Ativa | <b>Data</b><br>18/03/2024 |
|--------------------------|---------------------------|

### Endereço

|                         |                                            |                      |                          |
|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Pais</b><br>BRASIL   | <b>Município</b><br>PIRAMBU                | <b>UF</b><br>SE      | <b>CEP</b><br>49.190-000 |
| <b>Bairro</b><br>CENTRO | <b>Logradouro</b><br>RUA GEMIRO DOS SANTOS | <b>Número</b><br>S/N |                          |

### Responsável

|                                                         |                                            |                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Nome</b><br>SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA     | <b>CPF/CNPJ</b><br>50.907.330/0001-33      | <b>Vínculo</b><br>Construtora |
| <b>Data de início da responsabilidade</b><br>18/03/2024 | <b>Data de término da responsabilidade</b> |                               |

### Contratantes

| CPF/CNPJ           | Nome                 |
|--------------------|----------------------|
| 13.095.039/0001-81 | MUNICIPIO DE PIRAMBU |

### Áreas Principais

| Categoria | Destinação              | Tipo de Obra | Área      |
|-----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Existente | Comercial salas e lojas | Alvenaria    | 131,05 m² |

### Áreas Complementares

| Categoria | Destinação              | Tipo de Obra | Tipo de Área                     | Área Coberta | Área Descoberta | Área Total |
|-----------|-------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|
| Reforma   | Comercial salas e lojas | Alvenaria    | Quadra Esportiva e Poliesportiva | 131,05 m²    | 0,00 m²         | 131,05 m²  |

### Área Resultante



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**ORDEM DE SERVIÇO**

**VIGÊNCIA:  
13/03/2024**

**CONTRATO: N° \_55/2024**

**OBJETO DO CONTRATO:** Contrato de empreitada por preço global para  
**REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO LOCALIZADA NA SEDE  
DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU, SERGIPE "**

**PRAZO DO CONTRATO:** 12 meses

**DATA DO CONTRATO:** 13 de Março de 2024

**RECURSOS:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


**CONTRATADA:** SIRIUS ENGENHARIA E

**CONSTRUÇÕES LTDA**

Tendo em vista o instrumento contratual acima descrito, celebrado com esta Prefeitura, fica Vossa Senhoria cientificado de que o prazo para início dos serviços objeto do contrato começará a partir de 18/03/2024.

Outrossim, informamos que foi designado pela Prefeitura Municipal de Pirambu, o engenheiro Manoel Messias Soares Neto, para fiscalização dos serviços.

**Pirambu, 18 de Março de 2024**

  
\_\_\_\_\_  
Prefeitura de Pirambu  
Guilherme Jullius Zacarias de Melo  
**PREFEITO**


**CIENTE:**



Documento assinado digitalmente  
**MANOEL MESSIAS SOARES NETO**  
Data: 18/03/2024 11:31:03-0300  
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

**Engº Fiscal:** \_\_\_\_\_

**Firma Contratada:** \_\_\_\_\_





# MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05/2024 DO 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 55/2024



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO  
MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.



| ÍTEM          | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LOCALIZAÇÃO | UNID | QUANT  |
|---------------|--------------------------------------|------|--------|
| 01.08         | DIVERSOS                             |      |        |
|               | Limpeza geral                        |      |        |
|               | Cálculo:                             |      |        |
|               | 16,50 x 7,10 = 117,15 m <sup>2</sup> |      |        |
|               | 24,95 x 3,70 = 92,13 m <sup>2</sup>  |      |        |
|               | 16,70 x 1,70 = 28,39 m <sup>2</sup>  |      |        |
| 01.01.008.002 | Total= 237,67 m <sup>2</sup>         | m2   | 237,67 |

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Ana Maria Santos  
Resp. Técnico - CREA 2708814672

Manoel Messias Soares Neto  
Engenheiro Civil RN - nº 271707001 - 2

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO DO  
ADITIVO DA OBRA REFORMA DA ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU -  
SERGIPE**

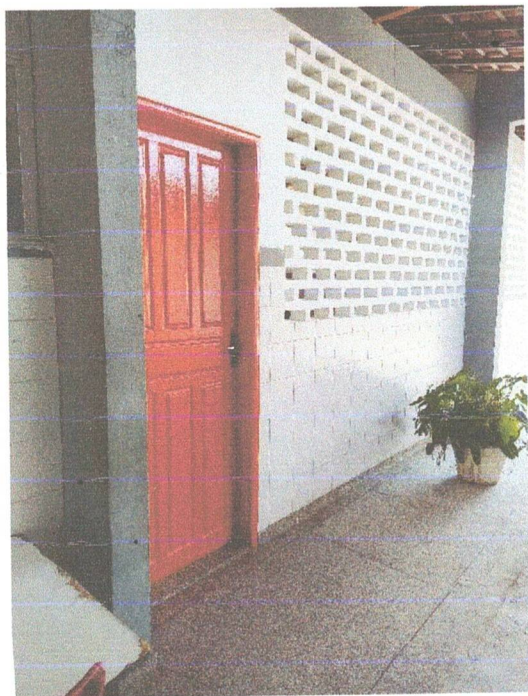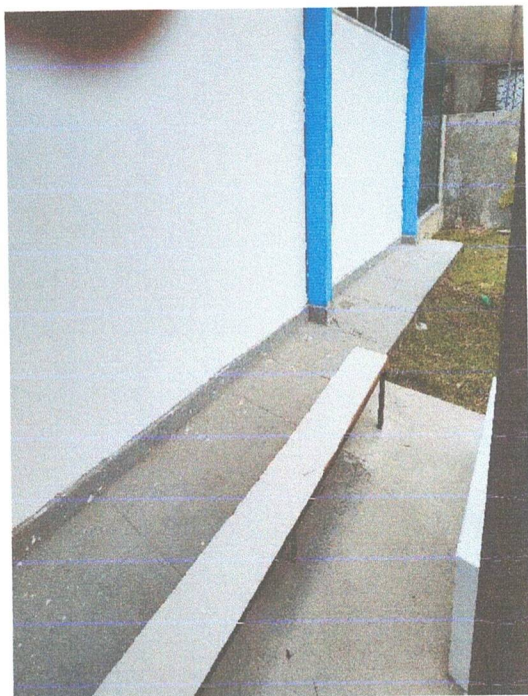



**SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** CNPJ: 50.907.330/0001-33  
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa  
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962  
EMAIL: [siriusconstrucoeseng@gmail.com](mailto:siriusconstrucoeseng@gmail.com)

Manoel Messias Soares Neto  
Engenheiro Civil R.N. nº 27173733-2

**SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**  
Ana Maria Santos  
Resp. Técnico - CREA 2708814672



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO DO  
ADITIVO DA OBRA REFORMA DA ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU  
SERGIPE**

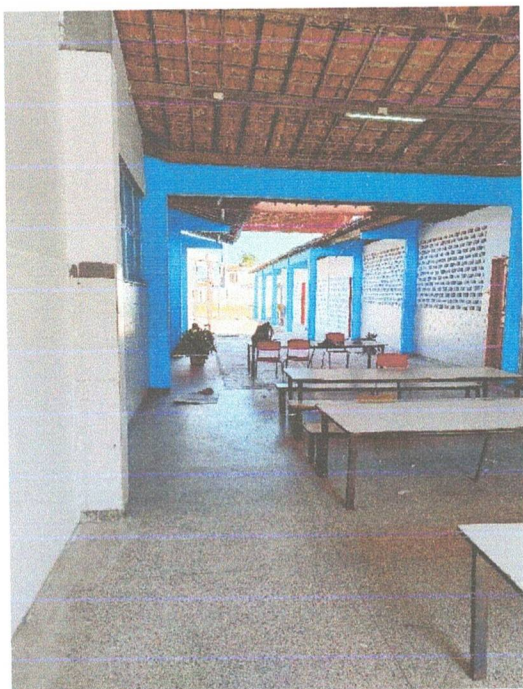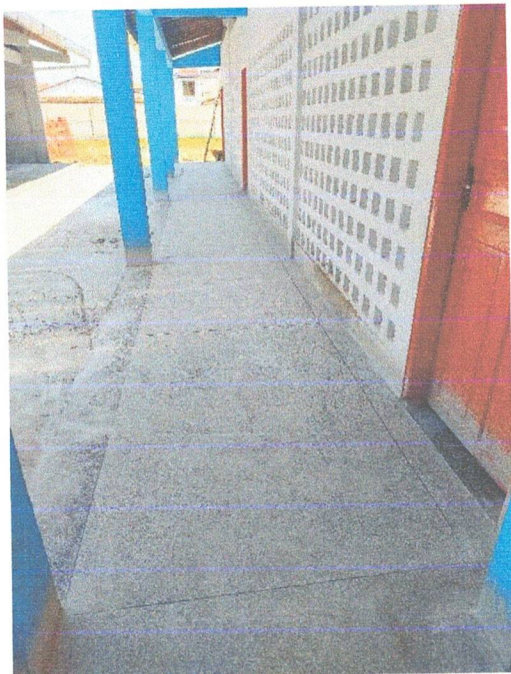

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33  
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa  
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962  
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com


Manoel Messias Soares Neto  
Engenheiro Civil - nº 27.717/331 - 2

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ana Maria Santos  
Resp. Técnico - CREA 2708814672



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO DO  
ADITIVO DA OBRA REFORMA DA ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU  
SERGIPE**

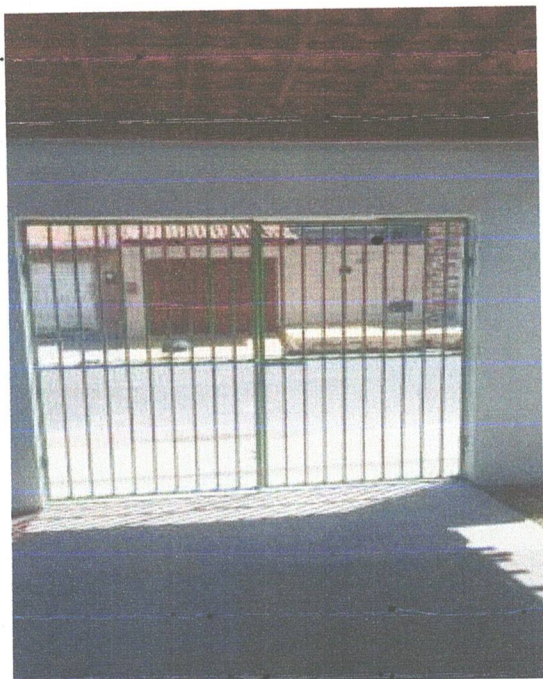

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33

Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa

Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962


EMAIL: [siriusconstrucoeseng@gmail.com](mailto:siriusconstrucoeseng@gmail.com)

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ana Maria Santos  
Resp. Técnica - CREA 2708814672



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO DO  
ADITIVO DA OBRA REFORMA DA ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU  
SERGIPE**

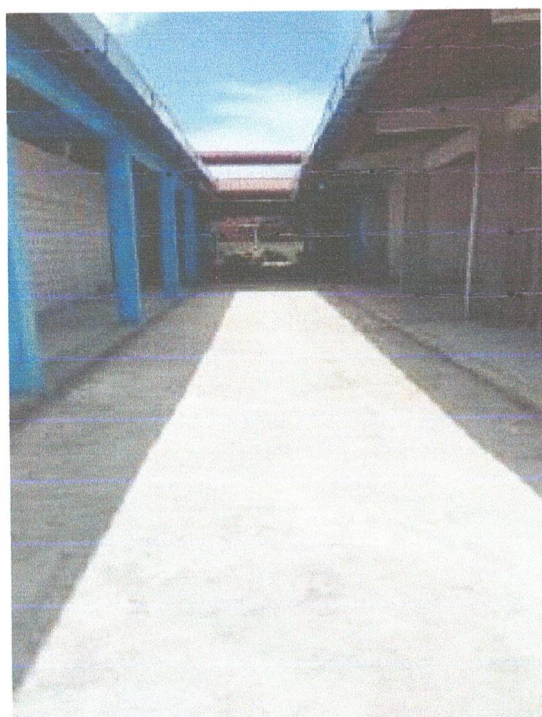

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33

Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa

Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962

EMAIL: [siriusconstrucoeseng@gmail.com](mailto:siriusconstrucoeseng@gmail.com)

Manoel Messias Santos Neto  
Engenheiro Civil - R. 27.713.001-1

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ana Maria Santos  
Resp. Técnico - CREA 2708814572



## DIARIO DE OBRA

OBJETO:SERVIÇOS DE REFORNA DA ESCOLA LEONOR BARRETO  
FRANCO - PIRAMBU-SERGIPE

1º TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 55/2024

DATA: 16/09/2024

Iniciamos a limpeza geral em toda obra . Tempo bom

DATA:17/09/2024

A limpeza geral foi concluída. Tempo bom.

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Engenheiro civil:

Ana Maria Santos

Resp. Técnico - CREA 2708814672

Fiscal da obra:

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Ana Maria Santos

Resp. Técnico - CREA 2708814672

Manoel Messias Soares Neto  
Engenheiro Civil RN - nº 27.773/2021 - 2



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **50.907.330/0001-33**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/06/2023**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

CPF/CNPJ do Empregador  
50.907.330

Nome/Razão Social do Empregador  
SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Núm. de Pág. 1

Identificador  
0124091328222950-4

Tag  
50907330 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações

Valor a recolher

271,35

## Composição do Documento

| Competência         | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal   | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total         |
|---------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 06/2024             | 2                           | 271,35        | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 271,35        |
| <b>Total Geral:</b> |                             | <b>271,35</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>271,35</b> |

Data de geração da Guia: 13/09/2024 às 11:43:57 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



### PIX Copia e Cola:

**Payload Location:**

<http://dx.doi.org/10.1186/1745-6215-12-100>



(Sem assunto)

Assunto: Mensagem enviada para 2605@yahoo.com.br

De: 2605@yahoo.com.br

Para: 2605@yahoo.com.br



**Pix enviado**  
**R\$ 271,35**

### Sobre a transação

Data da transação 14/09/2024

Horário 18h37

Identificador  
e3c9de8c0f9c4fcd97c0c8b04e21331d

ID da transação  
E00416968202409142135ScrEWDCPO6u

### Quem pagou

Nome SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD

CPF/CNPJ 50.907.330/0001-33

Conta 348405782

Agência 0001

Instituição BANCO INTER S.A.

### Quem recebeu

Nome Caixa Economica Federal

CPF/CNPJ 00.360.305/0001-04

Agência 0647

Número da conta 9999000537000360305-5

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

[Ver o histórico de transações no aplicativo](#)

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CNPJ/CPF</b>                             | 50.907.330/0001-33                   |
| <b>Nome</b>                                 | SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA |
| <b>Período de apuração</b>                  | 09/2024                              |
| <b>Declaração Retificadora</b>              | Não                                  |
| <b>Identificação da apuração de débitos</b> | 28420685974 / eSocial                |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| Tributos                                           | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>       | R\$ 503,95       | R\$ 0,00      |
| <b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>        | R\$1.189,76      | R\$ 0,00      |
| <b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b> | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| <b>IRRF</b>                                        | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| <b>COFINS</b>                                      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| <b>PIS</b>                                         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| <b>CSRF</b>                                        | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| <b>COSIRF</b>                                      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| <b>TOTAL</b>                                       | R\$ 1.693,71     | R\$ 0,00      |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>Nome</b>     | ANA MARIA SANTOS |
| <b>CPF</b>      | 312.095.995-20   |
| <b>Telefone</b> | -                |

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b> | 11/10/2024 10:18:50 |
| <b>Nº do recibo de entrega</b>                                      | 0000050000271808840 |
