



Emissão de comprovantes

G3362916472896371
29/05/2024 16:51:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.54
2206302206 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME PIRAMBU-SE - FEB

AGENCIA: 2206-3 CONTA: 15.359-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME PIRAMBU-SE - FEB

BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.

AGENCIA: 0028-0 - SANTO ANTONIO

CONTA: 104.418-2

FAVORECIDO: E E P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 42.348.741/0001-08

VALOR: R\$ 26.739,20

DEBITO EM: 29/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052903

AUTENTICACAO SISBB: 1.A0B.5FD.F31.1AC.B4E

PAGO

Transação efetuada com sucesso por: JH648495 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2206-3
Conta corrente 15359-1 SME PIRAMBU-SE - FEB

Creditado

Banco 47 BCO DO EST. DE SE S.A.
Agência (sem DV) 28 SANTO ANTONIO
Conta corrente (com DV) 1044182
CNPJ 42.348.741/0001-08
Nome favorecido E E P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.903
Valor 26.739,20
Destinação 0
Data transferência 29/05/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1A0B5FDF311ACB4E
Assinada por JH648496 FABRICIO MUNIZ DOS SANTOS
JH648495 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO

29/05/2024 16:49:22
29/05/2024 16:51:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH648495 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO.



TED

G3342916452847341
29/05/2024 16:49:20

Debitado

Agência 2206-3
Conta corrente 15359-1 SME PIRAMBU-SE - FEB

Creditado

Banco 47 BCO DO EST. DE SE S.A.
Agência (sem DV) 28 SANTO ANTONIO
Conta corrente (com DV) 1044182
Conta Pagamento 0000
CNPJ 42.348.741/0001-08
Nome favorecido E E P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 26.739,20
Data transferência 29/05/2024

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 331035601.
Usuário: JH648496 FABRICIO MUNIZ DOS SANTOS.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

MAIO/2024

Nota de Liquidação: 0529015

Fonte: 15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Data: 29/05/2024

FORNECEDOR

Nome: E & P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 42348741000108
Endereço: RUA FRANCISCO PORTUGAL, 529 Compl:
Bairro: SALGADO FILHO Cidade: Aracaju UF: SE
E-mail: e&pconstrcoes.servicos@gmail.com Telefone: (79)33033-888 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função: 12 Educação
SubFunção: 361 Ensino Fundamental
Programa: 0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
Ação: 1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações
SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo
Fonte: 15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Marcador: 15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro Custo:

EMPENHO

EMISSÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR

SALDO ATUAL

0321001

21/03/2024

386.392,54

30.077,86

356.314,68

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MÁRIO TRINDADE CRUZ LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 56/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

NOTA FISCAL 0016/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MÁRIO TRINDADE CRUZ LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.

Documento	Valor
Nota Fiscal (16 / Série: A / UF: SE / Emissão: 20/05/2024)	30.077,86

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	30.077,86
Retenção		Valor
21881010201-Inss		1.985,14
21881010401-Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		451,18
21881010801-Iss		902,34

TRINTA MIL E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Total Retido:	3.338,66
Total Liquido:	26.739,20



TERMO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 42.348.741/0001-08

Nome: E & P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO PORTUGAL

Compl:

Bairro: SALGADO FILHO

Cidade: Aracaju

UF: SE

E-mail: e&pconstrcoes.servicos@gmail.com

Telefone: (79)33033-888

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Conta:

EMPENHO

0321001

EMIÇÃO

21/03/2024

CLASSIFICAÇÃO

1012.44905100-15400001

TIPO

Global

FONTE

15400001 - Transferências do FUNDEB -
Impostos e Transferências de Impostos

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MÁRIO TRINDADE CRUZ LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 56/2024.

Documentação

Nota Fiscal 16
Valor R\$ 30.077,86
Emissão 20/05/2024
Horário de Entrega 22/05/2024 11:32:46

Para acompanhar o andamento do seu processo na fila pública, acesse o link abaixo:

<http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pirambu/fornecedor/filapagamento>

Cadastrado por: Santiago Santos Gois

Secretaria de Controle Interno

☐ Aprovado

☐ Reprovado

Obs. **APRESENTAR ITENS
QUE FALTAM DO CHECKLIST ANEXO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Nota: 2024000

00000016

Código Verificação
K2EE-NZ8A



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

20/05/2024 15:07:59

Período de Competência

05/2024

Município de Prestação do
Serviço

Pirambu - SE

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte
(ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em
Pirambu

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

E & P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI LTDA

Nome Fantasia

E & P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CPF/CNPJ

42.348.741/0001-08

Inscrição Municipal

1320240

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

WASHINGTON.SE@GMAIL.COM

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 3303-3888

Endereço

Rua Wilson Barbosa de Melo, 23, PAVIMENTO TERREO, Atalaia - CEP: 49037-590 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PIRAMBU

CPF/CNPJ

13.095.039/0001-81

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

diretriz.cnt@gmail.com

Endereço

PRCA NOSSA SENHORA DE LURDES, 16 - Centro - CEP: 49190-000 - Pirambu - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao pagamento do Boletim de Medição nº 01 do contrato nº 56/2024,

Serviço de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ

SENDO 40% MATERIAL

SENDO 60% MÃO DE OBRA

☒ Os serviços foram prestados
☐ Os produtos foram entregues
☐ A obra foi executada

Data: 29/05/2024
Márcio M. S. M. Vitor
Engenheiro Civil
CPEA-SE 271797661-2

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

1.985,14

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

30.077,86

Deduções (R\$)

12.031,14

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

3,7000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

28.092,72

Valor Total da Nota (R\$)

30.077,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 4.045,47 Federal e R\$ 1.503,89 Municipal. Fonte: IBPT [244637]

Visualizado em: 20/05/2024 15:08:00

Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
CONTROLADORIA MUNICIPAL**

CHECK LIST

PARA PAGAMENTO DE OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA

Processo nº: 432 Vigência: 21/03/24 A 21/03/25
Empresa Contratada: E & P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Resumo do objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MÁRIO TRINDADE CRUZ
Fonte de Recurso: 15400001
Medição: 1ª – 02/04/24 A 19/05/24

ITENS	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Nota Fiscal contendo Nº do empenho/Ano, Modalidade – Número/Ano da Licitação e Nº do Contrato/Ano.	X		CONTÉM APENAS O Nº DO CONTRATO – 20/05/24
Laudo de medição da obra, assinado pelo Engenheiro responsável.	X		
ORDEM DE SERVIÇOS		X	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	X		
RELATÓRIO DIÁRIO DA OBRA	X		FALTA ASSINATURA DO FISCAL DO ENGENHEIRO FISCAL
CERTIDÃO DO CREA - PESSOA FÍSICA	X		
CERTIDÃO DO CREA - PESSOA JURÍDICA	X		
Cópia do comprovante de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART DE EXECUÇÃO	X		
Cópia do comprovante de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART DE FISCALIZAÇÃO		X	
Certidão de Regularidade do FGTS	X		25/04 A 24/05/2024
Certidão Negativa de Tributos Municipais	X		21/05 A 19/08/2024
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais e Dívida Ativa da União	X		20/03 A 16/09/2024
Certidão Negativa de Tributos Estaduais	X		23/04 A 23/05/2024
Certidão de Regularidade Trabalhista	X		20/03 A 16/09/2024
Extrato de Optante ou de Não Optante pelo Simples	X		
Cadastro Nacional de Obras - CNO		X	
Recolhimento do INSS relativo aos funcionários (Guia da Previdência Social – (GPS).		X	
Recolhimento do FGTS relativo aos funcionários (Guia de Recolhimento do FGTS – (GRF).	X		

VALOR DO CONTRATO	MEDIDAÇÃO	VALOR	SALDO
386.392,54	1ª	30.077,86	356.314,68

OBS.: Falta foto da placa que consta na medição

Pirambu, 23/05/2024.


Katia Sirlene Cardoso dos Santos
Secretaria de Controle Interno
Decreto: 05/2021



FATURA/ NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2024000000016

DATA DE EMISSÃO: 20/05/2024

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU / SE

DEVE A:

E&P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, Empresa com sede à RUA FRANCISCO PORTUGAL, Nº 529, SALGADO FILHO, ARACAJU-SE, a importância de **R\$ 30.077,86 (trinta mil, setenta e sete reais e oitenta e seis centavos)**, referente ao pagamento do Boletim de Medição nº 01 do contrato nº 56/2024, cujo objeto é REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE – BANESE

AGÊNCIA: 028

CONTA: 03/104418-2

RECIBO

R\$ 30.077,86

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU /SE a importância de R\$ 30.077,86 (trinta mil, setenta e sete reais e oitenta e seis centavos) referente à quitação da nossa fatura acima.

Recebemos

Em: ____/____/____

EDMILSON PEQUENO DOS SANTOS
ADMINISTRADOR

E&P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Aracaju, 20 de Maio de 2024.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU / SE

Ref.: Contrato Nº 56/2024


Assunto: Nossa Fatura/Nota Fiscal Eletrônica nº 2024000000016

Prezados Senhores:

A **E&P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**, vem através desta, apresentar a vossa senhoria a nossa Fatura e respectiva NF em epígrafe, referente ao Boletim de Medição nº 01 do Contrato nº 56/2024, cujo o objeto é a REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ.

Nota Fiscal nº 2024000000016;
Boletim de Medição nº 01;
Relatório Fotográfico BM01;
Memória de Cálculo BM01;
ART de execução;
GFIP Ref. 04/2024;
Contra cheque;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
Certidão Negativa de Débitos, Junto a Fazenda Municipal;
Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da União;
Certificado de Regularidade de Situação, Junto ao FGTS;
Certidão Negativa.

Atenciosamente,



EDMILSON PEQUENO DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
E&P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

RECEBIDO
20/05/2024
[Assinatura]



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.018.83245/72	Nome da obra UNIDADE MARIO TRINDADE CRUZ	Data do cadastramento 16/04/2024 15:50	
Origem do cadastramento e-CAC			
Tipo Zona Zona Rural	ART SE20240375397	RRT CIB 0000000-0	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 02/04/2024	CNAE 4120400 Construção de edifícios		

Situação da obra

Situação Ativa	Data 02/04/2024
-------------------	--------------------

Endereço

País BRASIL	Município PIRAMBU	UF SE	CEP 49.190-000
Bairro CENTRO	Logradouro RUA GIVALDO MOURA DA SILVA	Número 85	Complemento CASA

Responsável

Nome E & P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ 42.348.741/0001-08	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 02/04/2024	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
13.095.039/0001-81	MUNICIPIO DE PIRAMBU

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Galpão industrial	Mista	50,00 m²
Reforma	Galpão industrial	Mista	50,00 m²

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Existente	Galpão industrial	Mista	Quadra Esportiva e Poliesportiva	30,00 m²	20,00 m²	50,00 m²
Reforma	Galpão industrial	Mista	Quadra Esportiva e Poliesportiva	30,00 m²	20,00 m²	50,00 m²

Área Resultante



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240374873

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

MANOEL MESSIAS SOARES NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2717976612

Registro: 2717976612SE

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pirambu**

RUA RUA GIVALDO MOURA DA SILVA

Complemento:

Cidade: **PIRAMBU**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

Nº: 16

CEP: 49190000

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 4.000,00**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PIRAMBU

Complemento:

Cidade: **PIRAMBU**

Data de Início: **18/03/2024**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Pirambu**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

Código: **49190-000**

Nº: s/n

CEP: 49190000

Coordenadas Geográficas: **-10.738536, -36.856371**

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #TOS_1.1.6 - DE MURO

Quantidade

101,86

131,05

Unidade

m2

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART referente ao serviço de fiscalização, da Reforma da Escola Leonor Barreto Franco, na Sede do Município de Pirambu-SE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MANOEL MESSIAS SOARES NETO - CPF: 049.126.295-70

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

Prefeitura Municipal de Pirambu - CNPJ: 13.095.039/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 99,64**

Registrada em: **18/04/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **8203107269**



Documento assinado digitalmente

MANOEL MESSIAS SOARES NETO

Data: 22/05/2024 10:28:28 -0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WZ32b
 Impresso em: 22/05/2024 às 10:28:49 por: , ip: 192.168.100.1

www.crea-se.org.br
 Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br
 Fax: XXXX-XXXX



PLANILHA DE MEDIÇÃO 01										CONTRATO Nº 56/2024				
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/04/2024 até 19/05/2024										DATA DA MEDIÇÃO: 20/05/2024				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	ACUMUL. ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMUL. ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMUL. ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	(%)
01	REFORMA DA ESCOLA MARIO TRINDADE								R\$ 386.392,54	R\$ -	R\$ 30.077,86	R\$ 30.077,86	R\$ 356.314,68	7,78
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 3.530,92	R\$ -	R\$ 810,08	R\$ 810,08	R\$ 2.720,84	22,94
01.001.001	Plica de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metal 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev.02 - 09/2021	un	1,00		1,00	1,00	0,00	R\$ 423,08	R\$ 423,08	R\$ -	R\$ 423,08	R\$ 423,08	R\$ -	100,00
01.001.002	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - revestimento	m3	15,00		15,00	15,00	0,00	R\$ 25,80	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ 387,00	R\$ 387,00	R\$ -	100,00
01.001.003	Revoque de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem	m2	67,40		0,00	0,00	67,40	R\$ 28,81	R\$ 1.806,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.806,99	0,00
01.001.004	Revoque de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem	m2	90,68		0,00	0,00	90,68	R\$ 4,04	R\$ 366,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 366,35	0,00
01.001.005	Demolição de pavimento em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	50,00		0,00	0,00	50,00	R\$ 10,95	R\$ 547,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 547,50	0,00
01.002	ELEVACOES								R\$ 194.193,70	R\$ -	R\$ 10.139,74	R\$ 10.139,74	R\$ 184.053,96	5,22
01.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	3,12		1,00	1,00	2,12	R\$ 36,55	R\$ 114,04	R\$ -	R\$ 36,55	R\$ 36,55	R\$ 77,49	32,05
01.002.002	Alvenaria de bloco cerâmico vedação 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:2:8 (cimento:areia:argamassa) junta=1cm - Rev.08	m3	3,12		1,00	1,00	2,12	R\$ 440,68	R\$ 1.374,92	R\$ -	R\$ 440,68	R\$ 440,68	R\$ 934,24	32,05
01.002.003	Impermeabilização de alvenaria e viga de concreto com 1 demão de tinta acrílica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilizadora esp=2cm	m2	11,00		4,00	4,00	7,00	R\$ 107,40	R\$ 1.181,40	R\$ -	R\$ 429,60	R\$ 429,60	R\$ 751,80	36,36
01.002.004	Alvenaria de bloco cerâmico vedação 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:2:8 (cimento:areia:argamassa) junta=1cm - Rev.08	m2	128,30		29,70	29,70	98,60	R\$ 43,63	R\$ 5.597,73	R\$ -	R\$ 1.295,81	R\$ 1.295,81	R\$ 4.301,92	23,15
01.002.005	Concreto armado tipo C-30 (MPa) fabricado na obra, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	6,00		1,00	1,00	5,00	R\$ 2.072,10	R\$ 12.432,60	R\$ -	R\$ 2.072,10	R\$ 2.072,10	R\$ 10.360,50	16,67
01.002.006	Chapisco em parede com argamassa tipo 1:1 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	94,60		0,00	0,00	94,60	R\$ 6,76	R\$ 639,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 639,50	0,00
01.002.007	Reboco de emboco interno, de parede, com argamassa tipo 1:1 - 1:2 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	94,60		0,00	0,00	94,60	R\$ 31,78	R\$ 3.006,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.006,39	0,00
01.002.008	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores - cores convencionais - Rev.03	m2	3000,00		0,00	0,00	3000,00	R\$ 14,80	R\$ 44.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.400,00	0,00
01.002.009	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	546,40		0,00	0,00	546,40	R\$ 17,06	R\$ 9.321,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.321,58	0,00
01.002.010	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01	m	40,43		0,00	0,00	40,43	R\$ 30,34	R\$ 1.226,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.226,65	0,00
01.002.011	Aterro de caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	37,00		0,00	0,00	37,00	R\$ 127,40	R\$ 4.713,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.713,80	0,00
01.002.012	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal	m3	37,00		0,00	0,00	37,00	R\$ 4,17	R\$ 154,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 154,29	0,00
01.002.013	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	809,00		0,00	0,00	809,00	R\$ 26,46	R\$ 21.406,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.406,14	0,00
01.002.014	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e encerramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	767,00		0,00	0,00	767,00	R\$ 38,68	R\$ 29.667,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.667,56	0,00
01.002.015	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco branco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada acil, rejuntado, exclusive esquadriação de base ou emboco	m2	343,42		100,00	100,00	243,42	R\$ 58,65	R\$ 20.141,58	R\$ -	R\$ 5.865,00	R\$ 5.865,00	R\$ 14.276,58	29,12
01.002.016	Cobertura de cimento, tipo "escama", dim. 40 x 40cm	m2	17,50		0,00	0,00	17,50	R\$ 137,24	R\$ 2.401,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.401,70	0,00
01.002.017	Madameiro em massa, com acabamento em massa, exclusive aparelho, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive	m2	75,68		0,00	0,00	75,68	R\$ 101,54	R\$ 7.694,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.694,55	0,00
01.002.018	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualidade, cor clara, labialíntica ou similar - Rev.02	m2	75,68		0,00	0,00	75,68	R\$ 37,85	R\$ 2.864,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.864,49	0,00
01.002.019	Forno de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Alator ou similar, instalado - Rev.05 10/2021	m2	509,45		0,00	0,00	509,45	R\$ 50,77	R\$ 25.864,78	R\$ -	R\$ 739,02	R\$ 739,02	R\$ 25.125,76	7,60
01.003	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS								R\$ 9.857,27	R\$ -	R\$ 739,02	R\$ 739,02	R\$ 9.118,25	7,60
01.003.001	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	5,00		0,00	0,00	5,00	R\$ 33,70	R\$ 168,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 168,50	0,00

Engº Civil
Arnildo Almeida Meira

Engenheiro
CPF: 054.561.797/651-2

E&P
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA

Rua Francisco Portugal nº 529 - Salgado Filho ARAÇUAJ-SE
CNPJ - 42.348.741/0001-08

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU / SE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
CNPJ - 13.086.039-0001-81

PLANILHA DE MEDIÇÃO 01															CONTRATO Nº 56/2024	
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/04/2024 até 19/05/2024															DATA DA MEDIÇÃO: 20/05/2024	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	ACUMUL. ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMUL. ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMUL. ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	(%)		
01.003.002	Revisão de ponto de água tipo 1	un	5,00		5,00	5,00	0,00	R\$ 25,02	R\$ 125,10	R\$ -	125,10	R\$ 125,10	R\$ -	100,00		
01.003.003	Ponto de água fria embutido, material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	6,00		6,00	6,00	0,00	R\$ 102,32	R\$ 613,92	R\$ -	613,92	R\$ 613,92	R\$ -	100,00		
01.003.004	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	3,00			0,00	3,00	R\$ 67,10	R\$ 201,30	R\$ -		R\$ -	R\$ 201,30	0,00		
01.003.005	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	5,00			0,00	5,00	R\$ 84,79	R\$ 423,95	R\$ -		R\$ -	R\$ 423,95	0,00		
01.003.006	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=590 litros)	un	1,00			0,00	1,00	R\$ 1.849,90	R\$ 1.849,90	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.849,90	0,00		
01.003.007	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,00 x 0,80 m	un	1,00			0,00	1,00	R\$ 1.670,45	R\$ 1.670,45	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.670,45	0,00		
01.003.008	Fornecimento de tubo de pvc prede coletora esgoto, JET, PB, dn = 100mm (Vitrifort - Tigre ou similar) - Rev. 02	m	28,00			0,00	28,00	R\$ 26,59	R\$ 744,52	R\$ -		R\$ -	R\$ 744,52	0,00		
01.003.009	Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,30 x 0,65m	un	1,00			0,00	1,00	R\$ 421,97	R\$ 421,97	R\$ -		R\$ -	R\$ 421,97	0,00		
01.003.010	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m	un	6,00			0,00	6,00	R\$ 464,86	R\$ 2.789,16	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.789,16	0,00		
01.003.011	Tubo pvc rígido canal borracha, serie normal, plésgoto predial, d = 40mm	m	50,00			0,00	50,00	R\$ 16,97	R\$ 848,50	R\$ -		R\$ -	R\$ 848,50	0,00		
01.004	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS															
01.004.001	Revisão de ponto de luz tipo 1, em tecto ou parede	pt	30,00		10,00	10,00	20,00	R\$ 27,67	R\$ 71.505,45	R\$ -		R\$ 18.389,02	R\$ 53.116,43	28,7		
01.004.002	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	70,00		15,00	15,00	55,00	R\$ 103,38	R\$ 7.236,60	R\$ -		R\$ 276,70	R\$ 553,40	33,3		
01.004.003	Ponto de luz em tecto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	14,00		8,00	8,00	6,00	R\$ 283,72	R\$ 3.972,08	R\$ -		R\$ 2.269,76	R\$ 1.702,32	57,1		
01.004.004	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	un	14,00			0,00	14,00	R\$ 252,00	R\$ 3.528,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.528,00	0,00		
01.004.005	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e eletroamento	pt	16,00			0,00	16,00	R\$ 262,88	R\$ 4.206,08	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.206,08	0,00		
01.004.006	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto eletroduto Ø 3/4", inclusive eletroamento	pt	25,00		10,00	10,00	15,00	R\$ 300,35	R\$ 7.508,75	R\$ -		R\$ 3.003,50	R\$ 4.505,25	40,0		
01.004.007	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 910 w / hvolt - Rev 01	un	84,00		38,00	38,00	46,00	R\$ 77,27	R\$ 6.490,68	R\$ -		R\$ 2.936,26	R\$ 3.554,42	45,5		
01.004.008	Poste decorativo 2 pátulas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	12,00			0,00	12,00	R\$ 1.700,20	R\$ 20.402,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 20.402,40	0,00		
01.004.009	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão NEMA (Amarcario - linha preta)	un	30,00		10,00	10,00	20,00	R\$ 49,21	R\$ 1.476,30	R\$ -		R\$ 492,10	R\$ 984,20	33,3		
01.004.010	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europau - linha branca), curva B	un	25,00			0,00	25,00	R\$ 55,25	R\$ 1.381,25	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.381,25	0,00		
01.004.011	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3,00			0,00	3,00	R\$ 230,03	R\$ 690,09	R\$ -		R\$ -	R\$ 690,09	0,00		
01.004.012	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	500,00		500,00	500,00	0,00	R\$ 7,04	R\$ 3.520,00	R\$ -		R\$ 3.520,00	R\$ -	100,00		
01.004.013	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	500,00		500,00	500,00	0,00	R\$ 8,68	R\$ 4.340,00	R\$ -		R\$ 4.340,00	R\$ -	100,00		
01.004.014	Projeto elétrico	un	1,00			0,00	1,00	R\$ 5.923,12	R\$ 5.923,12	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.923,12	0,00		
01.005	PAVIMENTAÇÃO															
01.005.001	Remoção e reposição de pavimentação e paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	200,00			0,00	200,00	R\$ 50,12	R\$ 10.024,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 10.024,00	0,00		
01.005.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	50,00			0,00	50,00	R\$ 81,91	R\$ 4.095,50	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.095,50	0,00		
01.005.003	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	800,00			0,00	800,00	R\$ 8,69	R\$ 6.952,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 6.952,00	0,00		
01.006	ESQUADRIAS															
01.006.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	20,00			0,00	20,00	R\$ 83,78	R\$ 1.675,60	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.675,60	0,00		
01.006.002	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	10,00			0,00	10,00	R\$ 119,79	R\$ 1.197,90	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.197,90	0,00		
01.006.003	Revisão de esquadria de ferro	m2	20,00			0,00	20,00	R\$ 107,74	R\$ 2.154,80	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.154,80	0,00		

Romildo Almeida Meira
Engº Civil
RPM-7757-53-5

Engenheiro Civil
CREA-SE 217157651-2

PLANILHA DE MEDIÇÃO 01														CONTRATO Nº 56/2024	
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/04/2024 até 19/05/2024														DATA DA MEDIÇÃO: 20/05/2024	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	ACUMUL. ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMUL. ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMUL. ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	(%)	
01.006.004	Kil de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens incluídos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação, af. 12/2019	un	25,00			0,00	25,00	R\$ 914,16	R\$ 22.854,00						
01.006.005	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	19,44			0,00	19,44	R\$ 16,61	R\$ 322,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.854,00	0,00	
01.006.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	20,00			0,00	20,00	R\$ 16,86	R\$ 337,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 322,90	0,00	
01.006.007	Portão em tubo de aço galvanizado de 1", padrão escolas	m2	9,20			0,00	9,20	R\$ 246,39	R\$ 2.266,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 337,20	0,00	
01.006.008	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens, exclusive alisar, acabamento e contramarcos.	m2	50,00			0,00	50,00	R\$ 472,82	R\$ 23.641,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.266,79	0,00	
01.006.009	Porta em alumínio, cor NPB/R, tipo pantográfica, inclusive fechadura	m2	15,12			0,00	15,12	R\$ 272,91	R\$ 4.126,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.641,00	0,00	
01.007.001	PAISAGISMO	m2	100,00			0,00	100,00	R\$ 16,03	R\$ 1.603,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.126,40	0,00	
01.008.001	Vaso sanitário c/box de descarga acoplada, linha versato 07953/0750, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07953 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	8,00			0,00	8,00	R\$ 600,17	R\$ 4.801,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.603,00	0,00	
01.008.002	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/box de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 373,22	R\$ 746,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.801,36	0,00	
01.008.003	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0,60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopla 10 cm, assentada	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 1.777,42	R\$ 3.554,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 746,44	0,00	
01.008.004	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0,80x0,60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopla 10 cm, assentada.	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 771,81	R\$ 1.543,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.554,84	0,00	
01.009.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	8,00			0,00	8,00	R\$ 170,97	R\$ 1.367,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.543,62	0,00	
01.009.002	Placa de insonorização de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00			0,00	1,00	R\$ 1.235,91	R\$ 1.235,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.367,76	0,00	
01.009.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso lido de alvenaria/direcional.	un	3,00			0,00	3,00	R\$ 371,07	R\$ 1.113,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.235,91	0,00	
01.010.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revitado 08/2015	m2	210,30			0,00	210,30	R\$ 6,76	R\$ 1.421,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.113,21	0,00	
01.010.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:1:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	210,30			0,00	210,30	R\$ 31,78	R\$ 6.683,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.421,63	0,00	
01.010.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	210,20			0,00	210,20	R\$ 17,06	R\$ 3.586,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.683,33	0,00	
TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 386.392,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.077,86	R\$ 3.586,01	0,00	
													R\$ 30.077,86	7,78	


 Romildo Almeida Meira
 Engº Civil
 PN: 2709-753-5


 Romildo Almeida Meira
 Engº Civil
 PN: 2709-753-5



Rua Francisco Portugal nº 529 - Salgado Filho ARAÇUAJ-SE
 CNPJ : 42.348.741/0001-08
 OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU / SE.
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
 CNPJ: 13.095.038-0001-81

DATA: 20/05/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATO: 56/2024

MEDIÇÃO Nº: 01

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE
ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ.



FOTO 1 – DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO

Manoel Almeida Meira
Engenheiro Civil
CREA-SE 37.000.87651-2

Ronmildo Almeida Meira
Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil

RN: 2706-753-5



FOTO 2 – ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO;

[Handwritten signature]

Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 2703-753-5

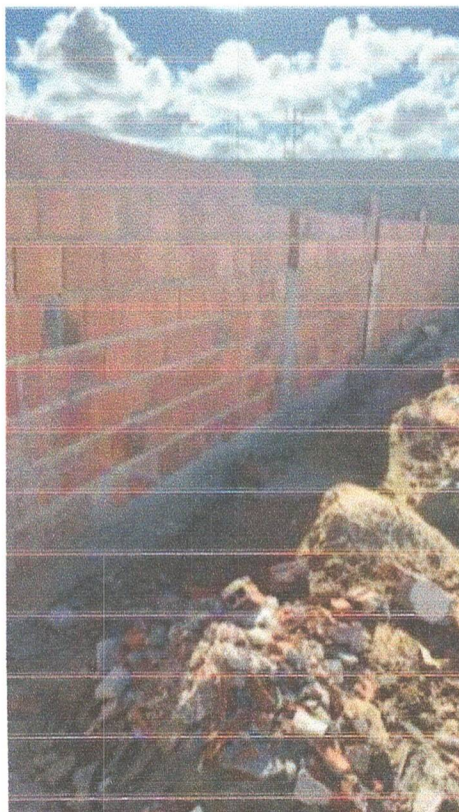


FOTO 3 – ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO;

Manoel dos Santos Neto
Engenheiro Civil
CPEA-SE 271797661-2

[Handwritten signature]

Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 2703-753-5

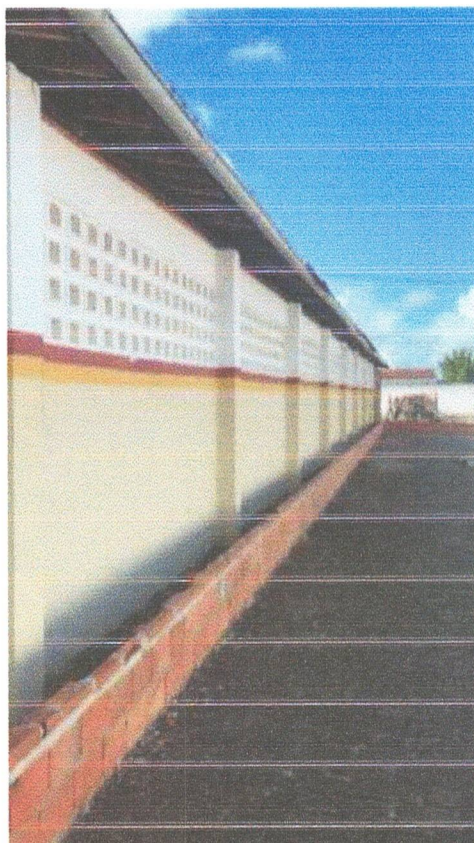


FOTO 4 – ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO;

[Signature]
Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27.63-753-5
[Signature]
Manoel A. Soares Neto
Engenheiro Civil
CPEA-SE 27/797661-2



FOTO 5 – ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO;

[Signature]
Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27.63-753-5



FOTO 6 – ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO;



FOTO 7 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;

Ronildo Almeida Meira
Engº Civil
R.N. 17.06-760-5

Ronildo Almeida Meira
Engº Civil
CREA-SE 27.179760-5

Ronildo Almeida Meira
Engº Civil
R.N. 17.06-760-5

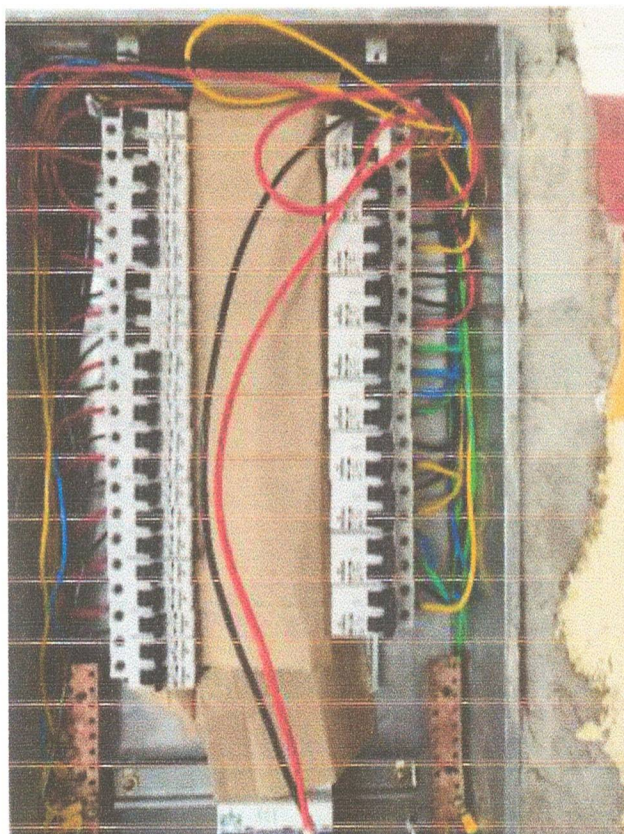


FOTO 8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;

[Handwritten signature]

Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27.034.758-5



FOTO 9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; REVESTIMENTO CERÂMICO;

[Handwritten signature]

Mancel Messias Melo
Engenheiro
CREA-SE 271797651-2

[Handwritten signature]

Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27.034.758-5



FOTO 10 – REVESTIMENTO CERÂMICO;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Ronmildo Almeida Meira
 Engº Civil
 RN: 27.557-5



FOTO 11 – DEMOLIÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;

[Handwritten signature]
Manoel Marcos Soares Neto
 Engº Civil
 CPF nº 271.797.661-2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Ronmildo Almeida Meira
 Engº Civil
 RN: 27.557-5



FOTO 12 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ENTRADA);

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Ronmildo Almeida Meira
 Engº Civil
 RN: 27034758-5



FOTO 13 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ENTRADA);

[Handwritten signature]
Manoel Mesquita Soares Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 271797661-2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Ronmildo Almeida Meira
 Engº Civil
 RN: 27034758-5



FOTO 14 - REVESTIMENTO CERÂMICO;

[Handwritten signature]

Ronildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5



FOTO 15 - REVESTIMENTO CERÂMICO;

[Handwritten signature]
Manoel Soares Neto
Engenheiro Civil
CREA-SE 271/97661-2

[Handwritten signature]

Ronildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.018.83245/72	Nome da obra UNIDADE MARIO TRINDADE CRUZ	Data do cadastramento 16/04/2024 15:50
Origem do cadastramento e-CAC		
Tipo Zona Zona Rural	ART SE20240375397	RRT CIB 0000000-0
Cadastro Imobiliário		
Data do início da obra 02/04/2024	CNAE 4120400 Construção de edifícios	

Situação da obra

Situação Ativa	Data 02/04/2024
-------------------	--------------------

Endereço

País BRASIL	Município PIRAMBU	UF SE	CEP 49.190-000
Bairro CENTRO	Logradouro RUA GIVALDO MOURA DA SILVA	Número 85	Complemento CASA

Responsável

Nome E & P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ 42.348.741/0001-08	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 02/04/2024	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
13.095.039/0001-81	MUNICIPIO DE PIRAMBU

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Galpão industrial	Mista	50,00 m²
Reforma	Galpão industrial	Mista	50,00 m²

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Existente	Galpão industrial	Mista	Quadra Esportiva e Poliesportiva	30,00 m²	20,00 m²	50,00 m²
Reforma	Galpão industrial	Mista	Quadra Esportiva e Poliesportiva	30,00 m²	20,00 m²	50,00 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra

100,00 m²

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 02/04/2024

MANHÃ x
TARDE x
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	01	AJUDANTE GERAL	03	MOTONIVELADORA	01
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	01	ARMADOR	01	RETRO ESCAVADEIRA	01
TÉCNICO DE SEGURANÇA	01	CARPINTEIRO	01	CAMINHÃO BASCULANTE	01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01	PEDREIRO	01	CAMINHÃO MUNCK	01
COMPRADOR	01	SOLDADOR	01	GUINDASTE	01
ORÇAMENTISTA	01				

TAREFAS REALIZADAS

- Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021
- Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento
- Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
RN: 27034758-5
Eng. Civil
Ronildo Almeida Meira

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 03/04/2024

MANHÃ x
TARDE x
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	01	AJUDANTE GERAL	03	MOTONIVELADORA	01
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	01	ARMADOR	01	RETRO ESCAVADEIRA	01
TÉCNICO DE SEGURANÇA	01	CARPINTEIRO	01	CAMINHÃO BASCULANTE	01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01	PEDREIRO	01	CAMINHÃO MUNCK	01
COMPRADOR	01	SOLDADOR	01	GUINDASTE	01
ORÇAMENTISTA	01				

TAREFAS REALIZADAS

- Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento
- Escavação manual de vaia ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m
-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
R.N: 27034758-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 04/04/2024

MANHÃ	x			
TARDE		x		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	03	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	___	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento
- Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m
-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
R.N.: 37.647-58-5

CONTRATADA

CONTRATANTE



E&P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
RUA FRANCISCO PORTUGAL, Nº 529, SALGADO FILHO, ARACAJU-SE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 05/04/2024



MANHÃ x
TARDE x
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	05	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	___	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento
- Escavação manual de vaia ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m
-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Ronildo Almeida Meira
Engº Civil
R.: 27034-758-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 08/04/2024



MANHÃ x
TARDE x
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	03	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	___	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte
-
-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
R.N.: 270347858-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 09 / 04 / 2024

MANHÃ
TARDE
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	09	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	___	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte
-
-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
R.N.: 270347858-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 10/04/2024

MANHÃ
TARDE
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	03	MOTONIVELADORA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA					

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pádiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 11/04/2024



MANHÃ		x		
TARDE		x		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	03	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	___	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09
- 2) Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
- 3) Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 270347858-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 12/04/2024

MANHÃ
TARDE
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	01	ASSISTENTE GERAL	05	MOTONIVELADORA	01
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	01	ARMADOR	01	RETRO ESCAVADEIRA	01
TÉCNICO DE SEGURANÇA	01	CARPinteIRO	01	CAMINHÃO BASCULANTE	01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01	PEDREIRO	01	CAMINHÃO MUNCK	01
COMPRADOR	01	SOLDADOR	01	GUINDASTE	01
ORÇAMENTISTA	01				

TAREFAS REALIZADAS

- Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09
- Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
- impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm
-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 270347858-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 15/04/2024

MANHÃ x
TARDE x
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	03	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	___	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09
- Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
- Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronmilão Almeida Meira
Eng° Civil
RN: 27034758-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 16/04/2024

MANHÃ x
TARDE x
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	03	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	___	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09
- Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
- Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm
-
-
-
-
-
-
-

OCCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 270347858-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA:
17/04/2024



MANHÃ		x	
TARDE		x	
NOITE			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	05	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	___	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09
- Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
- Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm
-
-
-
-
-
-

OCCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 270347858-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA:
18/04/2024



MANHÃ	x			
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	03	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	___	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada acilil, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço
- 2) Revisão de ponto de água tipo 1
- 3) Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 19/04/2024

MANHÃ x
TARDE x
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	03	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	___	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada acilil, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço
- 2) Revisão de ponto de água tipo 1
- 3) Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil

RN: 27034758-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 22/04/2024

MANHÃ x

TARDE x

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	03	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	___	CAMINHÃO MUNCK	___
CÔMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada aciii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço
- Revisão de ponto de água tipo 1
- Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronmildo Almeida Meira

Engº Civil

RN: 270347858-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE
ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO
MUNICÍPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 23/04/2024

MANHÃ x
TARDE x
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	03	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	___	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada aciii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço
- Revisão de ponto de água tipo 1
- Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE
ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO
MUNICÍPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 24/04/2024

MANHÃ x
TARDE x
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	03	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTeiro	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	___	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada aciii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço
- 2) Revisão de ponto de água tipo 1
- 3) Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 270347858-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE
ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO
MUNICÍPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 25/04/2024

MANHÃ x
TARDE x
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	03	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	___	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada acii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço
- 2) Revisão de ponto de água tipo 1
- 3) Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 270347858-5

CONTRATADA

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 26/04/2024

MANHÃ		x		
TARDE		x		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	03	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	___	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada acilii. rejuntado. exclusive regularização de base ou emboço
- 2) Revisão de ponto de água tipo 1
- 3) Ponto de água fria embutido, c/materiai pvc rigido soidávei Ø 25mm
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 29/04/2024

MANHÃ TARDE NOITE

☀ ☁ ☔ ☁

x x

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	03	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	___	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada acili, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço
- 2) Revisão de ponto de água tipo 1
- 3) Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 30/04/2024

MANHÃ
TARDE
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	05	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	___	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada acii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço
- Revisão de ponto de água tipo 1
- Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034752-5

CONTRATADA

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 01/05/2024

MANHÃ
TARDE
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	03	MOTONIVELADORA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA					

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada acilii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço
- 2) Revisão de ponto de água tipo 1
- 3) Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
R.N: 270347858-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 02/05/2024

MANHÃ
TARDE
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	01	AJUDANTE GERAL	03	MOTONIVELADORA	01
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	01	ARMADOR	01	RETRO ESCAVADEIRA	01
TÉCNICO DE SEGURANÇA	01	CARPINTEIRO	01	CAMINHÃO BASCULANTE	01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01	PEDREIRO	01	CAMINHÃO MUNCK	01
COMPRADOR	01	SOLDADOR	01	GUINDASTE	01
ORÇAMENTISTA	01				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede
- 2) Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação
- 3) Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
R.: 270347858-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 03/05/2024

MANHÃ
TARDE
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	01	AJUDANTE GERAL	03	MOTONIVELADORA	01
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	01	ARMADOR	01	RETRO ESCAVADEIRA	01
TÉCNICO DE SEGURANÇA	01	CARPINTEIRO	01	CAMINHÃO BASCULANTE	01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01	PEDREIRO	01	CAMINHÃO MUNCK	01
COMPRADOR	01	SOLDADOR	01	GUINDASTE	01
ORÇAMENTISTA	01				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede
- 2) Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação
- 3) Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
R.N. 270347858-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 06/05/2024    

MANHÃ		x		
TARDE		x		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	05	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	___	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede
- 2) Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação
- 3) Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronildo Almeida Meira
Engº Civil
R.N. 270347858-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 07/05/2024

MANHÃ x
TARDE x
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	01	AJUDANTE GERAL	03	MOTONIVELADORA	01
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	01	ARMADOR	01	RETRO ESCAVADEIRA	01
TÉCNICO DE SEGURANÇA	01	CARPINTEIRO	01	CAMINHÃO BASCULANTE	01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01	PEDREIRO	01	CAMINHÃO MUNCK	01
COMPRADOR	01	SOLDADOR	01	GUINDASTE	01
ORÇAMENTISTA	01				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede
- 2) Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação
- 3) Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronildo Almeida Meira
Eng° Civil
RN: 27034758-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA:
08/09/2024



MANHÃ
TARDE
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	01	AJUDANTE GERAL	03	MOTONIVELADORA	01
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	01	ARMADOR	01	RETRO ESCAVADEIRA	01
TÉCNICO DE SEGURANÇA	01	CARPinteIRO	01	CAMINHÃO BASCULANTE	01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01	PEDREIRO	01	CAMINHÃO MUNCK	01
COMPRADOR	01	SOLDADOR	01	GUINDASTE	01
ORÇAMENTISTA	01				

TAREFAS REALIZADAS

- Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede
- Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação
- Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA:
__09__/_05_/2024



MANHÃ	x			
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	03	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	___	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento
- 2) Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01
- 3) Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 10/05/2024

MANHÃ ☀️
TARDE ☁️
NOITE ☁️

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	03	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	___	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento
- Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01
- Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 13/05/2024

MANHÃ x
TARDE x
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	01	AJUDANTE GERAL	03	MOTONIVELADORA	01
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	01	ARMADOR	01	RETRO ESCAVADEIRA	01
TÉCNICO DE SEGURANÇA	01	CARPINTEIRO	01	CAMINHÃO BASCULANTE	01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01	PEDREIRO	01	CAMINHÃO MUNCK	01
COMPRADOR	01	SOLDADOR	01	GUINDASTE	01
ORÇAMENTISTA	01				

TAREFAS REALIZADAS

- Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento
- Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bívolt - Rev 01
- Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA:
14/05/2024



MANHÃ	x		
TARDE		x	
NOITE			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	03	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	___	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C
- 2) Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 19/05/2024



MANHÃ x
TARDE x
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	03	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	___	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Fio rígido isolado em pvc 2,5mm² (fio 12) - 450/750v / 70°C
- 2) Fio rígido isolado em pvc 4,0mm² (fio 10) - 450/750v / 70°C
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA:
10 / 05 / 2024



MANHÃ x
TARDE x
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	03	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	___	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- Fio rígido isolado em pvc 2,5mm² (fio 12) - 450/750v / 70°C
- Fio rígido isolado em pvc 4,0mm² (fio 10) - 450/750v / 70°C
-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 02/04/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 19/05/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA:
17/05/2024



MANHÃ	x			
TARDE		x		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	01	AJUDANTE GERAL	05	MOTONIVELADORA	01
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	01	ARMADOR	01	RETRO ESCAVADEIRA	01
TÉCNICO DE SEGURANÇA	01	CARPINTEIRO	01	CAMINHÃO BASCULANTE	01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01	PEDREIRO	01	CAMINHÃO MUNCK	01
COMPRADOR	01	SOLDADOR	01	GUINDASTE	01
ORÇAMENTISTA	01				

TAREFAS REALIZADAS

- Fio rígido isolado em pvc 2,5mm² (fio 12) - 450/750v / 70°C
- Fio rígido isolado em pvc 4,0mm² (fio 10) - 450/750v / 70°C
-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronmildo Almeida Meira
Eng° Civil
RN: 27034758-5

CONTRATADA

CONTRATANTE



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 473645/2024
Emissão: 02/05/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 3zDDY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: RONMILDO ALMEIDA MEIRA

Registro: 2703478585

CPF: 150.***-**-15

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 28/04/1983

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUCAO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Data de Formação: 07/01/1983

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de infração

Nada consta





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE**Nº 473671/2024****Emissão: 02/06/2024****Validade: 30/06/2024****Chave: C64WC****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: E & P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 42.348.741/0001-08

Registro: 0000187088

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 350.000,00

Data do Capital: 23/02/2023

Faixa: 3

Objetivo Social Pleno: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA: AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES EM BAIXA TENSÃO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL. OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Endereço Matriz: RUA FRANCISCO PORTUGAL, 529, SALGADO FILHO, ARACAJU, SE, 49020380

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 07/10/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000018786DDSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8263131888. Data de vencimento do boleto: 30/06/2024
- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RONILDO ALMEIDA MEIRA

Registro: 2703478585

CPF: 150.888.888-15

Data Início: 08/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240375397

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

RONILDO ALMEIDA MEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2703478585

Registro: 0000003006SE

Empresa contratada: **E & P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Registro : 0000187089-SE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU**

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

RUA GIVALDO MOURA DA SILVA

Nº: 85

Complemento: **CASA**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Pirambu**

UF: **SE**

CEP: 49190000

Contrato: 022024

Celebrado em: 21/03/2024

Valor: **R\$ 388.392,54**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Órgão Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA GIVALDO MOURA DA SILVA

Nº: 85

Complemento: **CASA**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Pirambu**

UF: **SE**

CEP: 49190000

Data de Início: 02/04/2024

Previsão de término: 02/09/2024

Coordenadas Geográficas: -10.738505, -36.858141

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: 102

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU**

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO

50,00

m2

> #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Prestação de serviços na reforma e ampliação da unidade de ensino Mário Trindade Cruz localizada neste município de Pirambu - Sergipe.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SERGIPE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Ronildo Almeida Meira
RONILDO ALMEIDA MEIRA - CPF: 150.863.645-15

_____, _____ de _____ de _____

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU - CNPJ: 13.095.039/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 262,55**

Registrada em: 15/04/2024

Valor pago: **R\$ 262,55**

Nosso Número: 8203110106

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CD1xA
 Impresso em: 16/04/2024 às 10:51:34 por: ip: 177.207.36.252

www.crea-se.org.br

crea-se@crea-se.org.br

Tel: 3234-3000

Fax: XXXX-XXXX

CREA-SE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia de Sergipe



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.348.741/0001-08
Razão Social: E E P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Endereço: R WILSON BARBOSA DE MELO 23 PAVMOTERREO / ATALAIA / ARACAJU / SE / 49037-590

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/04/2024 a 24/05/2024

Certificação Número: 2024042508191144285237

Informação obtida em 07/05/2024 16:17:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 21 de Maio de 2024
Nº. 202400499716

CNPJ: 42.348.741/0001-08

Contribuinte: E P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 19/08/2024 ✓

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: EI.0048.0018.BI.081C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: E & P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 42.348.741/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. **constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e**
2. **não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).**

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:45:31 do dia 20/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/09/2024.

Código de controle da certidão: 8A84.FDC5.9A07.A7C8

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 189487 / 2024

Identificação do Contribuinte: 42.348.741/0001-08

Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **42.348.741/0001-08** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **42.348.741/0001-08** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria N° 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **23/04/2024**, válida até **23/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240423NW0FVZ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E & P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.348.741/0001-08

Certidão n°: 19147953/2024

Expedição: 20/03/2024, às 08:47:28

Validade: 16/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que E & P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 42.348.741/0001-08, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: E & P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			Protocolo: SEC2401093680		
NIRE : 28600112709 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 28600112709		CNPJ 42.348.741/0001-08		Data de Ato Constitutivo 16/06/2021	
Início de Atividade 15/06/2021					
Endereço Completo Rua FRANCISCO PORTUGAL, Nº 529, SALGADO FILHO - Aracaju/SE - CEP 49020-390					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMÍLIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA					
Capital Social R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
EDMILSON PEQUENO DOS SANTOS	654.570.805-87	R\$ 350.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
EDMILSON PEQUENO DOS SANTOS	654.570.805-87	Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação
Data	Número	Ato/eventos			ATIVA
29/08/2023	20230331750	223 / 223 - BALANÇO			Status
					SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/01/2024, às 16:04:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.agiliza.se.gov.br>, com o código XPGMCJG1.



SEC2401093680

NAYARA SIQUEIRA BRITO
Secretário(a) Geral



Digital

Nome/Razão Social do Empregador
E P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Tag
42348741 04/2024 MENSAL

Penyeratan dan pemampatan

Observações


Water a recollector

Competência	Quantidade Empregadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTE	Total
04/2024	2	209,42	0,00	0,00	0,00	209,42
Total Geral:		209,42	0,00	0,00	0,00	209,42

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fotodigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
COMÉRCIO
E EMPREGO

**PEX Cooks & Cuts:**

<http://www.biorxiv.org/content/early/2017/09/28/196243v1.full.pdf>

Richard L. Lamm

[http://www.mim.gov.hk/eng/v2/vobv/4268303163793124.htm#7162525dab1](#)

Comprovante Pagamento Pix



AUTENTICAÇÃO

Tipo Pagamento Pix
Nº Controle 2024050898800005027
ID da Transação E1300971720240508143006
736900512
Data e hora 08/05/2024 às 11:31:22

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID Transação E1300971720240508143006
736900512
Situação Efetivado
Valor do Pagamento R\$ 209,42
Descrição Fgts da E&P

DADOS DO PAGADOR

Pagador E & P Construcoes E
Servicos Ltda
Instituição Bco do Est. de Se S.A.
CNPJ 42.348.741/0001-08
Agência 028 Conta 03104418-2
Tipo Conta Corrente

DADOS DO RECEBEDOR

Recebedor Caixa Economica Federal
CNPJ 00.360.305/0001-04
Instituição Caixa Economica Federal

TELEFONES PARA CONTATO

Alô Banese (79) 3218-2020
SAC Banese 0800 021 9013
Ouvidoria 0800 021 9009

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banese e informe o N° de Controle deste comprovante.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura _/_/____			
Empresador E & P CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI		Inscrição CNPJ: 42.348.741/0001-08	Admissão 30/06/2023	Competência Abril de 2024	
Empregado 000005 EDVAL SANTOS SILVA		Cargo AJUDANTE DE OBRA	Lotação OPERACIONAL		
PIS 20036848918	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	62,04		
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
310	INSS	7,5%		98,83	
321	Falta	1 dia(s)		47,07	
349	DSR Desconto			47,07	
			Total de Proventos 1.474,04	Total de Descontos 192,97	
				Líquido a Receber 1.281,07	
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.317,86	Base de Cálculo do FGTS 1.317,86	FGTS 105,42	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura _/_/____			
Empresador E & P CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI		Inscrição CNPJ: 42.348.741/0001-08	Admissão 30/06/2023	Competência Abril de 2024	
Empregado 000005 EDVAL SANTOS SILVA		Cargo AJUDANTE DE OBRA	Lotação OPERACIONAL		
PIS 20036848918	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	62,04		
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
310	INSS	7,5%		98,83	
321	Falta	1 dia(s)		47,07	
349	DSR Desconto			47,07	
			Total de Proventos 1.474,04	Total de Descontos 192,97	
				Líquido a Receber 1.281,07	
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.317,86	Base de Cálculo do FGTS 1.317,86	FGTS 105,42	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura _/_/____			
Empreendedor E & P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		Inscrição CNPJ: 42.348.741/0001-06		Admissão 05/04/2024	Competência Abril de 2024
Empregado 000008 MAX MELO FONSECA		Cargo SUPERVISOR(A)		Lotação administrativa	
PIS 12893691767	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	26 dia(s)	1.300,00		
310	INSS	7,5%		97,50	
			Total de Proventos 1.300,00	Total de Descontos 97,50	
				Líquido a Receber 1.202,50	
Salário Contratual 1.500,00	Base de Cálculo do INSS 1.300,00	Base de Cálculo do FGTS 1.300,00	FGTS 104,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura _/_/____			
Empreendedor E & P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		Inscrição CNPJ: 42.348.741/0001-06		Admissão 05/04/2024	Competência Abril de 2024
Empregado 000008 MAX MELO FONSECA		Cargo SUPERVISOR(A)		Lotação administrativa	
PIS 12893691767	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	26 dia(s)	1.300,00		
310	INSS	7,5%		97,50	
			Total de Proventos 1.300,00	Total de Descontos 97,50	
				Líquido a Receber 1.202,50	
Salário Contratual 1.500,00	Base de Cálculo do INSS 1.300,00	Base de Cálculo do FGTS 1.300,00	FGTS 104,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empresador E & P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		Inscrição CNPJ: 42.348.741/0001-08		Admissão 05/04/2024	Competência Abril de 2024
Empregado 000009 EDMILSON PEQUENO DOS SANTOS		Cargo ADM DE EMPRESAS			Lotação administrativa
PIS 20004616000	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
322	Pro-labore		2.824,00		
310	INSS	11%		310,64	
			Total de Proventos 2.824,00	Total de Descontos 310,64	
				Líquido a Receber 2.513,36	
Salário Contratual 2.824,00	Base de Cálculo do INSS 2.824,00	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empresador E & P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		Inscrição CNPJ: 42.348.741/0001-08		Admissão 05/04/2024	Competência Abril de 2024
Empregado 000009 EDMILSON PEQUENO DOS SANTOS		Cargo ADM DE EMPRESAS			Lotação administrativa
PIS 20004616000	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
322	Pro-labore		2.824,00		
310	INSS	11%		310,64	
			Total de Proventos 2.824,00	Total de Descontos 310,64	
				Líquido a Receber 2.513,36	
Salário Contratual 2.824,00	Base de Cálculo do INSS 2.824,00	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.348.741 Nome Empregador: E P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050707767107-1

Entidade por: 42.348.741/0001-08 - E P CONSTRUÇÕES E

Cid. Trabalhadores: 2

Origem: Gestão de Guias

Data Emissão: 07/05/2024 15:02:46 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 42.348.741/0001-08		Tomador: 90.018.83131/72											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Dep. Scto	Base Remuneração	Valor FGTS	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		MAX MELO FONSECA	01309734563101050420240101	013087.345-93	161	20/05/2024	Mensal	1.340,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
Total do Tomador								1.340,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
Total do Estabelecimento								2.617,86	209,42	0,00	0,00	0,00	209,42
Total da Guia								2.617,86	209,42	0,00	0,00	0,00	209,42

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

42.348.741

Nome Empregador:

E P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores:

2

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2024

Número da Guia:

0124050707767107-1

Emitida por:

42.348.741/0001-08 - E P CONSTRUCOES E

Data Emissão:

07/05/2024 15:02:46 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		42.348.741/0001-08	Tomador:		90.018.83245/72										
Comp. Ajustado	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
04/2024		EDVAL SANTOS SILVA	01511037560101300620230101	015.110.575-80	101	2005/2024	Mensal	1.317,86	105,42	0,00	0,00	0,00	105,42		
Total do Tomador								1.317,86	105,42	0,00	0,00	0,00	105,42		
Total do Estabelecimento								2.617,86	209,42	0,00	0,00	0,00	209,42		
Total da Guia								2.617,86	209,42	0,00	0,00	0,00	209,42		



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.348.741 Nome Empregador: E P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050707767107-1 Emitida por: 42.348.741/0001-08 - E P CONSTRUÇÕES E
Cnd. Trabalhadores: 2 Origem: Gestão de Guias
Data Emissão: 07/05/2024 15:02:46 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Cnd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	42.348.741/0001-08	2	2.617,86	209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,42
Total da Guia			2.617,86	209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,42



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

Vencimento da Guia:

42.348,741

20/05/2024

Nome Empregador: E P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Número da Guia: 012405070767107-1

Qtd. Trabalhadores:

Data Emissão:

2

07/05/2024 15:02:46 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 42.348,741/0001-08										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	2	2.617,86	209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,42
Total da Guia			2.617,86	209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,42

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

42.348.741

Nome Empregador: E P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia:

20/05/2024

Numero da Guia:

012405070767107-1

Emitida por: 42.348.741/0001-08 - E P CONSTRUCOES E

Qtd. Trabalhadores:

2

Origem: Gestão de Guias

Data Emissão:

07/05/2024

15:02:46

(Brasília)

Tomador: 90.018.83131/72

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1	1.300,00	104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
Total do Tomador	90.018.83131/72	1.300,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
Tomador:	90.018.83245/72								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1	1.317,86	105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,42
Total do Tomador	90.018.83245/72	1.317,86	105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,42
Total da Guia		2.617,86	209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,42

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	E & P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CNPJ	42.348.741/0001-08
Período apuração	04/2024	Número do Recibo	50000228647270
Data/Hora da Transmissão	07/05/2024 14:57:21	Identificação da Apuração de Débitos	72673274 / Reinf CP 25751581576 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000228251989
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	FRANCISCO PORTUGAL	Número	529
Complemento	-	Bairro/Distrito	SALGADO FILHO
Município	ARACAJU	UF	SE
CEP	49020390	Telefone	7933033888
Correio Eletrônico	EEPCONSTRCOES.SERVICOS@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	EDMILSON PEQUENO DOS SANTOS	CPF	65457080587
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	EDMILSON PEQUENO DOS SANTOS		
CPF	65457080587	GRC	-
UF	-	Telefone	7933033888
Correio Eletrônico	washington.se@gmail.com		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	310,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 310,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	196,33		
Deduções	Salário Família: 62,04 Retenção Lei 9711/98: 134,29		
Saldo a Pagar	0,00		

