



Emissão de comprovantes

G3322112351342251
21/06/2024 12:42:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.30
2206302206 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME PIRAMBU-SE - FEB

AGENCIA: 2206-3 CONTA: 15.359-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME PIRAMBU-SE - FEB

BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.

AGENCIA: 0028-0 - SANTO ANTONIO

CONTA: 104.418-2

FAVORECIDO: E E P CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 42.348.741/0001-08

VALOR: R\$ 40.491,14

DEBITO EM: 21/06/2024

DOCUMENTO: 062101

AUTENTICACAO SISBB: B.148.EEF.9D2.D70.200

PAGO

Transação efetuada com sucesso por: JH648495 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO.



G332211235134225007
21/06/2024 12:41:45

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2206-3
Conta corrente 15359-1 SME PIRAMBU-SE - FEB

Creditado

Banco 47 BCO DO EST. DE SE S.A.
Agência (sem DV) 28 SANTO ANTONIO
Conta corrente (com DV) 1044182
CNPJ 42.348.741/0001-08
Nome favorecido E E P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.101
Valor 40.491,14
Destinação 0
Data transferência 21/06/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B148EEF9D2D70200

Assinada por	JH648496 FABRICIO MUNIZ DOS SANTOS	21/06/2024 12:32:13
	JH648495 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO	21/06/2024 12:41:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH648495 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO.



TED

G3382112251065041
21/06/2024 12:32:13

Debitado

Agência 2206-3
Conta corrente 15359-1 SME PIRAMBU-SE - FEB

Creditado

Banco 47 BCO DO EST. DE SE S.A.
Agência (sem DV) 28 SANTO ANTONIO
Conta corrente (com DV) 1044182
Conta Pagamento 0000
CNPJ 42.348.741/0001-08
Nome favorecido E E P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 40.491,14
Data transferência 21/06/2024

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 335985026.
Usuário: JH648496 FABRICIO MUNIZ DOS SANTOS.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

JUNHO/2024

Nota de Liquidação: 0621007 Fonte: 15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Data: 21/06/2024

FORNECEDOR

Nome: E & P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 42348741000108

Endereço: RUA FRANCISCO PORTUGAL, 529

Compl:

Bairro: SALGADO FILHO

Cidade: Aracaju

UF: SE

E-mail: e&pconstrcoes.servicos@gmail.com

Telefone: (79)33033-888

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Função: 12 Educação

SubFunção: 361 Ensino Fundamental

Programa: 0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Ação: 1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações

SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo

Fonte: 15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Marcador: 15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Centro Custo:

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0321001	21/03/2024	264.635,13	45.546,84	219.088,29

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MÁRIO TRINDADE CRUZ LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 56/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

NOTA FISCAL 0018/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MÁRIO TRINDADE CRUZ LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 56/2024.

Documento	Valor
Nota Fiscal (18 / Série: A / UF: SE / Emissão: 19/06/2024)	45.546,84

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	45.546,84
Retenção		Valor
21881010201-Inss		3.006,09
21881010403-Imposto de Renda - Outros rendimentos		683,20
21881010801-Iss		1.366,41

QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Retido:	5.055,70
Total Liquido:	40.491,14



Nº Processo
0000574

Nº Fila
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

TERMO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 42.348.741/0001-08

Nome: E & P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO PORTUGAL

Bairro: SALGADO FILHO

E-mail: e&pconstrcoes.servicos@gmail.com

Compl:

Cidade: Aracaju

Telefone: (79)33033-888

UF: SE

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Conta:

EMPENHO	EMIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	FONTE
0321001	21/03/2024	1012.44905100-15400001	Global	15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MÁRIO TRINDADE CRUZ LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 56/2024.

Documentação	
Nota Fiscal	18
Valor	R\$ 45.546,84
Emissão	19/06/2024
Horário de Entrega	21/06/2024 10:32:08

Para acompanhar o andamento do seu processo na fila pública, acesse o link abaixo:
<http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pirambu/fornecedor/filapagamento>

Cadastrado por: Santiago Santos Gois

☒ Aprovado

☐ Reprovado

Obs. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Nota: 2024000

00000018

Código Verificação
4TJ1-G28D



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

19/06/2024 09:12:45

Período de Competência

06/2024

Município de Prestação do
Serviço

Pirambu - SE

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte
(ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em
Pirambu

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

E & P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI LTDA

Nome Fantasia

E & P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CPF/CNPJ

42.348.741/0001-08

Inscrição Municipal

1320240

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

WASHINGTON.SE@GMAIL.COM

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 3303-3888

Endereço

Rua Wilson Barbosa de Melo, 23, PAVIMENTO TERREO, Atalaia - CEP: 49037-590 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PIRAMBU

CPF/CNPJ

13.095.039/0001-81

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

diretriz.cnt@gmail.com

Endereço

PRCA NOSSA SENHORA DE LURDES, 16 - Centro - CEP: 49190-000 - Pirambu - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao pagamento do Boletim de Medição nº 03 do contrato nº 56/2024,

SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ

SEMD 40% MATERIAL

SEMD 60% MÃO DE OBRA

DECLARO QUE
☒ Os serviços foram prestados
☐ Os produtos foram entregues
☐ A obra foi executada

Data: 21/06/2024
Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	3.006,09	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
45.546,84	18.218,73	0,00	*****	3,2500
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	42.540,75	45.546,84

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 6.126,05 Federal e R\$ 2.277,34 Municipal. Fonte: IBPT [691A69]

Visualizado em: 19/06/2024 09:12:46

Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.



FATURA/ NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº
202400000000018

DATA DE EMISSÃO: 19/06/2024

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU / SE

DEVE A:

E&P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, Empresa
com sede à RUA FRANCISCO PORTUGAL, Nº 529, SALGADO FILHO, ARACAJU-
SE, a importância de **R\$ 45.546,84 (quarenta e cinco mil, quinhentos e**
quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), referente ao pagamento do
Boletim de Medição nº 03 do contrato nº 56/2024, cujo objeto é REFORMA E
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ NO
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE BANESE

AGÊNCIA: 028

CONTA: 03/104418-2

RECIBO

R\$ 45.546,84

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE a importância de R\$
45.546,84 (quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e
quatro centavos) referente à quitação da nossa fatura acima.

Recebemos

Em: ____/____/____

EDMILSON PEQUENO DOS SANTOS

ADMINISTRADOR

E&P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CONTRATO Nº 56/2024												
PLANILHA DE MEDIÇÃO 03												
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 04/06/2024 até 14/06/2024												
DATA DA MEDIÇÃO: 17/06/2024												
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	ACUMUL. ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	VALOR TOTAL	PREÇO UNIT	SALDO A MEDIR	ACUMUL. ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	(%)
01	REFORMA DA ESCOLA MARIO TRINDEADE											
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES											
	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metal 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev.02 - 09/2021	un	1,00	1,00			R\$ 386.392,54			R\$ 121.757,41	R\$ 45.546,84	43,30
01.001.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	15,00	15,00			R\$ 3.530,92			R\$ 2.617,07	R\$ 547,50	89,62
01.001.002	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev.01	m2	67,40	67,40			R\$ 423,08			R\$ 423,08	R\$ -	100,00
01.001.003	Revest. 01	m2	90,68	90,68			R\$ 387,00			R\$ 387,00	R\$ -	100,00
01.001.004	Demolição de pavimento em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m	50,00	50,00			R\$ 1.806,99			R\$ 1.806,99	R\$ -	100,00
01.001.005	Revest. 01	m2	50,00	50,00			R\$ 366,35			R\$ 366,35	R\$ -	100,00
01.002	ELEVACOES											
01.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	3,12	3,12			R\$ 547,50			R\$ 547,50	R\$ -	100,00
01.002.002	Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 sacco cimento 50kg / 5 pedreiras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeccao mecanica e transporte Impermeabilizacao de alvenaria e viga de concreto com 1 demão de argamassa tipo Neutrol da Vedotec ou similar, inclusive argamassa impermeabilizadora esp=2cm	m3	3,12	3,12			R\$ 184.193,70			R\$ 66.710,14	R\$ 18.864,10	44,08
01.002.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2,3 (cimento:cal:areia), juntas 1cm - Rev.09	m2	128,30	128,30			R\$ 114,04			R\$ 114,04	R\$ -	100,00
01.002.004	Concreto armado fck=15MPa (fôrça) aplicado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm, 05 usos	m3	6,00	4,00			R\$ 1.374,92			R\$ 1.374,92	R\$ -	100,00
01.002.005	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revestido 08/2015	m2	94,60	94,60			R\$ 1.181,40			R\$ 1.181,40	R\$ -	100,00
01.002.006	Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa traço 1:3 - 1:2 - 10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	94,60	94,60			R\$ 429,60			R\$ 429,60	R\$ -	100,00
01.002.007	Pinura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores - cores convencionais - Rev.03	m2	3000,00	156,00			R\$ 5.597,73			R\$ 5.597,73	R\$ -	100,00
01.002.008	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	546,40	40,43			R\$ 8.289,40			R\$ 8.289,40	R\$ -	100,00
01.002.009	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x18cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01	m	40,43	40,43			R\$ 639,50			R\$ 639,50	R\$ -	100,00
01.002.010	Aterro de caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	37,00	37,00			R\$ 3.006,39			R\$ 3.006,39	R\$ -	100,00
01.002.011	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do teor normal	m3	37,00	37,00			R\$ 44.400,00			R\$ -	R\$ 44.400,00	0,00
01.002.012	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	809,00	430,00			R\$ 9.321,58			R\$ 2.661,36	R\$ 6.660,22	28,55
01.002.013	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e encarnamento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	767,00	210,00			R\$ 1.226,65			R\$ 1.226,65	R\$ -	100,00
01.002.014	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco branco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada acil, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m2	343,42	343,42			R\$ 4.713,80			R\$ 4.713,80	R\$ -	100,00
01.002.015	Coboco de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m2	17,50	17,50			R\$ 154,29			R\$ 154,29	R\$ -	100,00
01.002.016	Massamento em massa de madeira de lei, acabamento aparado, c/ ripa 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças brutas	m2	75,68	75,68			R\$ 21.406,14			R\$ 11.377,80	R\$ 10.028,34	53,15
01.002.017	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor cinza, lisibantia ou similar - Rev.02	m2	75,68	75,68			R\$ 29.667,56			R\$ -	R\$ 29.667,56	0,00
01.002.018	Forno de pvc, em ripas de 10 x 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (parafusos em PVC) marca Atorinox ou similar, instalado - Rev.06 - 10/2021	m2	509,45	509,45			R\$ 20.141,58			R\$ 12.316,50	R\$ 2.932,50	75,71
01.002.019	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS						R\$ 2.401,70			R\$ -	R\$ 2.401,70	0,00
01.003	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	5,00	5,00			R\$ 7.684,55			R\$ -	R\$ 7.684,55	0,00
01.003.001	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	5,00	5,00			R\$ 2.864,49			R\$ -	R\$ 2.864,49	0,00
01.003.002	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	5,00	5,00			R\$ 25.864,78			R\$ -	R\$ 25.864,78	0,00
01.003.003	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	5,00	5,00			R\$ 9.857,27			R\$ -	R\$ 9.857,27	0,00
01.003.004	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	5,00	5,00			R\$ 168,50			R\$ -	R\$ 168,50	0,00

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil

Comunidade Almeida Meira
Eng. Civil

PLANILHA DE MEDIÇÃO 03														CONTRATO Nº 56/2024	
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 04/09/2024 até 14/06/2024															
DATA DA MEDIÇÃO: 17/06/2024															
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	ACUMUL. ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMUL. ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMUL. ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	(%)	
01.003.002	Revisão de ponto de água tipo 1	un	5,00	5,00		5,00	0,00	R\$ 25,02	R\$ 125,10	R\$ 125,10		R\$ -	R\$ -	100,00	
01.003.003	Ponto de água fria embutido, com material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	6,00	6,00		6,00	0,00	R\$ 102,32	R\$ 613,92	R\$ 613,92		R\$ -	R\$ -	100,00	
01.003.004	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sanitários, etc.)	un	3,00	3,00		3,00	0,00	R\$ 67,10	R\$ 201,30	R\$ 201,30		R\$ -	R\$ -	100,00	
01.003.005	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pl	5,00				5,00	R\$ 84,79	R\$ 423,95	R\$ -		R\$ -	R\$ 423,95	0,00	
01.003.006	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=590 litros)	un	1,00				1,00	R\$ 1.849,90	R\$ 1.849,90	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.849,90	0,00	
01.003.007	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,00 x 0,80 m	un	1,00				1,00	R\$ 1.670,45	R\$ 1.670,45	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.670,45	0,00	
01.003.008	Fornecimento de tubo de pvc p/ rede coletora esgoto, JET, PB, dn = 100mm (Vitrifort - Tigra ou similar) - Rev. 02	m	28,00				28,00	R\$ 26,59	R\$ 744,52	R\$ -		R\$ -	R\$ 744,52	0,00	
01.003.009	Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,30 x 0,65m	un	1,00				1,00	R\$ 421,97	R\$ 421,97	R\$ -		R\$ -	R\$ 421,97	0,00	
01.003.010	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m	un	6,00				6,00	R\$ 464,86	R\$ 2.789,16	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.789,16	0,00	
01.003.011	Tubo pvc rígido c/anel borraça, série normal, p/ esgoto predial, d = 40mm	m	50,00				50,00	R\$ 16,97	R\$ 848,50	R\$ -		R\$ -	R\$ 848,50	0,00	
01.004	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 71.505,45	R\$ 43.108,59		R\$ -	R\$ 43.108,59	60,29	
01.004.001	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pl	30,00	30,00		30,00	0,00	R\$ 27,67	R\$ 830,10	R\$ 830,10		R\$ -	R\$ 830,10	100,00	
01.004.002	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pl	70,00	70,00		70,00	0,00	R\$ 103,38	R\$ 7.236,60	R\$ 7.236,60		R\$ -	R\$ 7.236,60	100,00	
01.004.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	14,00	14,00		14,00	0,00	R\$ 283,72	R\$ 3.972,08	R\$ 3.972,08		R\$ -	R\$ 3.972,08	100,00	
01.004.004	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	un	14,00	14,00		14,00	0,00	R\$ 252,00	R\$ 3.528,00	R\$ 3.528,00		R\$ -	R\$ 3.528,00	100,00	
01.004.005	Ponto de tomada 2p+H, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e eletroduto até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto assop 30A-220V, inclusive aterramento	pl	16,00	16,00		16,00	0,00	R\$ 262,88	R\$ 4.206,08	R\$ 4.206,08		R\$ -	R\$ 4.206,08	100,00	
01.004.006	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	pl	25,00	25,00		25,00	0,00	R\$ 300,35	R\$ 7.508,75	R\$ 7.508,75		R\$ -	R\$ 7.508,75	100,00	
01.004.007	Poste decorativo 2 p/altas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	84,00	84,00		84,00	0,00	R\$ 77,27	R\$ 6.490,68	R\$ 6.490,68		R\$ -	R\$ 6.490,68	100,00	
01.004.008	Disjuntor termostático bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	12,00				12,00	R\$ 1.700,20	R\$ 20.402,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 20.402,40	0,00	
01.004.009	Disjuntor termostático bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	30,00	30,00		30,00	0,00	R\$ 49,21	R\$ 1.476,30	R\$ 1.476,30		R\$ -	R\$ 1.476,30	100,00	
01.004.010	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	25,00				25,00	R\$ 55,25	R\$ 1.381,25	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.381,25	0,00	
01.004.011	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm² (fio 12) - 450/750v / 70°C	un	3,00				3,00	R\$ 230,03	R\$ 690,09	R\$ -		R\$ -	R\$ 690,09	0,00	
01.004.012	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm² (fio 10) - 450/750v / 70°C	un	500,00	500,00		500,00	0,00	R\$ 7,04	R\$ 3.520,00	R\$ 3.520,00		R\$ -	R\$ 3.520,00	100,00	
01.004.013	Projeto elétrico	m	500,00	500,00		500,00	0,00	R\$ 8,68	R\$ 4.340,00	R\$ 4.340,00		R\$ -	R\$ 4.340,00	100,00	
01.005	PAVIMENTAÇÃO	un	1,00				1,00	R\$ 5.923,12	R\$ 5.923,12	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.923,12	0,00	
01.005.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	200,00	200,00		200,00	0,00	R\$ 50,12	R\$ 10.024,00	R\$ 10.024,00		R\$ -	R\$ 10.024,00	100,00	
01.005.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejunto com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	50,00	50,00		50,00	0,00	R\$ 81,91	R\$ 4.095,50	R\$ 4.095,50		R\$ -	R\$ 4.095,50	100,00	
01.005.003	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	800,00				800,00	R\$ 8,69	R\$ 6.952,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 6.952,00	0,00	
01.006	ESQUADRIAS								R\$ 58.576,59	R\$ 5.208,79		R\$ -	R\$ 5.208,79	27,62	
01.006.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	20,00				20,00	R\$ 83,78	R\$ 1.675,60	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.675,60	0,00	
01.006.002	Revisão de esquadria de alumínio	m2	10,00				10,00	R\$ 119,79	R\$ 1.197,90	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.197,90	0,00	
01.006.003	Revisão de esquadria de ferro	m2	20,00				20,00	R\$ 107,74	R\$ 2.154,80	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.154,80	0,00	

Renildo Almeida Meira
Engº Civil

Manoel Messias Soares Neto
17/06/2024
Engenheiro Civil

PLANILHA DE MEDIÇÃO 03														CONTRATO Nº 66/2024	
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 04/06/2024 até 14/06/2024															
DATA DA MEDIÇÃO: 17/06/2024															
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	ACUMUL. ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMUL. ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMUL. ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	(%)	
01.006.004	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do balente, fechadura com execução do luro - fornecimento e instalação, af. 12/2019	un	25,00		12,00		13,00	R\$ 914,16	R\$ 22.854,00	R\$ -	R\$ 10.969,92	R\$ 10.969,92	R\$ 11.884,08	48,00	
01.006.005	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	19,44		0,00		19,44	R\$ 16,61	R\$ 322,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 322,90	0,00	
01.006.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	20,00		0,00		20,00	R\$ 16,86	R\$ 337,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 337,20	0,00	
01.006.007	Portão em tubo de aço galvanizado de 1" - padrão escolas	m2	9,20		0,00		9,20	R\$ 246,39	R\$ 2.266,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.266,79	0,00	
01.006.008	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, balente e ferragens, exclusive alizar, acabamento e contramarcos, fornecimento e instalação, af. 12/2019	m2	50,00	8,80		8,80	41,20	R\$ 472,82	R\$ 23.641,00	R\$ 4.160,82	R\$ -	R\$ 4.160,82	R\$ 19.480,18	17,60	
01.006.009	Porta em alumínio, cor NPB, tipo pantográfica, inclusive fechadura	m2	15,12	3,84		3,84	11,28	R\$ 272,91	R\$ 4.126,40	R\$ 1.047,97	R\$ -	R\$ 1.047,97	R\$ 3.078,42	25,40	
01.007.001	PAISAGISMO														
01.007.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	100,00		0,00		100,00	R\$ 16,03	R\$ 1.603,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.603,00	0,00	
01.008	LOUCAS E METAIS														
01.008.001	Vaso sanitário c/aba de descarga acoplada, linha versato 0735307570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 073530 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	8,00	4,00		4,00	4,00	R\$ 600,17	R\$ 4.801,36	R\$ 2.400,68	R\$ -	R\$ 2.400,68	R\$ 2.400,68	50,00	
01.008.002	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/aba de descarga de sobrepor AVROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	2,00		0,00		2,00	R\$ 373,22	R\$ 746,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 746,44	0,00	
01.008.003	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0,80, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2,00		0,00		2,00	R\$ 1.777,42	R\$ 3.554,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.554,84	0,00	
01.008.004	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0,80, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2,00	1,00		1,00	1,00	R\$ 771,81	R\$ 1.543,62	R\$ 771,81	R\$ -	R\$ 771,81	R\$ 771,81	50,00	
01.009	DIVERSOS														
01.009.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pinhado com tinta acrílica, 2 demãos	m	8,00		6,00		2,00	R\$ 170,97	R\$ 1.367,76	R\$ -	R\$ 1.025,82	R\$ 1.025,82	R\$ 2.891,06	27,60	
01.009.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00		0,00		1,00	R\$ 1.235,91	R\$ 1.235,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.235,91	0,00	
01.009.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fc=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e lizo final de acabamento	un	3,00		0,00		3,00	R\$ 371,07	R\$ 1.113,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.113,21	0,00	
01.010	FECHAMENTO DOS COBOÇO DAS SALAS														
01.010.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	210,30		0,00		210,30	R\$ 6,78	R\$ 1.421,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.421,63	0,00	
01.010.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:1 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	210,30		0,00		210,30	R\$ 31,78	R\$ 6.683,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.683,33	0,00	
01.010.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	210,20		0,00		210,20	R\$ 17,06	R\$ 3.586,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.586,01	0,00	
TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 386.392,54	R\$ 121.787,41	R\$ 45.546,84	R\$ 167.304,25	R\$ 218.088,29	43,30	

<

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RQ nº 271197561-2

Ronildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5

E&P ENGENHARIA E PROJETOS		Rua Francisco Portugal nº 529 - Salgado Filho ARACAJU-SE CNPJ : 42.348.741/0001-08			MEMÓRIA DE CÁLCULO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03			CONTRATO Nº 56/2024	
		OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE.						PERÍODO DA MEDIÇÃO: 04/06/2024 até 14/06/2024	
		CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU CNPJ: 13.095.039-0001-81						DATA DA MEDIÇÃO: 17/06/2024	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	MEDIDO	COMPRIMENTO (m) / UNIDADE	LARGURA (m)	ÁREA TOTAL (m²)			
01	REFORMA DA ESCOLA MARIO TRINDADE								
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								
01.001.005	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	50,00	PROJETO	PROJETO	50,00			
01.002	ELEVAÇÕES								
01.002.003	Impermeabilização de alçerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	m2	4,00	PROJETO	PROJETO	4,00			
01.002.005	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,00	PROJETO	PROJETO	2,00			
01.002.013	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	430,00	PROJETO	PROJETO	430,00			
01.002.015	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco branco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com	m2	50,00	PROJETO	PROJETO	50,00			
01.005	PAVIMENTAÇÃO								
01.005.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	200,00	PROJETO	PROJETO	200,00			
01.005.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3,	m2	50,00	PROJETO	PROJETO	50,00			
01.006	ESQUADRIAS								
01.006.004	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af. 12/2019	un	12,00	12,00					
01.009	DIVERSOS								
01.009.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	6,00	6,00					



Romildo Almeida Meira
 Engº Civil
 RN: 27034758-5



FOTO 2 – DEMOLIÇÕES E EXECUÇÃO DE ALVENARIA;

Ronildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5



FOTO 3 – EXECUÇÃO DE REBOCO;

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

Ronildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5

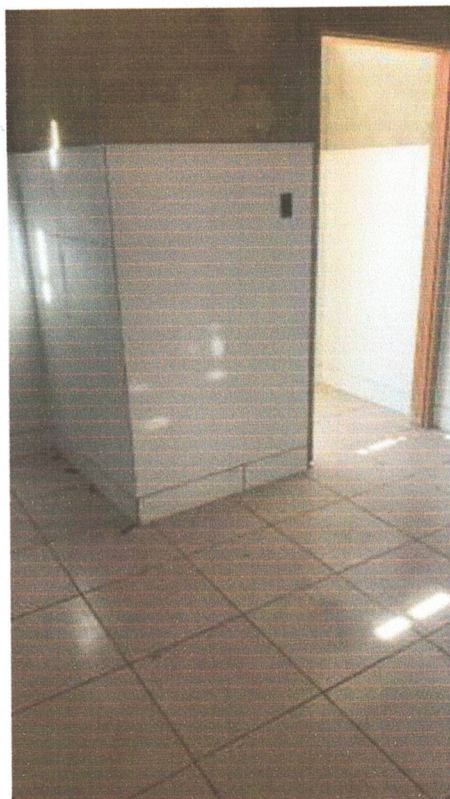


FOTO 4 – REVESTIMENTO CERÂMICO;


Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5



FOTO 5 – REVESTIMENTO CERÂMICO;


Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2


Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5



FOTO 6 – EMASSAMENTO EXTERNO;


Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5



FOTO 7 – EMASSAMENTO EXTERNO;


Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - RN - n° 271797661-2


Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5



FOTO 8 – REVESTIMENTO CERÂMICO;

Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5

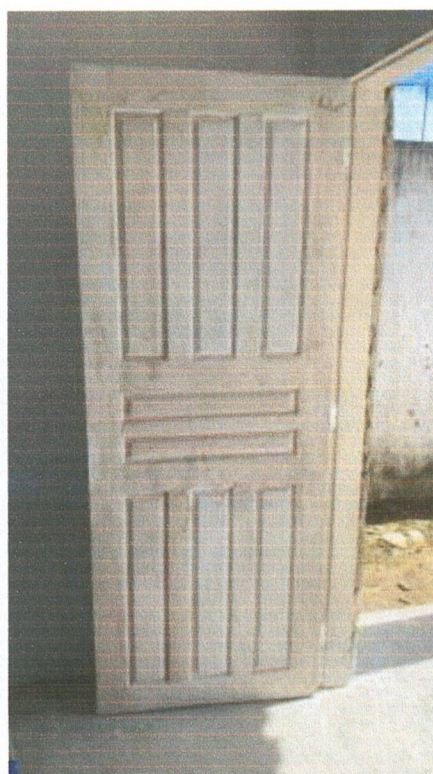


FOTO 9 – PORTA DE MADEIRA. PREPARO PARA PINTURA;

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - RN: 271797661 - 2

[Handwritten signature]

Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5



FOTO 10 – REVESTIMENTO CERÂMICO;

Ronildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5

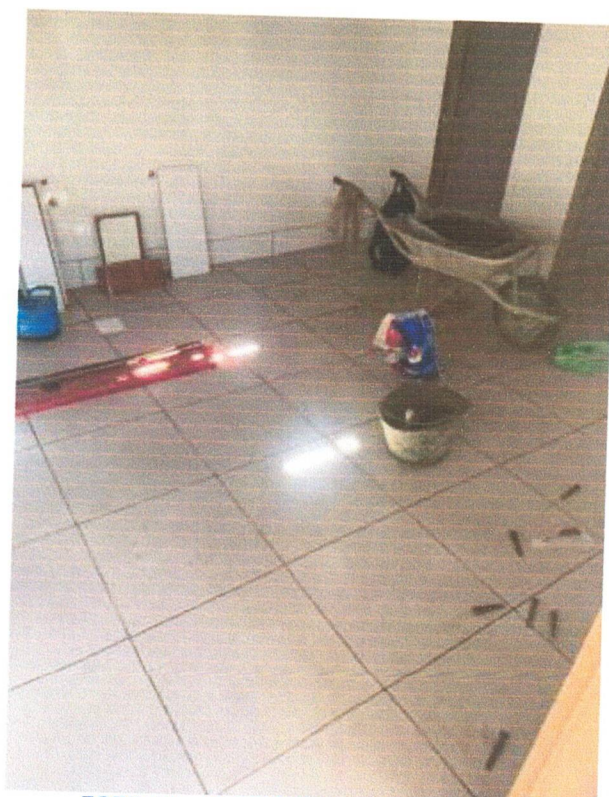


FOTO 11 – REVESTIMENTO CERÂMICO;

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - RN: 271797661-2

Ronildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240375397

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

RONILDO ALMEIDA MEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2703478585

Registro: 0000003006SE

Empresa contratada: **E & P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Registro : 0000187089-SE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU**

RUA GIVALDO MOURA DA SILVA

Complemento: **CASA**

Cidade: **Pirambu**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

Nº: 85

CEP: 49190000

Contrato: 022024

Celebrado em: 21/03/2024

Valor: R\$ 386.392,54

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Órgão Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA GIVALDO MOURA DA SILVA

Complemento: **CASA**

Cidade: **Pirambu**

Data de Início: 02/04/2024

Previsão de término: 02/09/2024

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

Nº: 85

CEP: 49190000

Coordenadas Geográficas: -10.738505, -36.858141

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: 102

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU**

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO

50,00

m2

> #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Prestação de serviços na reforma e ampliação da unidade de ensino Mário Trindade Cruz localizada neste município de Pirambu - Sergipe.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SERGIPE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Ronildo Almeida Meira
RONILDO ALMEIDA MEIRA - CPF: 150.863.645-15

Local _____ de _____ data _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU - CNPJ: 13.095.039/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 262,55

Registrada em: 15/04/2024

Valor pago: R\$ 262,55

Nosso Número: 8203110106

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CD1xA
Impresso em: 16/04/2024 às 10:51:34 por: ip: 177.207.36.252

www.crea-se.org.br
Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br
Fax: XXXX-XXXX

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe





CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.018.83245/72	Nome da obra UNIDADE MARIO TRINDADE CRUZ	Data do cadastramento 16/04/2024 15:50
Origem do cadastramento e-CAC		
Tipo Zona Zona Rural	ART SE20240375397	RRT CIB 0000000-0
Cadastro Imobiliário		
Data do início da obra 02/04/2024	CNAE 4120400 Construção de edifícios	

Situação da obra

Situação Ativa	Data 02/04/2024
-------------------	--------------------

Endereço

País BRASIL	Município PIRAMBU	UF SE	CEP 49.190-000
Bairro CENTRO	Logradouro RUA GIVALDO MOURA DA SILVA	Número 85	Complemento CASA

Responsável

Nome E & P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ 42.348.741/0001-08	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 02/04/2024	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
13.095.039/0001-81	MUNICIPIO DE PIRAMBU

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Galpão industrial	Mista	50,00 m²
Reforma	Galpão industrial	Mista	50,00 m²

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Existente	Galpão industrial	Mista	Quadra Esportiva e Poliesportiva	30,00 m²	20,00 m²	50,00 m²
Reforma	Galpão industrial	Mista	Quadra Esportiva e Poliesportiva	30,00 m²	20,00 m²	50,00 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra

100,00 m²



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 473671/2024

Emissão: 02/05/2024

Validade: 30/06/2024

Chave: C64WC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: E & P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 42.348.741/0001-08

Registro: 0000187089

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 350.000,00

Data do Capital: 23/02/2023

Faixa: 3

Objetivo Social Pleno: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA: AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES EM BAIXA TENSÃO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Endereço Matriz: RUA FRANCISCO PORTUGAL, 529, SALGADO FILHO, ARACAJU, SE, 49020390

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 07/10/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000018786DDSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8203131909. Data de vencimento do boleto: 30/06/2024
- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RÔNMILDO ALMEIDA MEIRA

Registro: 2703478585

CPF: 150.***-**-15

Data Início: 08/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUCAO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 473645/2024

Emissão: 02/05/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 3WZBw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: RONMILDO ALMEIDA MEIRA

Registro: 2703478585

CPF: 150.***-**-15

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 28/04/1983

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUCAO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Data de Formação: 07/01/1983

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de infração

Nada consta



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 04/06/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 14/06/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA:
04 / 06 / 2024



MANHÃ
TARDE
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	02	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	01	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento
- Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm
- Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
- Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto
- Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - nº 271797661-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 04/06/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 14/06/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA:
__05__/_06__/_2024



MANHÃ x
TARDE x
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	__02__	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	__01__	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento
- Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm
- Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
- Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto
- Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN: nº 271797661-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 04/06/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 14/06/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA:
06 / 06 / 2024



MANHÃ
TARDE
NOITE

x

x

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	02	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	01	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento
- Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm
- Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
- Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto
- Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 270347858-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - RN - nº 271797661 - 2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 04/06/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 14/06/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA:
07 / 06 / 2024



MANHÃ x
TARDE x
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	02	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	01	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento
- Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm
- Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
- Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto
- Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Ronildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 270347858-5

CONTRATADA

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN: 271797661-2

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 04/06/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 14/06/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA:
10 / 06 / 2024



MANHÃ x
TARDE x
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	02	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	01	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm
- Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 270347858-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 04/06/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 14/06/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA: 11 / 06 / 2024

MANHÃ x
TARDE x
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	_02_	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	_01_	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm
- Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
- Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada aciii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 270347858-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

Manoel Mesquita Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 04/06/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 14/06/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA:
12 / 06 / 2024



MANHÃ
TARDE
NOITE

x

x

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	02	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	01	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm
- Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada aciii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço
- Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm,
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil R.N. nº 271797661-2

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 270347858-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 04/06/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 14/06/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA:
13 / 06 / 2024



MANHÃ			x	
TARDE		x		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	02	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	01	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm
- Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada aciii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço
- Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm,
- Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 270347858-5

CONTRATADA

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN: nº 271797661-2

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIO TRINDADE CRUZ, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU / SE. CONTRATO: 56/2024 RESP. TÉCNICO: RONMILDO ALMEIDA MEIRA
ENDEREÇO: R. MANOEL AMARAL LEMOS, 245, BAIRRO BELA VISTA, CENTRO INÍCIO: 04/06/2024 Nº CREA-SE: 270347858-5
PRAZO: 14/06/2024 Nº DA ART: SE20240375389

DATA:
14 / 06 / 2024



MANHÃ
TARDE
NOITE

x

x

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	___	AJUDANTE GERAL	02	MOTONIVELADORA	___
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	___	ARMADOR	___	RETRO ESCAVADEIRA	___
TÉCNICO DE SEGURANÇA	___	CARPINTEIRO	___	CAMINHÃO BASCULANTE	___
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	___	PEDREIRO	01	CAMINHÃO MUNCK	___
COMPRADOR	___	SOLDADOR	___	GUINDASTE	___
ORÇAMENTISTA	___				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm,
- 2) Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN: nº 271797661-2

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Ronmildo Almeida Meira
Engº Civil
RN: 27034758-5

CONTRATADA

CONTRATANTE

CPF/CNPJ do Empregador
42.348.741

Nome/Razão Social do Empregador
E P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124060311351685-2

Tag
42348741 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

232,96

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	2	232,96	0,00	0,00	0,00	232,96
Total Geral:		232,96	0,00	0,00	0,00	232,96

Data de geração da Guia: 03/06/2024 às 13:12:58 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador E & P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		Inscrição CNPJ: 42.348.741/0001-08	Admissão 30/06/2023	Competência Maio de 2024	
Empregado 000005 EDVAL SANTOS SILVA		Cargo AJUDANTE DE OBRA		Lotação OPERACIONAL	
PIS 20036848918	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)	62,04		105,90
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 1.474,04		Total de Descontos 105,90
					Líquido a Receber 1.368,14
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador E & P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		Inscrição CNPJ: 42.348.741/0001-08	Admissão 30/06/2023	Competência Maio de 2024	
Empregado 000005 EDVAL SANTOS SILVA		Cargo AJUDANTE DE OBRA		Lotação OPERACIONAL	
PIS 20036848918	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)	62,04		105,90
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 1.474,04		Total de Descontos 105,90
					Líquido a Receber 1.368,14
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador E & P CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI		Inscrição CNPJ: 42.348.741/0001-08		Admissão 05/04/2024	Competência Maio de 2024
Empregado 000008 MAX MELO FONSECA		Cargo SUPERVISOR(A)			Lotação administrativa
PIS 12893691767	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.500,00		113,82
310	INSS	9%			
			Total de Proventos 1.500,00		Total de Descontos 113,82
					Líquido a Receber 1.386,18
Salário Contratual 1.500,00	Base de Cálculo do INSS 1.500,00	Base de Cálculo do FGTS 1.500,00	FGTS 120,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador E & P CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI		Inscrição CNPJ: 42.348.741/0001-08		Admissão 05/04/2024	Competência Maio de 2024
Empregado 000008 MAX MELO FONSECA		Cargo SUPERVISOR(A)			Lotação administrativa
PIS 12893691767	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.500,00		113,82
310	INSS	9%			
			Total de Proventos 1.500,00		Total de Descontos 113,82
					Líquido a Receber 1.386,18
Salário Contratual 1.500,00	Base de Cálculo do INSS 1.500,00	Base de Cálculo do FGTS 1.500,00	FGTS 120,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor E & P CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI		Inscrição CNPJ: 42.348.741/0001-08	Admissão 05/04/2024	Competência Maio de 2024	
Empregado 000009 EDMILSON PEQUENO DOS SANTOS		Cargo ADM DE EMPRESAS	Lotação administrativa		
PIS 20004616000	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
922	Pro-labore	11%	2.824,00	310,64	
310	INSS				
			Total de Proventos 2.824,00	Total de Descontos 310,64	
				Líquido a Receber 2.513,36	
Salário Contratual 2.824,00	Base de Cálculo do INSS 2.824,00	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor E & P CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI		Inscrição CNPJ: 42.348.741/0001-08	Admissão 05/04/2024	Competência Maio de 2024	
Empregado 000009 EDMILSON PEQUENO DOS SANTOS		Cargo ADM DE EMPRESAS	Lotação administrativa		
PIS 20004616000	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
922	Pro-labore	11%	2.824,00	310,64	
310	INSS				
			Total de Proventos 2.824,00	Total de Descontos 310,64	
				Líquido a Receber 2.513,36	
Salário Contratual 2.824,00	Base de Cálculo do INSS 2.824,00	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	M&M EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ	01.370.750/0001-18
Período apuração	05/2024	Número do Recibo	50000235400788
Data/Hora da Transmissão	03/06/2024 13:27:14	Identificação da Apuração de Débitos	26141330727 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	2-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	DR JOSE ROBERTO RIBEIRO	Número	330
Complemento	SALA 03	Bairro/Distrito	GRAGERU
Município	ARACAJU	UF	SE
CEP	49027090	Telefone	7999999934
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	PEDRO RIBEIRO AGUIAR FONSECA	CPF	10214569500
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	202,00		
Saldo a Pagar	202,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	2.693,39		
Saldo a Pagar	2.693,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	1.024,20		
Deduções	Salário Família: 186,12		
Saldo a Pagar	838,08		

Comprovante de Pagamento



AUTENTICAÇÃO

Nº Controle 2024060598800003PMU
ID da Transação E1300971720240605121542
813328425
Data e hora 05/06/2024 às 09:16:22

DADOS DA TRANSAÇÃO

Tipo Pagamento Pix
Situação Efetivado
Valor do Pagamento R\$ 232,96
Descrição fgts EP MES 05

DADOS DO PAGADOR

Pagador e & P Construcoes e
Servicos Ltda
Instituição Bco do Est. de Se S.A.
CNPJ 42.348.741/0001-08
Agência 028
Conta 03104418-2
Tipo Conta Corrente

DADOS DO RECEBEDOR

Destinatário Caixa Economica Federal
CNPJ 00.360.305/0001-04
Chave c75e4ec6-9881-4240-
a2f3-3672b7fe56c1
Instituição Caixa Economica Federal
Agência 647
Conta 9999000537000360305-5
Tipo Conta Corrente

TELEFONES PARA CONTATO

Alô Banese (79) 3218-2020
SAC Banese 0800 021 9013
Ouvidoria 0800 021 9009

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banese e informe o Nº de Controle deste comprovante.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.348.741

Nome Empregador: E P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia: 20/06/2024

Número da Guia: 0124060311351685-2

Emitida por: 42.348.741/0001-08 - E P CONSTRUCOES E

Qtd. Trabalhadores: 2

Origem: Gestão de Guias

Data Emissão: 03/06/2024 13:12:58 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 42.348.741/0001-08				Tomador: 90.018.831/72									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		MAX MELO FONSECA	01309734593101050420240101	013.097.345-93	101	20/06/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
				Total do Tomador		90.018.831/72		1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
				Total do Estabelecimento		42.348.741/0001-08		2.912,00	232,96	0,00	0,00	0,00	232,96
				Total da Guia				2.912,00	232,96	0,00	0,00	0,00	232,96



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:
Vencimento da Guia:

42.348.741
20/06/2024

Nome Empregador:
Número da Guia:

E P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
0124060311351685-2

Qtd. Trabalhadores:
Data Emissão:

2
03/06/2024 13:12:58 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

Emitida por:

42.348.741/0001-08 - E P CONSTRUCOES E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		42.348.741/0001-08	Tomador:		90.018.83245/72
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	
05/2024		EDVAL SANTOS SILVA	01511057580101300620230101	015.110.575-80	
			Categoria	Vencimento	Tipo Depósito
			101	20/06/2024	Mensal
			Total do Tomador		90.018.83245/72
			Total do Estabelecimento		42.348.741/0001-08
			Total da Guia		
			Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros
			1.412,00	112,96	0,00
			1.412,00	112,96	0,00
			2.912,00	232,96	0,00
			2.912,00	232,96	0,00
					Atualiz. Monetária
					0,00
					Multa
					0,00
					Total
					112,96
					112,96
					232,96
					232,96



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

42.348.741

Nome Empregador:

E P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia:

20/06/2024

Número da Guia:

0124060311351685-2

Emitida por:

42.348.741/0001-08 - E P CONSTRUCOES E

Qtd. Trabalhadores:

2

Origem: Gestão de Guias

Data Emissão:

03/06/2024 13:12:58 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	42.348.741/0001-08	2	2.912,00	232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,96
		Total da Guia	2.912,00	232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,96



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.348.741
Vencimento da Guia: 20/06/2024

Nome Empregador: E P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Número da Guia: 0124060311351685-2

Origem: Gestão de Guias
Data Emissão: 03/06/2024 13:12:58 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores: 2

Emitida por: 42.348.741/0001-08 - E P CONSTRUCOES E

Relação de Tipos de Valor

Resumo de Tipos de Valor													
Estabelecimento:	42.348.741/0001-08												
Comp. Apuração	05/2024	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		11 - FGTS mensal			Total								
				2	2.912,00		232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,96
		Total da Guia			2.912,00		232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,96



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 42.348.741 Nome Empregador: E P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060311351885-2 Emitida por: 42.348.741/0001-08 - E P CONSTRUCOES E

Qtd. Trabalhadores: 2 Origem: Gestão de Guias

Data Emissão: 03/06/2024 13:12:58 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Resumo de Tomadores de Serviço									
Tomador: 90.018.83131/72									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	1	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total do Tomador		1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Tomador: 90.018.83245/72									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	1	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
Total do Tomador		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
Total da Guia		2.912,00	232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,96

Folha de Pagamento

Licenciado para: DW ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO E CONTABILIDADE LTDA
Empresa: E & P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 42.348.741/0001-08
Mês/Ano: 05/2024
Emissão: 03/06/2024

Pág.: 1
BRUNA
Fortes Pessoal 7.213,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000009	EDMILSON PEQUENO DOS SANTOS				
	Cargo: ADM DE EMPRESAS				
		310 INSS	11%		310,64
		922 Pro-labore		2.824,00	
				2.824,00	310,64
		FGTS:	Líquido a receber:		2.513,36

Data: / /				Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/04/2024	0	0	220:00	2.824,00	2.824,00	

000008	MAX MELO FONSECA					
	Cargo: SUPERVISOR(A)					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.500,00		
		310 INSS	9%		113,82	
				1.500,00	113,82	
		FGTS: 120,00	Líquido a receber:			1.386,18

Data: / /				Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/04/2024	0	0	220:00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

000005	EDVAL SANTOS SILVA					
	Cargo: AJUDANTE DE OBRA					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
		310 INSS	7,5%		105,90	
				1.474,04	105,90	
		FGTS: 112,96	Líquido a receber:			1.368,14

Data: / /				Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
30/06/2023	1	1	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Total Geral (3 empregados)						
		010 Salário-Família		62,04		
		011 Salário-Base		2.912,00		
		310 INSS			530,36	
		922 Pro-labore		2.824,00		
				5.798,04	530,36	
		FGTS: 232,96	Líquido a receber:			5.267,68
		BC-INSS: 5.736,00		BC-FGTS: 2.912,00		

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.348.741/0001-08
Razão Social: E E P CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
Endereço: R WILSON BARBOSA DE MELO 23 PAVMTOTERREO / ATALAIA / ARACAJU / SE / 49037-590

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/06/2024 a 01/07/2024

Certificação Número: 2024060202565687473230

Informação obtida em 04/06/2024 08:49:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 21 de Maio de 2024
Nº. 202400499716

CNPJ: 42.348.741/0001-08

Contribuinte: E P CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 19/08/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: EI.0048.0018.BI.081C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: E & P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 42.348.741/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:45:31 do dia 20/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/09/2024.

Código de controle da certidão: **8A84.FDC5.9A07.A7C8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E & P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.348.741/0001-08

Certidão n°: 19147953/2024

Expedição: 20/03/2024, às 08:47:28

Validade: 16/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que E & P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 42.348.741/0001-08, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Certidão Negativa de Débitos Estaduais N° 265003 / 2024

Identificação do Contribuinte: 42.348.741/0001-08

Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **42.348.741/0001-08** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **42.348.741/0001-08** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria N° 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **05/06/2024**, válida até **05/07/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240605641WFD



ESTADO DE SERGIPE
PODER JUDICIÁRIO
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N
Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Solicitante

Razão Social:	E & P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
Nome Fantasia:	E & P CONSTRUCOES E SERVICOS	Natureza Certidão:	Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
Domicílio:	Aracaju	Tipo Pessoa/CPF/CNPJ:	de Jurídica / 42.348.741/0001-08
Data da Emissão:	13/07/2023 09:06	Data de Validade:	* 12/08/2023 *
Nº da Certidão:	* 0003565411 *	Nº da Autenticidade:	* 8424880176 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

Observações

- a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
- b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
- c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: E & P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Protocolo: SEC2401093680	
NIRE : 28600112709 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 28600112709	CNPJ 42.348.741/0001-08	Data de Ato Constitutivo 16/06/2021	Início de Atividade 15/06/2021
Endereço Completo Rua FRANCISCO PORTUGAL, Nº 529, SALGADO FILHO - Aracaju/SE - CEP 49020-390			
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA			
Capital Social R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) Capital integralizado R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome EDMILSON PEQUENO DOS SANTOS	CPF/CNPJ 654.570.805-87	Participação no capital R\$ 350.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador S		Término do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador			
Nome EDMILSON PEQUENO DOS SANTOS	CPF 654.570.805-87	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação
Data 29/08/2023	Número 20230331750	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/01/2024, às 16:04:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.agiliza.se.gov.br>, com o código XPGMCJG1.



SEC2401093680

NAYARA SIQUEIRA BRITO
Secretário(a) Geral
