

17/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:44:52
220602206 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PF MN PIRAMBU FDO ESP PEA
AGENCIA: 2206-3 CONTA: 136.072-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2024
NR. DOCUMENTO	552.206.000.110.000
VALOR TOTAL	79.089,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS MARTINS ROCHA - ME
AGENCIA: 2206-3 CONTA: 110.000-9
NR. DOCUMENTO 552.206.000.136.072
=====

NR.AUTENTICACAO	3.2B4.E22.BD5.125.F94
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB826408 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO.

PAGO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PF MN PIRAMBU FDO ESP PEA
Agência 2206-3
Conta corrente 136072-8

Creditado

Nome MARCOS MARTINS ROCHA - ME
Agência 2206-3
Conta corrente 110000-9
Valor 79.089,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA	17/04/2024 15:54:08
	JB826408 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO	17/04/2024 16:44:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB826408 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO.



Entre contas correntes

G3311715467454111
17/04/2024 15:54:08

Debitado

Nome PF MN PIRAMBU FDO ESP PEA
Agência 2206-3
Conta corrente 136072-8

Creditado

Nome MARCOS MARTINS ROCHA - ME
Agência 2206-3
Conta corrente 110000-9
Valor 79.089,48
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 321947143.

Usuário: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

ABRIL/2024

Nota de Liquidação:	0412024	Fonte:	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	Data:	12/04/2024
---------------------	---------	--------	---	-------	------------

FORNECEDOR			
Nome:	MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		CNPJ/CPF: 15190486000145
Endereço:	RUA GETULIO VARGAS, 34	Compl:	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Japaratuba
E-mail:	1@	UF:	SE
		Telefone:	(79)3213-0564
		RG:	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Agência:	22063
		Operação:	
		Conta:	1100009

CLASSIFICAÇÃO	
Unidade Orçamentária:	0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	15 Urbanismo
SubFunção:	451 Infraestrutura Urbana
Programa:	0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
Ação:	1055 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
Natureza Despesa:	44905100 Obras e Instalações
SubElemento:	44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo
Fonte:	17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Marcador:	17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Centro Custo:	

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0201014	01/02/2024	125.478,77	52.199,22	73.279,55

HISTÓRICO DO EMPENHO
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO REINALDO MOURA DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023 E CONTRATO Nº 22/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO
REFERENTE NOTA FISCAL 0017/2024 E 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO REINALDO MOURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023 E CONTRATO Nº 22/2024.

Documento	Valor
Nota Fiscal (17 / Série: A / UF: SE / Emissão: 10/04/2024)	52.199,22

SUBEVENTO
15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	52.199,22
Retenção		Valor
21881010403-Imposto de Renda - Outros rendimentos		782,99
21881010801-Iss		1.565,97

CINQUENTA E DOIS MIL E CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS	Total Retido: 2.348,96
	Total Liquido: 49.850,26



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
Termo de Entrega de Documentos

Nº Processo	0000267
Nº Fila	136

TERMO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 15.190.486/0001-45

Nome: MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA GETULIO VARGAS

Bairro: CENTRO

E-mail: 1@

Compl:

Cidade: Japarutuba

Telefone: (79)3213-0564

UF: SE

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência: 22063

Conta: 1100009

EMPENHO	EMIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	FONTE
0201014	01/02/2024	1055.44905100-17200000	Global	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEF - Lei 9.478/1997

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO REINALDO MOURA DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023 E CONTRATO Nº 22/2024.

Documentação

Nota Fiscal	17
Valor	R\$ 52.199,22
Emissão	10/04/2024
Horário de Entrega	10/04/2024 12:59:14

Para acompanhar o andamento do seu processo na fila pública, acesse o link abaixo:

<http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pirambu/fornecedor/filapagamento>

Cadastrado por: Santiago Santos Gois



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças - Departamento Tributário - Praça 16 de Outubro, Nº
135, Centro - Carmópolis/SE, CEP: 49.7490-000 Telefone: (79) 3277-1210

Nota: 2024000

00000017

Código Verificação

2WQX-K5H6



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

10/04/2024 08:35:27

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

04/2024

Exigibilidade do ISS

Exigível em Pirambu

Município de Prestação do Serviço

Pirambu - SE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

Nome Fantasia

MARTINS ENGENHARIA

CPF/CNPJ

15.190.486/0001-45

Inscrição Municipal

200052591

Inscrição Estadual

271630531

Simples Nacional

Não

Email

marcos@martinslocserv.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 99988-9649

Endereço

RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS, SN, Santa Barbara - CEP: 49740-000 - Carmópolis - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

prefeitura municipal pirambu

CPF/CNPJ

13.095.039/0001-81

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3276-1203

E-mail

pirambu@pirambu.com.br

Endereço

(Localidade), 16, praça nossa senhora de lurdas - Não informado - CEP: 49190-000 - Pirambu - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4299599

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO VALOR TOTAL DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOC. NO CONJ. REINALDO MOURA E CONJ. LORIVAL BOMFIM - PIRAMBU/SE. CONTRATO MUNICIPAL Nº 04/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023.

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2024 A 31/03/2024.

PRAÇA LOURIVAL BOMFIM- R\$ 27.420,97 ;
PRAÇA LOURIVAL BOMFIM MENOR - R\$ 3.196,00 ;
PRAÇA REINALDO MOURA - R\$ 52.199,22

Material 40%
Mão de Obra 60%

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO NORDESTE: 004
AG: 180
CONTA CORRENTE: 012186-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU DECLARO QUE

- ☒ Os serviços foram prestados
☐ Os produtos foram entregues
☐ A obra foi executada

Data: 20/04/2024

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)
538,31

COFINS (R\$)
2.484,49

INSS (R\$)
0,00

IR (R\$)
1.242,24

CSLL (R\$)
828,16

Outras Retenções (R\$)
0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)
82.816,19

Deduções (R\$)
49.689,71

Desconto Incondicionado (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
33.126,48

Alíquota (%)
5,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)
1.656,32

Desconto Condicionado (R\$)
0,00

Valor Líquido (R\$)
76.066,67

Valor Total da Nota (R\$)
82.816,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R\$ 11.138,78 Federal e R\$ 4.140,81 Municipal. Fonte: IBPT [D8CAC2]
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 10/04/2024 08:35:28
Para validação desta NFS-e acesse: <http://carmopolisse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

ABRIL/2024

Nota de Liquidação:	0412025	Fonte:	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	Data:	12/04/2024
---------------------	---------	--------	---	-------	------------

FORNECEDOR							
Nome:	MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			CNPJ/CPF:	15190486000145		
Endereço:	RUA GETULIO VARGAS, 34		Compl:				
Bairro:	CENTRO		Cidade:	Japaratuba	UF:	SE	
E-mail:	1@		Telefone:	(79)3213-0564	RG:		
DADOS BANCÁRIOS							
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.		Agência:	22063	Operação:	Conta:	1100009

CLASSIFICAÇÃO	
Unidade Orçamentária:	0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	15 Urbanismo
SubFunção:	451 Infraestrutura Urbana
Programa:	0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
Ação:	1055 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
Natureza Despesa:	44905100 Obras e Instalações
SubElemento:	44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo
Fonte:	17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Marcador:	17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Centro Custo:	

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0402002	02/04/2024	54.095,91	27.420,97	26.674,94

HISTÓRICO DO EMPENHO
N.E 0201016 CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023 E CONTRATO Nº 22/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO
NOTA FISCAL 0017/2024 - 2ª MEDIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023 E CONTRATO Nº 22/2024.

Documento	Valor
Nota Fiscal (17 / Série: A / UF: SE / Emissão: 10/04/2024)	27.420,97

SUBEVENTO
15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	27.420,97
Retenção		Valor
21881010403-Imposto de Renda - Outros rendimentos		411,31
21881010801-Iss		822,62

VINTE E SETE MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Total Retido:	1.233,93
Total Liquido:	26.187,04



Nº Processo
0000265

Nº Fila
134

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

TERMO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 15.190.486/0001-45
Nome: MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA GETULIO VARGAS
Bairro: CENTRO
E-mail: 1@

Compl:
Cidade: Japaratuba
Telefone: (79)3213-0564

UF: SE
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Conta:

EMPENHO	EMIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	FONTE
0402002	02/04/2024	1055.44905100-17200000	Global	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FED. Lei 9.478/1997

HISTÓRICO DO EMPENHO

N.E 0201016 CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023 E CONTRATO Nº 22/2024.

Documentação	
Nota Fiscal	17
Valor	R\$ 27.420,97
Emissão	10/04/2024
Horário de Entrega	10/04/2024 12:55:37

Para acompanhar o andamento do seu processo na fila pública, acesse o link abaixo:

<http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pirambu/fornecedor/filapagamento>

Cadastrado por: Santiago Santos Gois

Secretaria de Controle Interno

☒ Aprovado

☐ Reprovado

Obs. _____



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento Tributário - Praça 16 de Outubro, Nº 135, Centro - Carmópolis/SE, CEP: 49.7490-000 Telefone: (79) 3277-1210

Nota: 2024000

00000017

Código Verificação

2WQX-K5H6



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

10/04/2024 08:35:27

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

04/2024

Exigibilidade do ISS

Exigível em Pirambu

Município de Prestação do Serviço

Pirambu - SE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

Nome Fantasia

MARTINS ENGENHARIA

Email

marcos@martinslocserv.com.br

CPF/CNPJ

15.190.486/0001-45

Inscrição Municipal

200052591

Inscrição Estadual

271630531

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 99988-9649

Endereço

RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS, SN, Santa Barbara - CEP: 49740-000 - Carmópolis - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

prefeitura municipal pirambu

CPF/CNPJ

13.095.039/0001-81

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3276-1203

E-mail

pirambu@pirambu.com.br

Endereço

(Localidade), 16, praça nossa senhora de lurdas - Não informado - CEP: 49190-000 - Pirambu - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4299599

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO VALOR TOTAL DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOC. NO CONJ. REINALDO MOURA E CONJ. LORIVAL BOMFIM - PIRAMBU/SE. CONTRATO MUNICIPAL Nº 04/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023.

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2024 A 31/03/2024.

PRAÇA LOURIVAL BOMFIM- R\$ 27.420,97 ;
PRAÇA LOURIVAL BOMFIM MENOR - R\$ 3.196,00 ;
PRAÇA REINALDO MOURA - R\$ 52.199,22

Material 40%

Mão de Obra 60%

DADOS BANCARIOS:

BANCO DO NORDESTE: 004

AG: 180

CONTA CORRENTE: 012186-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
DECLARO QUE

- ☒ Os serviços foram prestados;
☐ Os produtos foram entregues;
☐ A obra foi executada

Data: 10 / 04 / 24

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

538,31

COFINS (R\$)

2.484,49

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

1.242,24

CSLL (R\$)

828,16

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

82.816,19

Deduções (R\$)

49.689,71

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

33.126,48

Alíquota (%)

5,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

1.656,32

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

76.066,67

Valor Total da Nota (R\$)

82.816,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 11.138,78 Federal e R\$ 4.140,81 Municipal. Fonte: IBPT [D8CAC2]

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 10/04/2024 08:35:28

Para validação desta NFS-e acesse: <http://carmopolisse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.190.486/0001-45
Razão Social: MARTINS CONSTRUCAO MANUTENCAO E SERVICOS
Endereço: RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS SN GALPAO 01 / ANTONIO B TELES / CARMOPOLIS / SE / 49740-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/03/2024 a 26/04/2024

Certificação Número: 2024032819515771689807

Informação obtida em 08/04/2024 14:48:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARTINS CONSTRUCAO, MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.190.486/0001-45

Certidão nº: 12080264/2024

Expedição: 22/02/2024, às 11:28:10

Validade: 20/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARTINS CONSTRUCAO, MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.190.486/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 166593 / 2024

Inscrição Estadual: 271630531

Razão Social: MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ: 15190486000145

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Endereço: RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS QUADRAB
TELES - CARMOPOLIS CEP: 49740000

GALPAO01 , ANTONIO BARRETO

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressaltando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **08/04/2024** , válida até **08/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 2024040852EU00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135-CENTRO Telefone: (79)3277-1210 CNPJ: 13.108.535/0001-22

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ***** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 10/04/2024

Contribuinte: MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA		Inscrição Mercantil: 200052591 Sequencial: 13391 Referência Loteamento:
Localização: RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS, S/N, , SANTA BARBARA		Cadastro Imobiliário: 01.01.1814.0313.001
Natureza: Tributos Mercantis		Inscrição Imobiliária: 3164
Razão Social: MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
15.190.486/0001-45		200052591
Atividade Principal: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Atividades Secundárias 2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 2513-6/00 - FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA 2539-0/02 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS 3311-2/00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E		
Início Atividade: 01/03/2012	Validade: 09/06/2024 ✓	
Observações: Válido por 59 dias.		
VIA INTERNET		



Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/carmopolis//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

2AA3A6788F960459004E6CFA592646B3DDFA3761



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 15.190.486/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 21:47:54 do dia 06/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/05/2024.

Código de controle da certidão: **15AE.EB1A.5B2A.EB76**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Nota de Liquidação:	0412026	Fonte: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	Data: 12/04/2024
---------------------	---------	--	------------------

Nome:	MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CNPJ/CPF:	15190486000145
Endereço:	RUA GETULIO VARGAS, 34	Compl:	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Japaratuba UF: SE
E-mail:	1@	Telefone:	(79)3213-0564 RG:

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 22063 **Operação:** **Conta:** 1100009

Unidade Orçamentária:	0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	15	Urbanismo
SubFunção:	451	Infraestrutura Urbana
Programa:	0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
Ação:	1055	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
Natureza Despesa:	44905100	Obras e Instalações
SubElemento:	44905103	Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo
Fonte:	17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Marcador:	17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Centro Custo:		

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0402001	02/04/2024	13.633,66	3.196,00	10.437,66

N.E 0201015 CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM (MENOR) DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023 E CONTRATO Nº 22/2024.

NOTA FISCAL 0017/2024 - 2ª MEDIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM (MENOR) DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023 E CONTRATO Nº 22/2024.

Documento	Valor
Nota Fiscal (17 / Série: A / UF: SE / Emissão: 10/04/2024)	3.196,00

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
--------------------------	--

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.196,00
Retenção		Valor
21881010403-Imposto de Renda - Outros rendimentos		47,90
21881010801-Iss		95,80

TRÊS MIL E CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS

Total Retido:	143,8
Total Liquido:	3.052,1



Nº Processo
0000266

Nº Fila
135

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

TERMO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 15.190.486/0001-45
Nome: MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA GETULIO VARGAS
Bairro: CENTRO
E-mail: 1@

Compl:
Cidade: Japaratuba
Telefone: (79)3213-0564

UF: SE
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência: 22063

Conta: 1100009

EMPENHO	EMIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	FORTE
0402001	02/04/2024	1055.44905100-17200000	Global	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FPD Lei 9.478/1997

HISTÓRICO DO EMPENHO

N.E 0201015 CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM (MENOR) DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023 E CONTRATO Nº 22/2024.

Documentação	
Nota Fiscal	17
Valor	R\$ 3.196,00
Emissão	10/04/2024
Horário de Entrega	10/04/2024 12:57:47

Para acompanhar o andamento do seu processo na fila pública, acesse o link abaixo:

<http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pirambu/fornecedor/filapagamento>

Cadastrado por: Santiago Santos Gois

MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento Tributário - Praça 16 de Outubro, Nº 135, Centro - Carmópolis/SE, CEP: 49.7490-000 Telefone: (79) 3277-1210

Nota: 2024000

00000017

Código Verificação

2WQX-K5H6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

10/04/2024 08:35:27

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

04/2024

Exigibilidade do ISS

Exigível em Pirambu

Município de Prestação do Serviço

Pirambu - SE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

Nome Fantasia

MARTINS ENGENHARIA

CPF/CNPJ

15.190.486/0001-45

Inscrição Municipal

200052591

Inscrição Estadual

271630531

Simples Nacional

Não

Email

marcos@martinslocserv.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 99988-9649

Endereço

RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS, SN, Santa Barbara - CEP: 49740-000 - Carmópolis - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

prefeitura municipal pirambu

CPF/CNPJ

13.095.039/0001-81

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3276-1203

E-mail

pirambu@pirambu.com.br

Endereço

(Localidade), 16, praça nossa senhora de lurdas - Não informado - CEP: 49190-000 - Pirambu - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4299599

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO VALOR TOTAL DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOC. NO CONJ. REINALDO MOURA E CONJ. LORIVAL BOMFIM - PIRAMBU/SE. CONTRATO MUNICIPAL Nº 04/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023.

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2024 A 31/03/2024.

PRAÇA LOURIVAL BOMFIM- R\$ 27.420,97 ;
PRAÇA LOURIVAL BOMFIM MENOR - R\$ 3.196,00 ;
PRAÇA REINALDO MOURA - R\$ 52.199,22

Material 40%

Mão de Obra 60%

DADOS BANCARIOS:

BANCO DO NORDESTE: 004

AG: 180

CONTA CORRENTE: 012186-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU DECLARO QUE

- ☒ Os serviços foram prestados
☐ Os produtos foram entregues
☐ A obra foi executada

Data: 10/04/24

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)
538,31

COFINS (R\$)
2.484,49

INSS (R\$)
0,00

IR (R\$)
1.242,24

CSLL (R\$)
828,16

Outras Retenções (R\$)
0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)
82.816,19
ISS (R\$)

Deduções (R\$)
49.689,71
ISS Retido (R\$)
1.656,32

Desconto Incondicionado (R\$)
0,00
Desconto Condicionado (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
33.126,48
Valor Líquido (R\$)
76.066,67

Alíquota (%)
5,00
Valor Total da Nota (R\$)
82.816,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 11.138,78 Federal e R\$ 4.140,81 Municipal. Fonte: IBPT [D8CAC2]

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 10/04/2024 08:35:28

Para validação desta NFSe acesse: <http://carmopolisse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240372790

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

MANOEL MESSIAS SOARES NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2717976612

Registro: 2717976612SE

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pirambu**

RUA RUA GIVALDO MOURA DA SILVA

Complemento:

Cidade: **PIRAMBU**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

Nº: 16

CEP: 49190000

Contrato: 46/2024

Valor: **RS 0,00**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO Aguilhadas, Agua Boa, Santa Isabel e Aningas

Nº: s/n

Complemento:

Cidade: **PIRAMBU**

Data de Início: **05/02/2024**

Previsão de término: **10/06/2024**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

CEP: 49190000

Coordenadas Geográficas: **-10.738663, -36.856585**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Pirambu**

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	4.843,29	m2
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	4.445,53	m2
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO	918,20	m
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO	711,90	m3
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS	16,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES	240,00	m2
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS	13,00	un
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	266,50	m2
14 - Elaboração		
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART referente ao serviço de fiscalização, nas reformas e construção de praças nos povoados de Aguilhadas, Agua Boa, Santa Isabel e Aningas, deste município de Pirambu-Se

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publicoi/>, com a chave: AcD5D
Impresso em: 02/04/2024 às 15:01:17 por: , ip: 177.37.182.91

www.crea-se.org.br
Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br
Fax: XXXX-XXXX

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240372790

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MANOEL MESSIAS SOARES NETO - CPF: 049.126.295-70

Local

data

Prefeitura Municipal de Pirambu - CNPJ: 13.095.039/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em: 01/04/2024

Valor pago: R\$ 99,64

Nosso Número: 8203072194



Documento assinado digitalmente

MANOEL MESSIAS SOARES NETO

Data: 02/04/2024 15:00:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publicoi/>, com a chave: AcD5D
Impresso em: 02/04/2024 às 15:01:18 por: , ip: 177.37.182.91

www.crea-se.org.br
Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br
Fax: XXXX-XXXX





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240372776

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

MANOEL MESSIAS SOARES NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2717976612

Registro: 2717976612SE

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pirambu**

RUA RUA GIVALDO MOURA DA SILVA

Complemento:

Cidade: **PIRAMBU**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

Nº: 16

CEP: 49190000

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 0,00**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA PIRAMBU

Complemento: **Conjunto Reinaldo Moura**

Cidade: **PIRAMBU**

Data de Início: **05/02/2024**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Pirambu**

Nº: s/n

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

CEP: 49190000

Previsão de término: **05/05/2024**

Coordenadas Geográficas: **-10.738536, -36.856371**

Código: **49190-000**

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS 1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

Quantidade

Unidade

1.366,95

m2

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS 4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

1.366,95

m2

60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS 5.3.1.7 - MEIO-FIO

286,00

m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART referente ao serviço de fiscalização, de construção de 01 (uma praça) localizada no conjunto Reinaldo Moura e Reforma de 02 (duas) praças no conjunto Lourival Bomfim, na Sede do Município de Pirambu-SE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE



Documento assinado digitalmente

MANOEL MESSIAS SOARES NETO

Data: 02/04/2024 15:01:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br/>

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MANOEL MESSIAS SOARES NETO - CPF: 049.126.295-70

Local

data

Prefeitura Municipal de Pirambu - CNPJ: 13.095.039/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 99,64**

Registrada em: **01/04/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **8203072119**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0CdDd
Impresso em: 02/04/2024 às 15:00:34 por: , ip: 177.37.182.91

www.crea-se.org.br

Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br

Fax: XXXX-XXXX



CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 472140/2024
Emissão: 11/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: Yc5bC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ: 15.190.486/0001-45

Registro: 0000162345

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 04/11/2021

Faixa: 4

Objetivo Social Pleno: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A PROSPECÇÃO E EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; CARGA E DESCARGA; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO E REPARO; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS, EXCETO PARA VEÍCULOS; SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS; OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS; INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCILOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES; DECORAÇÃO E JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE ÁRVORES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA: AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, AMBIENTAL E MECÂNICA, SÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A PROSPECÇÃO E EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO); INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS, EXCETO PARA VEÍCULOS; SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS; INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCILOS.

Endereço Matriz: RUA JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS, S/N, QUADRA B, GALPÃO 01, ANTÔNIO BARRETO TELES, CARMÓPOLIS, SE. 49740000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 13/05/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000016251DDSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes do seu quadro técnico.
- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 472140/2024
Emissão: 11/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: Yc5bC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DIEGO SANTOS DA SILVA

Registro: 1016601867

CPF: 043.***.***-93

Data Início: 13/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66 E DO ARTIGO 2 DA RESOLUÇÃO N. 447/2000 DO CONFEA, PODENDO ATUAR NAS ÁREAS DE: DESENHO TÉCNICO: TOPOGRAFIA; PLANIMETRIA E ALTIMETRIA; HIDROLOGIA; CONTROLE DA POLUIÇÃO DO SOLO; ÁGUA; ATMOSFÉRICA E INDUSTRIAL; MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, HIDRÁULICA; GEOPROCESSAMENTO; SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS; CLIMATOLOGIA; GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ECOTURISMO; SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO; GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS; TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO; TRATAMENTO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO; REMEDIAÇÃO EM ÁREAS CONTAMINADAS; GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME PROC.75338/2016.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DINESH KUMAR

Registro: 2700970888

CPF: 267.***.***-49

Data Início: 12/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOAO LIMA ANDRADE FILHO

Registro: 2715651074

CPF: 048.***.***-52

Data Início: 21/05/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOÃO VICTOR SANTOS

Registro: 2720688100

CPF: 078.***.***-75

Data Início: 22/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966; PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29 DE JUNHO DE 1973 DO CONFEA COMBINADO COM O DISPOSTO NO ART. 25 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, REFERENTES AO CAMPO DE ATUAÇÃO E COMPETÊNCIAS EM: MECÂNICA APLICADA: SISTEMAS ESTRUTURAIS MECÂNICOS METÁLICOS, DE OUTROS MATERIAIS; SISTEMAS, MÉTODOS E PROCESSOS: DE PRODUÇÃO DE ENERGIA MECÂNICA, DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA MECÂNICA, DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA MECÂNICA, DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA MECÂNICA; SISTEMAS VIBRATÓRIOS E ACÚSTICOS; TERMODINÂMICA APLICADA: SISTEMAS MÉTODOS E PROCESSOS: DE PRODUÇÃO DE ENERGIA TÉRMICA, DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA TÉRMICA, DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TÉRMICA, DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA TÉRMICA; CONDICIONAMENTO DE AR; CONFORTO AMBIENTAL; SISTEMAS TÉRMICOS; MÁQUINAS TÉRMICAS; CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO; REFRIGERAÇÃO; MÁQUINAS FRIGORÍFICAS; FENÔMENO DOS TRANSPORTES: SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS; SISTEMAS, MÉTODOS E PROCESSOS DE: ARMAZENAMENTO DE FLUIDOS, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FLUIDOS, E UTILIZAÇÃO DE FLUIDOS; PNEUMÁTICA; HIDROTÉCNICA; FONTES DE ENERGIA; CONVERSÃO DE ENERGIA; OPERAÇÕES UNITÁRIAS; MÁQUINAS DE FLUXO; TECNOLOGIA MECÂNICA; MÉTODOS E PROCESSOS DE USINAGEM; CONFORMAÇÃO; TRANSPORTADORES E ELEVADORES; VEÍCULOS AUTOMOTORES.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 472140/2024
Emissão: 11/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: Yc5bC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

ENGENHARIA DO PRODUTO. CONSIDERANDO QUE O CÓDIGO 131-08-00 REFERE-SE A ESTA TITULARIDADE NA RESOLUÇÃO 473/02 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Obrá: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBUSE.

Contratada: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

Prazo: 03 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO

B.M.Nº: 02

Período: 01/03/24 A 31/03/24

CONTRATO Nº 22/2023

ORDEM DE SERVIÇO Nº



Data da medição: 01/04/2024

Itens		Quantidades					Preço Unit. (R\$)		Valores (R\$)					% Medido
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		
01	PRAÇA MAIOR LOURIVAL BONFIM													
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	un		1,00	0,00	1,00	0,00	488,63	488,63	0,00	488,63	0,00	100,00	
01.01.001	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metal 20 x 20cm e escoamento, instalada - Rev.02 - 09/2021	m2		368,20	0,00	368,20	0,00	11,56	4.256,39	0,00	4.256,39	0,00	100,00	
01.01.002	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2		368,20	0,00	368,20	0,00	0,77	283,51	0,00	283,51	0,00	100,00	
01.01.003	Locação de praças com piquetes de madeira	un		1,00	0,00	1,00	0,00	1.892,86	1.892,86	0,00	1.892,86	0,00	100,00	
01.01.004	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev.01	m2						42.355,87	24.330,64	9.234,46	33.565,10	8.790,78	79,25	
01.02	PAVIMENTAÇÃO	m2											50,00	
01.02.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2		184,10	0,00	184,10	184,10	28,05	10.328,01	5.164,01	5.164,01	5.164,01		
01.02.002	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2		368,20	184,10	368,20	0,00	50,16	18.468,91	9.234,46	18.468,91	0,00	100,00	
01.02.003	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2		368,20	0,00	368,20	368,20	9,85	3.626,77	0,00	0,00	3.626,77	0,00	
01.02.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un		1,00	0,00	1,00	0,00	451,03	451,03	0,00	451,03	0,00	100,00	
01.02.005	Cachão de areia	m3		73,60	73,60	73,60	0,00	128,82	9.481,15	9.481,15	9.481,15	0,00	100,00	
01.03	PAISAGISMO	m2		40,15	0,00	40,15	0,00	22,77	914,22	0,00	914,22	0,00	100,00	
01.03.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m		8,74	0,00	8,74	8,74	87,12	761,43	0,00	761,43	0,00	100,00	
01.04	DIVERSOS	un		1,00	0,00	1,00	0,00	2.565,57	2.565,57	0,00	2.565,57	0,00	100,00	
01.04.001	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada	un		1,00	0,00	1,00	0,00	868,08	868,08	0,00	868,08	0,00	100,00	
01.04.002	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv, ø=1 1/2", Serpapak ou similar	un		1,00	0,00	1,00	0,00	1.112,40	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00	100,00	
01.04.003	Equipamento de ginástica - Plancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchito em madeira, rel. Serpapak ou similar	un		1,00	0,00	1,00	0,00	1.112,40	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00	100,00	
01.04.004	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv, ø=2", conjunto com 03 unidades, Serpapak ou similar	m		23,13	0,00	23,13	0,00	212,40	4.912,81	0,00	4.912,81	0,00	100,00	
01.04.005	Fornecimento de Luminária 04 pérolas em Led, iluminação pública, 180w, 4000K, 220V, e suporte em tubo aço galv, com Anteparo, de Ilumatic, mod LPL Ayes ou similar	un		1,00	0,00	1,00	0,00	4.581,23	4.581,23	0,00	4.581,23	0,00	100,00	
01.04.006	Lixeiras em eucalipto perfurado e autoclavado 0,45m x 0,45m x 0,53m	un		3,00	0,00	3,00	3,00	390,91	1.172,73	0,00	0,00	1.172,73	0,00	
01.05	QUÍMICO	m3		0,50	0,00	0,00	0,50	2.638,44	1.319,22	0,00	0,00	1.319,22	0,00	
01.05.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3		0,69	0,00	0,00	0,69	4.144,93	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	
01.05.002	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelim ou madeira de lei	m2		16,96	0,00	0,00	16,96	17,79	301,72	0,00	0,00	301,72	0,00	
01.05.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	un		1,00	0,00	0,00	1,00	1.337,27	1.337,27	0,00	0,00	1.337,27	0,00	
01.05.004	Massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 6m a 8 m	un												

[Handwritten signature]

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

Obr:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBUSE.				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 22/2023
Contratada:	MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA				B.M.Nº: 02				ORDEM DE SERVIÇO Nº
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU				Período: 01/03/24 À 31/03/24				MARTINS
Prazo:	03 MESES				Data de medição: 01/04/2024				Locação e Serviço

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades				Valores (R\$)				% Medido			
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior		Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir
01.05.005	Maderamento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	53,69	859,04	0,00	0,00	0,00	859,04	0,00
01.05.006	Maderamento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ rpaço 5 x 3cm e rpa 4 x 1,5cm, exclusivas peças principais	m²	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	112,13	2.803,25	0,00	0,00	0,00	2.803,25	0,00
01.05.007	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, chaparrinho ou similar - Rev.02	m²	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	60,77	1.519,25	0,00	0,00	0,00	1.519,25	0,00
01.05.008	Entrada de energia elétrica bitásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev.01	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2.119,81	2.119,81	0,00	2.119,81	2.119,81	0,00	100,00
01.05.009	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 25mm (3/4")	m	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,10	377,50	0,00	0,00	0,00	377,50	0,00
01.05.010	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/750V / 70°C	m	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	12,46	934,50	0,00	0,00	0,00	934,50	0,00
01.05.011	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusivas disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	125,43	125,43	0,00	0,00	0,00	125,43	0,00
01.05.012	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5kA, ref. Siemens 5 SX1 ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,79	20,79	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00
01.05.013	Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto	pt	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	69,78	139,56	0,00	0,00	0,00	139,56	0,00
01.05.014	Ponto de interruptor 01 seção simples c/placa, com canalista plástica c/diâmetro 20x10mm	pt	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	288,86	288,86	0,00	0,00	0,00	288,86	0,00
01.05.015	Luminária fluorescente tubular 2 x 20 w / 127 v, completa	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	160,59	321,18	0,00	0,00	0,00	321,18	0,00
01.05.016	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, 2 bancos em concreto armado (semi circular), com pintura acrílica	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.291,52	1.291,52	0,00	0,00	0,00	1.291,52	0,00
01.06	CANTERO	m	100,45	100,45	0,00	100,45	0,00	32,87	3.767,88	3.301,79	0,00	3.301,79	466,09	100,00
01.06.001	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	100,45	0,00	0,00	0,00	100,45	4,64	466,09	0,00	0,00	0,00	466,09	0,00
01.06.002	Pintura de meio fio (calçamento)	m²	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	677,66	677,66	0,00	0,00	0,00	677,66	0,00
01.07	SERVIÇOS FINAIS	un	1,00	0,00	0,00	0,00	0,35	877,61	307,16	0,00	0,00	0,00	307,16	0,00
01.07.001	Marco inaugural - Rev. 01	m²	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	56.750,35	43.116,69	3.196,00	46.312,69	10.437,67	81,61	100,00
01.07.002	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobrenosto	m²	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	5.513,44	5.513,44	0,00	0,00	0,00	5.513,44	0,00
02	PRAÇA MENOR LOURIVAL BOMFIM	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	488,65	488,65	0,00	0,00	0,00	488,65	100,00
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	488,65	488,65	0,00	0,00	0,00	488,65	100,00
02.01.001	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalão 20 x 20cm e esquadramento, instalação - Rev.02 - 09/2021	m²	253,61	253,61	0,00	253,61	0,00	11,56	2.931,73	2.931,73	0,00	2.931,73	0,00	100,00
02.01.002	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,77	200,20	200,20	0,00	200,20	0,00	100,00
02.01.003	Locação de praças com diques de madeira	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1.892,86	1.892,86	0,00	0,00	0,00	1.892,86	0,00
02.01.004	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev.01	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	34.994,41	32.496,35	2.498,06	32.496,35	2.498,06	92,86	100,00
02.02	PAVIMENTAÇÃO	m²	253,61	253,61	0,00	253,61	0,00	28,05	7.113,76	7.113,76	0,00	7.113,76	0,00	100,00
02.02.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m²	253,61	253,61	0,00	253,61	0,00	50,16	12.721,08	12.721,08	0,00	12.721,08	0,00	100,00
02.02.002	Piso em concreto simples desarmado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de soldagem - três usos	m²	253,61	253,61	0,00	253,61	0,00	9,85	2.498,06	0,00	0,00	0,00	2.498,06	0,00
02.02.003	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	un	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	451,03	902,06	902,06	0,00	902,06	0,00	100,00
02.02.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples fck=25MPa, desarmada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	451,03	902,06	902,06	0,00	902,06	0,00	100,00
Martins Engenharia														

Handwritten signature and initials.

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
 Engenheiro Civil
 CREA: 270097088-8

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBUSE.

MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

03 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO



CONTRATO Nº 22/2023

ORDEM DE SERVIÇO Nº

Locação e Serviços

Locação e Serviços

B.M.Nº. 02
Período: 01/03/24 A 31/03/24

Data da medição: 01/04/2024

Item	Descrição dos Serviços	Und	Contratada	Quantidades				Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
				Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado Período	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
02.02.005	Colchão de areia	m ³	50,72	50,72	0,00	50,72	0,00	128,82	6.533,75	6.533,75	0,00	6.533,75	0,00	100,00
02.02.006	Composição paramétrica para execução de escada em concreto armado, moldada in loco, fck = 25 mpa, al. 11/2022	m ³	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5.225,70	5.225,70	5.225,70	0,00	5.225,70	0,00	100,00
02.03	PAISAGISMO	m ²	12,60	0,00	12,60	12,60	0,00	22,77	286,90	0,00	286,90	286,90	0,00	100,00
02.03.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m ²	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40	87,12	9.663,34	3.003,34	0,00	3.003,34	6.660,01	31,08
02.04.001	Corrimão em aço inox, esquadro, d=1 1/2"	m	14,14	14,14	0,00	14,14	0,00	212,40	3.003,34	3.003,34	0,00	3.003,34	0,00	100,00
02.04.002	Barco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 dentes.	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4.581,23	4.581,23	0,00	0,00	0,00	4.581,23	0,00
02.04.003	Fornecimento de luminária 04 pêssejos em Led, iluminação pública, 180w, 4000k, 220v, e suporte em tubo aço galv, com Anteparo, da Ilumatec, mod LPL Ares ou similar.	un	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	390,91	1.172,73	0,00	0,00	0,00	1.172,73	0,00
02.04.004	Lixeiros em eucalipto perfurado e autoclavado 0,45m x 0,45m x 0,53m	un	63,53	63,53	0,00	63,53	0,00	32,87	2.383,01	2.088,23	0,00	2.088,23	294,78	87,63
02.05	CANTEIRO	m	63,53	63,53	0,00	63,53	0,00	2.088,23	2.088,23	2.088,23	0,00	2.088,23	0,00	100,00
02.05.001	Mão-de-obra de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	63,53	0,00	0,00	0,00	63,53	4,64	294,78	0,00	0,00	0,00	294,78	0,00
02.05.002	Pintura de meio fio (Canalão)	m	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	677,66	677,66	0,00	0,00	0,00	677,66	0,00
02.06	SERVIÇOS FINAIS	m ²	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	877,61	307,16	0,00	0,00	0,00	307,16	0,00
02.06.001	Marco inaugural - Rev. 01	m ²	127,76	127,76	0,00	127,76	0,00	0,12	15,33	15,33	0,00	0,00	0,00	100,00
02.06.002	Placa em acrílico branco lático dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	m ²	127,76	127,76	0,00	127,76	0,00	22,77	143,815,08	18,336,31	52,199,22	70,535,53	73,279,54	49,05
02.07	RECUPERAÇÃO DE TALUDE	m ²	127,76	0,00	127,76	127,76	0,00	6,533,28	5,964,44	5,964,44	0,00	6,533,28	0,00	100,00
02.07.001	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m ²	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	488,64	488,64	488,64	0,00	488,64	0,00	100,00
02.07.002	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	568,84	568,84	568,84	0,00	568,84	0,00	100,00
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,77	1,892,86	1,892,86	0,00	0,00	0,00	100,00
03.01	PRACA REINALDO MOURA	m ²	738,75	738,75	0,00	738,75	0,00	1,892,86	1,892,86	1,892,86	0,00	0,00	0,00	100,00
03.01.001	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metelo 20 x 20cm e escoamento, instalada - Rev.02 - 09/2021	m ²	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	4,85	3,582,94	3,582,94	0,00	0,00	0,00	100,00
03.01.002	Locação de placas com piquetes de madeira	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	20,721,94	20,721,94	0,00	0,00	0,00	20,721,94	0,00
03.01.003	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev.01	m ²	738,75	738,75	0,00	738,75	0,00	77,877,23	12,371,87	29,339,85	41,711,72	36,165,51	53,56	53,56
03.01.004	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m ²	738,75	738,75	0,00	738,75	0,00	18,527,85	18,527,85	18,527,85	0,00	0,00	0,00	100,00
03.02	PAVIMENTAÇÃO	m ²	738,75	0,00	369,38	369,38	0,00	28,05	727,69	0,00	0,00	0,00	727,69	0,00
03.02.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m ²	738,75	0,00	0,00	0,00	738,75	9,85	451,03	451,03	0,00	451,03	0,00	100,00
03.02.002	Piso em concreto simples desarmado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de = 1 cm, com aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo	m ²	738,75	0,00	0,00	0,00	738,75	50,16	37,055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.003	concretagem - tres usos	m ²	738,75	0,00	0,00	0,00	738,75	7,276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desarmada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	451,03	451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03.02.005	Colchão de areia	m ³	96,04	96,04	0,00	96,04	0,00	128,82	12,371,87	12,371,87	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	PAISAGISMO	m ²	26,58	0,00	0,00	0,00	26,58	22,77	605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m ²	26,58	0,00	0,00	0,00	26,58	16,186,88	16,186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	DIVERSOS	m ²	26,58	0,00	0,00	0,00	26,58	36,649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 240097088-8

Obrá: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESJE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.

Contratada: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

Prazo: 03 MESES

BOLETIM DE MEDIÇÃO

B.M.Nº: 02

Período: 01/03/24 A 31/03/24

CONTRATO Nº 22/2023

ORDEM DE SERVIÇO Nº

MARTINS
Locação e Serviços

Data da medição: 01/04/2024

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)		Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Salto a medir			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Salto a medir	
03.04.001	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev 01	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2.565,57	2.565,57	0,00	0,00	2.565,57	2.565,57	0,00	100,00
03.04.002	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2". Sergipark ou similar	Un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	868,08	868,08	0,00	0,00	868,08	868,08	0,00	100,00
03.04.003	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1.112,40	1.112,40	0,00	0,00	1.112,40	1.112,40	0,00	100,00
03.04.004	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar	Un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1.112,40	1.112,40	0,00	0,00	1.112,40	1.112,40	0,00	100,00
03.04.005	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pinado com tinta acrílica, 2 dentes.	m	112,00	0,00	28,00	28,00	84,00	212,40	23.788,80	0,00	0,00	5.947,20	5.947,20	17.841,60	25,00
03.04.006	Fornecimento de Luminária 04 pétales em Led, iluminação pública, 180w, 4000K, 220v, e suporte em tubo aço galv. com Anteparo, mod LPL Aves ou similar.	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4.581,23	4.581,23	0,00	0,00	4.581,23	4.581,23	0,00	100,00
03.04.007	Lixeiras em eucalipto perfurado e autoclavado 0,45m x 0,45m x 0,53m	un	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	390,91	1.172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,73	0,00
03.04.008	Banco em eucalipto perfurado autoclavado com 1,60m x 0,45m x 0,89m	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	724,10	1.448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,20	0,00
03.05	QUOSQUE	m3						16.618,90	0,00	0,00	2.119,81	2.119,81	14.499,09	12,76	
03.05.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado, 12mm (05 usos)	m3	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	2.638,44	1.319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,22	0,00
03.05.002	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massa aranduva, angelim ou madeira de lei	m2	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	4.144,93	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00
03.05.003	Pinura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	16,96	0,00	0,00	0,00	16,96	17,79	301,72	0,00	0,00	0,00	0,00	301,72	0,00
03.05.004	Madreimento em massa aranduva/madeira de lei, tescura com vão de 6m a 8 m	m	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.337,27	1.337,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,27	0,00
03.05.005	Madreimento em massa aranduva/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m2	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	53,69	859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	859,04	0,00
03.05.006	Madreimento em massa aranduva/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusiva peças principais	m2	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	112,13	2.803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,25	0,00
03.05.007	Telhamento com tela cerâmica tipo colonial, 1º qualid, cor clara, lãbalaínha ou similar - Rev 02	m2	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	60,77	1.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,25	0,00
03.05.008	Entrada de energia elétrica bitásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	m	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2.119,81	2.119,81	0,00	0,00	2.119,81	2.119,81	0,00	100,00
03.05.009	Eletroduto de pvc rígido roscaível, diâm = 25mm (3/4")	m	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,10	377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	377,50	0,00
03.05.010	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/750V / 70°C	m	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	12,46	934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	934,50	0,00
03.05.011	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	125,43	125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	125,43	0,00
03.05.012	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5kA, ref. Siemens 5 SX1 ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,79	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00
03.05.013	Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto	pt	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	69,78	139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	139,56	0,00
03.05.014	Ponto de interruptor 01 seção simples cúbica, com canaliza plástica c/divisória 20x10mm	pt	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	288,86	288,86	0,00	0,00	0,00	0,00	288,86	0,00
03.05.015	Luminária fluorescente tubular 2 x 20 w / 127 v, completa	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	160,59	321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	321,18	0,00

Martins Engenharia
Dineshy Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

Obra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBUSE.										CONTRATO Nº 22/2023									
Contratada: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA										ORDEN DE SERVIÇO Nº									
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU										MARTINS Locação e Serviços									
Prazo: 03 MESES										B.M.Nº: 02									
										Período: 01/03/24 À 31/03/24									
										Data da medição: 01/04/2024									
Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir						
03.05.016	Mesa c/ lampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, 2 bancos em concreto armado (semi circular), com pintura acrílica.	Un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.291,52	1.291,52	0,00	0,00	0,00	1.291,52	0,00					
03.06	CANTEIRO	m							4.546,21	0,00	3.983,84	3.983,84	562,37	87,63					
03.06.001	Moldo de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	121,20	0,00	121,20	0,00	0,00	32,87	3.983,84	0,00	3.983,84	3.983,84	0,00	100,00					
03.06.002	Pintura de meio fio (calção)	m	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	4,64	562,37	0,00	0,00	0,00	562,37	0,00					
03.07	SERVIÇOS FINAIS	Un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	677,66	984,82	0,00	0,00	0,00	984,82	0,00					
03.07.001	Marco inaugural - Rev. 01	Un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	677,66	677,66	0,00	0,00	0,00	677,66	0,00					
03.07.002	Placa em acrílico branco lêsoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	m2	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	877,61	307,16	0,00	0,00	0,00	307,16	0,00					
TOTAL								R\$ 289.215,17	R\$ 96.006,83	R\$ 82.816,19	R\$ 178.823,02	R\$ 110.392,15							
PERCENTAGEM								100,00%	33,20%	28,63%	61,83%	38,17%	61,83%						
MARTINS Engenharia Dinesh Kumar Engenheiro Civil CREA: 270097088-8										APROVADO PARA PAGAMENTO DATA: Valor Aprovado: Emitir Nota Fiscal:									
MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUT. E SERV. IND. LTDA Engº Civil Dinesh Kumar - CREA 270097088-8 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA										R\$ 82.816,19									



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E
CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data :01/03/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 26 Dias Restante: 64

Equipam.	Betoneira estacionária	1		
	Serra Manual	1		
	Máquina de corte de piso	1		
	Carro de mão	4		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
	Armador			
	Servente	2		
Serviços	Execução de mureta- Praça maior			
	Limpeza e execução de chapisco e reboco dos bancos			
	Piso desempolado pça maior			
Observação				

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E
CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data :02/03/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 27 Dias Restante: 63

Equipam.	Betoneira estacionária	1
	Serra Manual	1
	Máquina de corte de piso	1
	Carro de mão	4

Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
	Armador			
	Servente	2		

Serviços	Piso desempolado pça maior

Observação	

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E
CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data :03/03/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

Tarde

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 28 Dias Restante: 62

Equipam.

Betoneira estacionária

Serra Manual

Máquina de corte de piso

Carro de mão

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

Mestre de Obras/ Encarregado

Carpinteiro

Pedreiro/Calceteiro

Armador

Servente

Almoxarife/Apontador

Encanador

Pintor

Eletricista

Serviços

Sem atividades

Observação

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E
CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data :04/03/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 29 Dias Restante: 61

Equipam.	Equipamento	
	Descrição	Quant.
Equipam.	Betoneira estacionária	1
	Serra Manual	1
	Máquina de corte de piso	1
	Carro de mão	4

Pessoa	Pessoa	
	Descrição	Quant.
Pessoa	Engenheiro	1
	Mestre de Obras/ Encarregado	1
	Carpinteiro	
	Pedreiro/Calceteiro	1
	Armador	
	Servente	2

Serviços	Serviços	
	Descrição	Quant.
Serviços	Reboco escada, execução de mureta e piso em concreto	
	Piso despolado pça maior	
	Instalação de brinquedos	
	Implantação de poste circular de concreto	
	Instalação de eletrodutos	

Observação	Observação	
	Descrição	Quant.
Observação		

Fiscalização:	Contratada:
	Martins Engenharia Dinesh Kumar Engenheiro Civil CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E
CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data :05/03/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra

90

Dias Decorrido:

30

Dias Restante:

60

Equipam.

Betoneira estacionária

1

Serra Manual

1

Máquina de corte de piso

1

Carro de mão

4

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Almoxarife/Apontador

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Encanador

Carpinteiro

Pintor

Pedreiro/Calceteiro

1

Eletricista

Armador

Servente

2

Serviços

Regularização de pisos e Piso em concreto despolado pça maior

Execução de drenagem em tubo de concreto d=300 mm -,pça maior

Observação

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E
CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data :06/03/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 31 Dias Restante: 59

Equipam.

Betoneira estacionária	1
Serra Manual	1
Máquina de corte de piso	1
Carro de mão	4

Pessoal

Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	
Carpinteiro		Pintor	
Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
Armador			
Servente	2		

Serviços

Regularização de pisos e Piso em concreto despolado pça maior
Execução de drenagem em tubo de concreto d=300 mm -,pça maior

Observação

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E
CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data :07/03/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 32 Dias Restante: 58

Equipam.	Betoneira estacionária	1		
	Serra Manual	1		
	Máquina de corte de piso	1		
	Carro de mão	4		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
	Armador			
	Servente	2		
Serviços	Regularização de pisos e Piso em concreto desempolado pça maior			
	Execução de drenagem em tubo de concreto d=300 mm e caixa de passagem -,pça maior			
Observação				

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E
CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data :08/03/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 33 Dias Restante: 57

Equipam.

Betoneira estacionária	1
Serra Manual	1
Máquina de corte de piso	1
Carro de mão	4

Pessoal

Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	
Carpinteiro		Pintor	
Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
Armador			
Servente	2		

Serviços

Regularização de pisos e Piso em concreto despolado pça maior
Execução de drenagem em tubo de concreto d=300 mm e caixa de passagem -,pça maior
Piso despolado pça maior

Observação

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E
CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data :09/03/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

Tarde

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 34 Dias Restante: 56

Equipam.

Betoneira estacionária

Serra Manual

Máquina de corte de piso

Carro de mão

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

Mestre de Obras/ Encarregado

Carpinteiro

Pedreiro/Calceteiro

Armador

Servente

Almoxarife/Apontador

Encanador

Pintor

Eletricista

Serviços

Observação

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E
CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data :10/03/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

Tarde

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 35 Dias Restante: 55

Equipam.

Betoneira estacionária

Serra Manual

Máquina de corte de piso

Carro de mão

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

Mestre de Obras/ Encarregado

Carpinteiro

Pedreiro/Calceteiro

Armador

Servente

Almoxarife/Apontador

Encanador

Pintor

Eletricista

Serviços

Observação

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E
CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data :11/03/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra

90

Dias Decorrido:

36

Dias Restante:

54

Equipam.

Betoneira estacionária

1

Serra Manual

1

Máquina de corte de piso

1

Carro de mão

4

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Almoxarife/Apontador

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Encanador

Carpinteiro

Pintor

Pedreiro/Calceteiro

1

Eletricista

Armador

Servente

2

Serviços

Execução de regularização de piso e piso em concreto desempolado

Mureta contenção do talude praça menor

Observação

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E
CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data :12/03/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 37 Dias Restante: 53

Equipam.	Equipamento	
	Descrição	Quant.
Equipam.	Betoneira estacionária	1
	Serra Manual	1
	Máquina de corte de piso	1
	Carro de mão	4

Pessoal	Pessoal	
	Descrição	Quant.
Pessoal	Engenheiro	1
	Mestre de Obras/ Encarregado	1
	Carpinteiro	
	Pedreiro/Calceteiro	1
	Armador	
	Servente	2

Serviços	Serviços	
	Descrição	Quant.
Serviços	Execução de regularização de piso e piso em concreto desempolado	
	Mureta contenção do talude praça menor	

Observação	Observação	
	Descrição	Quant.
Observação		

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E
CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data :13/03/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 38 Dias Restante: 52

Equipam.

Betoneira estacionária

1

Serra Manual

1

Máquina de corte de piso

1

Carro de mão

4

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Almoxarife/Apontador

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Encanador

Carpinteiro

Pintor

Pedreiro/Calceteiro

1

Eletricista

Armador

Servente

2

Serviços

Execução de regularização de piso e piso em concreto desempolado

Mureta contenção do talude praça menor/chapisco e reboco

Observação

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E
CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data :14/03/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 39 Dias Restante: 51

Equipam.

Betoneira estacionária

1

Serra Manual

1

Máquina de corte de piso

1

Carro de mão

4

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Almoxarife/Apontador

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Encanador

Carpinteiro

Pintor

Pedreiro/Calceteiro

1

Eletricista

Armador

Servente

2

Serviços

Piso em concreto desempolado

Mureta contenção do talude praça menor/chapisco e reboco

Observação

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E
CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data :15/03/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra

90

Dias Decorrido:

40

Dias Restante:

50

Equipam.

Betoneira estacionária

1

Serra Manual

1

Máquina de corte de piso

1

Carro de mão

4

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Almoxarife/Apontador

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Encanador

Carpinteiro

Pintor

Pedreiro/Calceteiro

1

Eletricista

Armador

Servente

2

Serviços

Piso em concreto desempolado

Mureta contenção do talude praça menor e maior /chapisco e reboco

Construção de rede de drenagem com tubo de concreto dia=300 mm - praça maior -final

Observação

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E
CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data :16/03/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

Tarde

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 41 Dias Restante: 49

Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Máquina de corte de piso			
	Carro de mão			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro		Eletricista	
	Armador			
	Servente			
Serviços	Sem atividades - sábado			
Observação				

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E
CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data :17/03/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

Tarde

Prazo da Obra 90

Dias Decorrido: 42


Dias Restante: 48


Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Máquina de corte de piso			
	Carro de mão			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro		Eletricista	
	Armador			
	Servente			
Serviços	Sem atividades - domingo			
Observação				

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU					
REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM			Contrato:	Data :18/03/2024	
			22/2023	Página: 1	
			Tempo	Sol	Nublado
			Manhã	x	
Prazo da Obra 90			Dias Decorrido: 43	Dias Restante: 47	Tarde
			x		
Equipam.	Betoneira estacionária		1		
	Serra Manual		1		
	Máquina de corte de piso		1		
	Carro de mão		4		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Encanador	
	Carpinteiro			Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro		1	Eletricista	
	Armador				
	Servente		2		
Serviços	Piso em concreto despolado, confecção de rampa, reboco de parede dos bancos				
	Demolição de meio fio _pça reinaldo moura				
Observação					
Fiscalização:			Contratada:		
			Martins Engenharia Dinesh Kumar Engenheiro Civil CREA: 270097088-8		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA									
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU											
REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023		Data :19/03/2024		Página: 1			
				Tempo		Sol		Nublado		Chuva	
				Manhã		x					
Prazo da Obra 90		Dias Decorrido: 44		Dias Restante: 46		Tarde		x			
Equipam.	Betoneira estacionária			1							
	Serra Manual			1							
	Máquina de corte de piso			1							
	Carro de mão			4							
Pessoal	Descrição			Quant.		Descrição			Quant.		
	Engenheiro			1		Almoxarife/Apontador					
	Mestre de Obras/ Encarregado			1		Encanador					
	Carpinteiro					Pintor					
	Pedreiro/Calceteiro			1		Eletricista					
	Armador										
	Servente			2							
Serviços	Piso em concreto despolado, reboco de parede dos bancos -Praças L. Bomfim										
	Assentamento de meio fio _Praça Cj. Reinaldo Moura										
	Demolição de meio fio _pça reinaldo moura										
Observação											
Fiscalização: 					Contratada: 						

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
 Engenheiro Civil
 CREA: 270097088-8

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:	22/2023
-----------	---------

Data : 20/03/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

X

Prazo da Obra	90	Dias Decorrido:	45	Dias Restante:	45
---------------	----	-----------------	----	----------------	----

Equipam.	Betoneira estacionária	1	
	Serra Manual	1	
	Máquina de corte de piso	1	
	Carro de mão	4	

Pessoal	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
	Armador			
	Servente	2		

Serviços	Assentamento de meio fio _Praça Cj. Reinaldo Moura	
	Execução de entrada de energia_ Pça R. Moura	
	Demolição de meio fio _pça reinaldo moura	

[illegible]

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E
CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 21/03/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra

90

Dias Decorrido:

46

Dias Restante:

44

Equipam.	Betoneira estacionária	1
	Serra Manual	1
	Máquina de corte de piso	1
	Carro de mão	4

Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
	Armador			
	Servente	2		

Serviços	Assentamento de meio fio _Praça Cj. Reinaldo Moura


Observação	

Fiscalização:

[Handwritten signature]

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS Engenharia			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU							
REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 22/03/2024		Página: 1
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã	x		
Prazo da Obra 90		Dias Decorrido: 47	Dias Restante: 43	Tarde	x		
Equipam.	Betoneira estacionária		1				
	Serra Manual		1				
	Máquina de corte de piso		1				
	Carro de mão		4				
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Encanador			
	Carpinteiro			Pintor			
	Pedreiro/Calceteiro		1	Eletricista			
	Armador						
	Servente		2				
Serviços	Assentamento de meio fio _Praça Cj. Reinaldo Moura						
	Regularização de piso e concretagem						
Observação							
Fiscalização:				Contratada:			
				Martins Engenharia Dinesh Kumar Engenheiro Civil CREA: 270097088-8			





PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E
CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 23/03/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

Tarde

Prazo da Obra

90

Dias Decorrido:

48

Dias Restante:

42

Equipam.

Betoneira estacionária

Serra Manual

Máquina de corte de piso

Carro de mão

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

Mestre de Obras/ Encarregado

Carpinteiro

Pedreiro/Calceteiro

Armador

Servente

Almoxarife/Apontador

Encanador

Pintor

Eletricista

Serviços

Sem atividades- sábado

Observação

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

[Handwritten signature]

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA					
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU							
REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 24/03/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã	x		
Prazo da Obra 90	Dias Decorrido: 49	Dias Restante: 41	Tarde	x			
Equipam.	Betoneira estacionária						
	Serra Manual						
	Máquina de corte de piso						
	Carro de mão						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador				
	Carpinteiro		Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro		Eletricista				
	Armador						
	Servente						
Serviços	Sem atividades - domingo						
Observação							
Fiscalização: 			Contratada: Martins Engenharia Dinesh Kumar Engenheiro Civil CREA: 270097088-8				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA					
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU							
REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 25/03/2024	Página: 1	
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva
				Manhã	x		
Prazo da Obra 90	Dias Decorrido: 50	Dias Restante: 40	Tarde	x			
Equipam.	Betoneira estacionária		1				
	Serra Manual		1				
	Máquina de corte de piso		1				
	Carro de mão		4				
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Encanador			
	Carpinteiro			Pintor			
	Pedreiro/Calceteiro		1	Eletricista			
	Armador						
	Servente		2				
Serviços	Assentamento de meio fio _Praça Cj. Reinaldo Moura						
	Regularização de piso e concretagem de pisos						
	Reboco de bancos						
Observação							
Fiscalização: 			Contratada: Martins Engenharia Dinesh Kumar Engenheiro Civil CREA: 270097088-8				





PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E
CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 26/03/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 51 Dias Restante: 39


Equipam.	Equipamento	
	Descrição	Quant.
	Betoneira estacionária	1
	Serra Manual	1
	Máquina de corte de piso	1
	Carro de mão	4

Pessoal	Pessoal	
	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1
	Mestre de Obras/ Encarregado	1
	Carpinteiro	
	Pedreiro/Calceteiro	1
	Armador	
	Servente	2

Serviços	Serviços	
	Descrição	Quant.
	Regularização de piso e concretagem de pisos	

Observação	Observação	
	Descrição	Quant.

Fiscalização:	Contratada:
	Martins Engenharia Dinesh Kumar Engenheiro Civil CREA: 270097088-8

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA							
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU									
REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023	Data : 27/03/2024	Página: 1			
				Tempo	Sol	Nublado	Chuva		
				Manhã	x				
Prazo da Obra	90	Dias Decorrido:	52	Dias Restante:	38	Tarde	x		
Equipam.	Betoneira estacionária		1						
	Serra Manual		1						
	Máquina de corte de piso		1						
	Carro de mão		4						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.			
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador					
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Encanador					
	Carpinteiro			Pintor					
	Pedreiro/Calceteiro		1	Eletricista					
	Armador								
	Servente		2						
Serviços	Assentamento de meio fio _Praça Cj. Reinaldo Moura								
Observação									
Fiscalização:				Contratada:					
				Martins Engenharia Dinesh Kumar Engenheiro Civil CREA: 270097088-8					





PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E
CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 28/03/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Tarde

x

Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 53 Dias Restante: 37

Equipam.	Betoneira estacionária	1
	Serra Manual	1
	Máquina de corte de piso	1
	Carro de mão	4

Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro	1	Eletricista	
	Armador			
	Servente	2		


Serviços	Limpeza da área das praças
	Regularização de piso e concretagem de pisos
	Instalação de postes circulares de concreto 12/200
	Instalação de luminárias

Observação	

Fiscalização:

Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		DIÁRIO DE OBRA		 MARTINS Engenharia						
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU										
REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM				Contrato: 22/2023		Data : 29/03/2024		Página: 1		
				Tempo		Sol	Nublado	Chuva		
				Manhã						
Prazo da Obra 90		Dias Decorrido: 54		Dias Restante: 36		Tarde				
Equipam.	Betoneira estacionária									
	Serra Manual									
	Máquina de corte de piso									
	Carro de mão									
Pessoal	Descrição			Quant.		Descrição			Quant.	
	Engenheiro					Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado					Encanador				
	Carpinteiro					Pintor				
	Pedreiro/Calceteiro					Eletricista				
	Armador									
	Servente									
Serviços	Sem atividade_ Feriado									
Observação										
Fiscalização:					Contratada:					
					Martins Engenharia Dinesh Kumar Engenheiro Civil CREA: 270097088-8					





PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E
CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 30/03/2024

Página: 1

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

Tarde

Prazo da Obra



90

Dias Decorrido:

55

Dias Restante:

35

Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Máquina de corte de piso			
	Carro de mão			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro		Eletricista	
	Armador			
	Servente			
Serviços	Sem atividade_ Sábado			
Observação				
Fiscalização:		Contratada:		
		 Martins Engenharia Dinesh Kumar Engenheiro Civil CREA: 270097088-8		



MEMORIA DE CÁLCULO - BM 02 CT								
PERÍODO (01/03/2024 - 31/03/2024)								
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTA MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.							
CONTRATADA:	MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA							
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU							
CONTRATO Nº:	22/2023							
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
Item	Discriminação dos Serviços	UND	COMP.	LARG.	PROF/ALT	TAXA	PARCIAL	TOTAL
01	PRAÇA MAIOR LOURIVAL BONFIM							
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.02	PAVIMENTAÇÃO							
01.02.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2						184,10
01.02.002	Piso em concreto simples desarmado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2						184,10
01.02.005	Colchão de areia	m3						73,60
01.03	PAISAGISMO							
01.03.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2						40,15
01.04	DIVERSOS							
01.04.002	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev 01	un						1,00
01.04.003	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou similar	Un						1,00
01.04.004	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un						1,00
01.04.005	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar	Un						1,00
01.04.006	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m						23,13
01.04.007	Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, iluminação pública, 180w, 4000k, 220v, e suporte em tubo aço galv, com Anteparo, da Ilumatic, mod LPL Ares ou similar	un						1,00
01.05	QUIOSQUE							
01.06	CANTEIRO							
01.07	SERVIÇOS FINAIS							
02	PRAÇA MENOR LOURIVAL BONFIM							
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES							
02.02	PAVIMENTAÇÃO							
02.03	PAISAGISMO							
02.03.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2						12,60
02.04	DIVERSOS							
02.05	CANTEIRO							
02.06	SERVIÇOS FINAIS							
02.07	RECUPERAÇÃO DE TALUDE							
02.07.002	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2						127,76
03	PRAÇA REINALDO MOURA							
03.01	SERVIÇOS PRELIMINARES							
03.01.002	Locação de praças com piquetes de madeira	M2						738,75
03.02	PAVIMENTAÇÃO							
03.02.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2						369,38
03.02.002	Piso em concreto simples desarmado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2						369,38
03.02.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desarmado, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un						1,00

Martins Engenharia
 Dinesh Kumar
 Engenheiro Civil
 CREA: 270097088-8

MEMORIA DE CÁLCULO - BM 02 CT								
PERÍODO (01/03/2024 - 31/03/2024)								
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.							
CONTRATADA:	MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA							
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU							
CONTRATO Nº:	22/2023							
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
Item	Discriminação dos Serviços	UND	COMP.	LARG.	PROF/ALT	TAXA	PARCIAL	TOTAL
03.03	PAISAGISMO							
03.04	DIVERSOS							
03.04.001	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev 01	un						1,00
03.04.002	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou similar	Un						1,00
03.04.003	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un						1,00
03.04.004	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar	Un						1,00
03.04.005	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m						28,00
03.04.006	Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/iluminação pública, 180w, 4000k, 220v, e suporte em tubo aço galv, com Anteparo, da Ilumatic, mod LPL Ares ou similar	un						1,00
03.05	QUIOSQUE							
03.05.008	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un						1,00
03.06	CANTEIRO							
03.06.001	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m						121,20
03.07	SERVIÇOS FINAIS							
 Martins Engenharia Dinesh Kumar Engenheiro Civil CREA: 270097088-8 								
MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA Engº Civil Dinesh Kumar - CREA 270097088-8								



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAMBU

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

REFORMA DE PRAÇAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E
CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM

Contrato:
22/2023

Data : 31/03/2024

Página: 1

Tempo

Nublado

Chuva

Manhã

Tarde

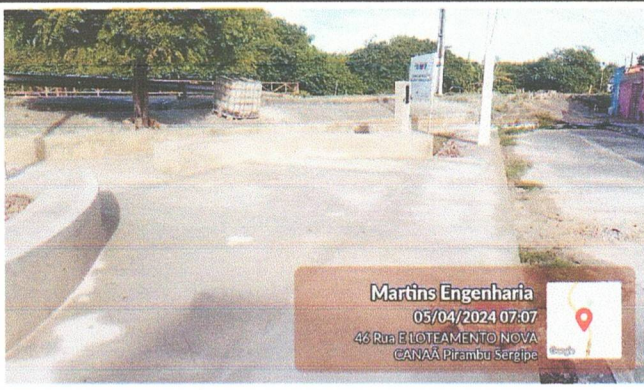
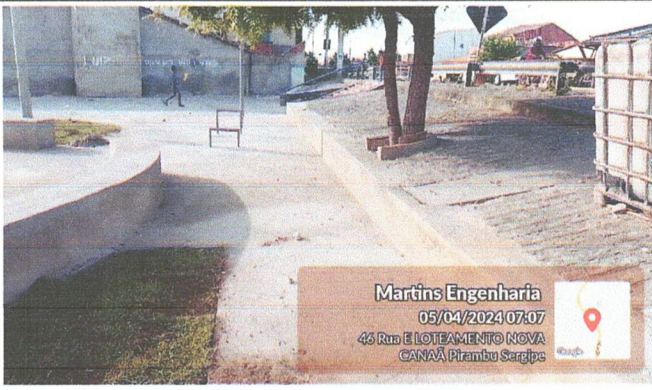
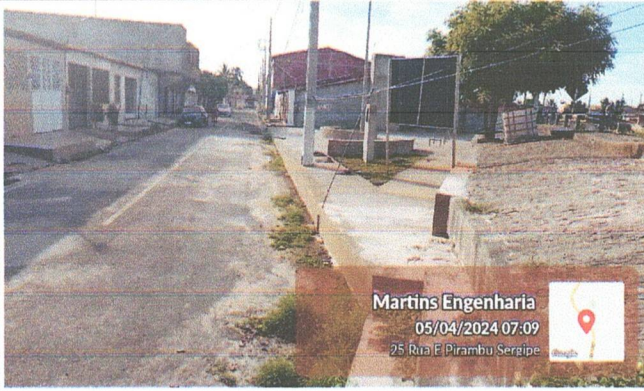
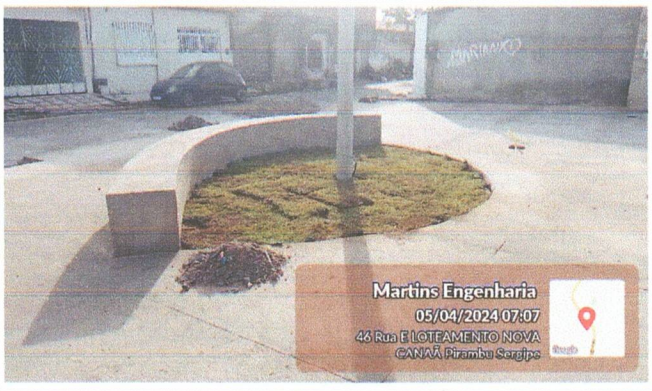
Prazo da Obra 90 Dias Decorrido: 56 Dias Restante: 34

Equipam.	Descrição		Quant.	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Máquina de corte de piso			
	Carro de mão			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro		Eletricista	
	Armador			
Serviços	Servente			
	Sem atividade_ domingo			
Observação				

Fiscalização:

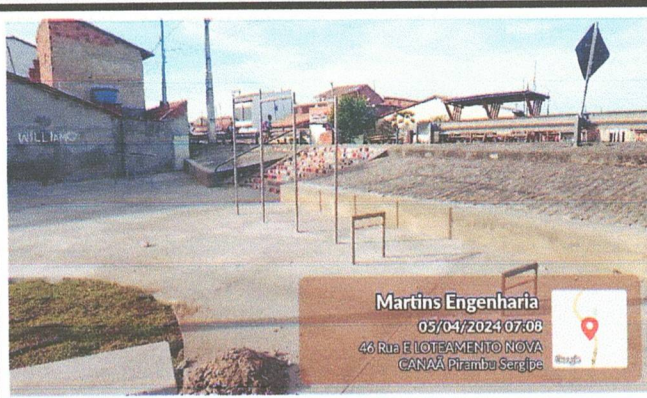
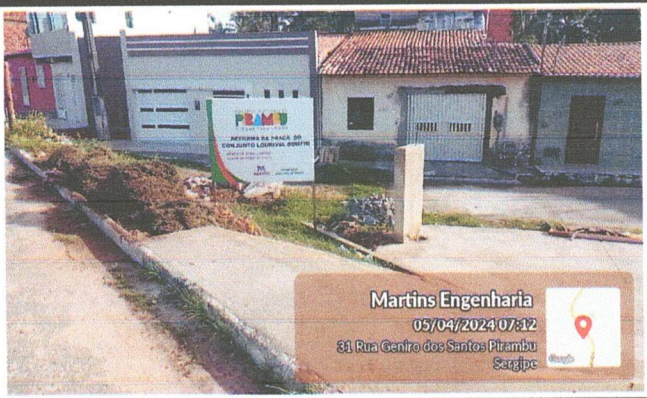
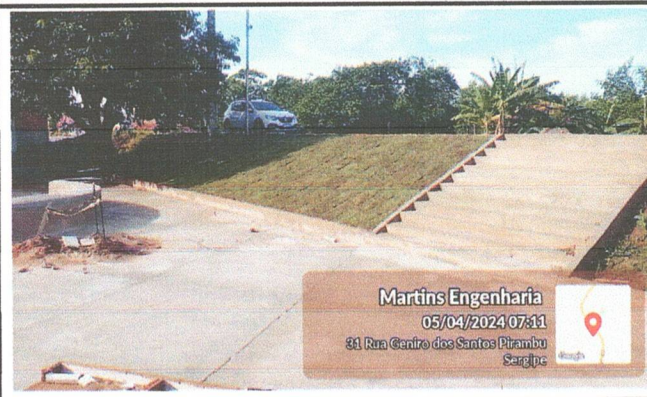
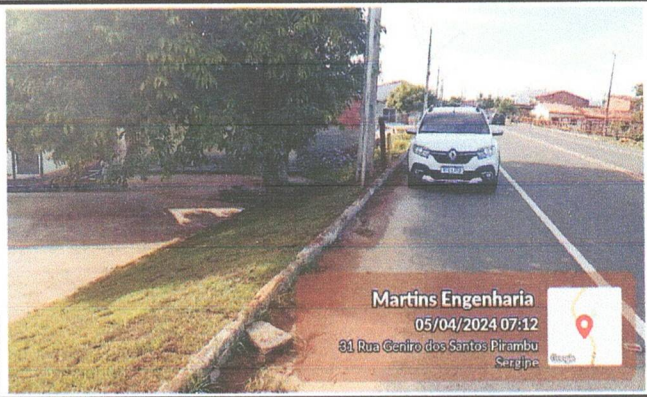
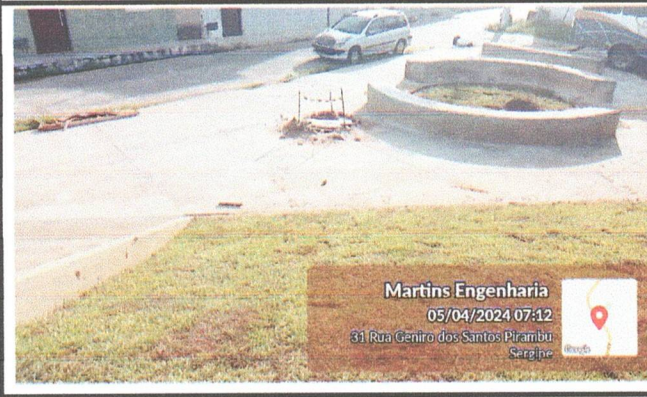
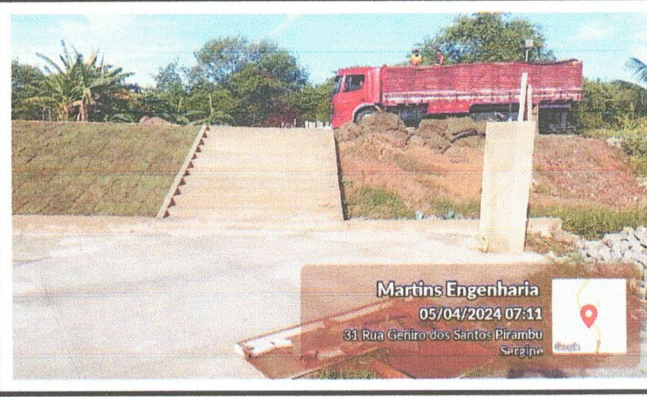
Contratada:

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

Obra:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.	
Contratada:	MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ref.: BM: 02	Período : 01//03/2024 à 31/03/2024	CONTRATO Nº 22/2023
		
		
 Martins Engenharia 05/04/2024 07:07 46 Rua E LOTEAMENTO NOVA CANAA Pirambu Sergipe 		
 Martins Engenharia 05/04/2024 07:07 46 Rua E LOTEAMENTO NOVA CANAA Pirambu Sergipe 		
 Martins Engenharia 05/04/2024 07:09 25 Rua F Pirambu Sergipe 		
 Martins Engenharia 05/04/2024 07:07 46 Rua E LOTEAMENTO NOVA CANAA Pirambu Sergipe 		

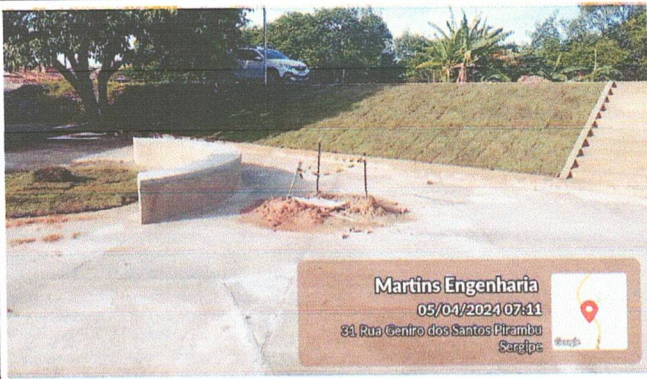
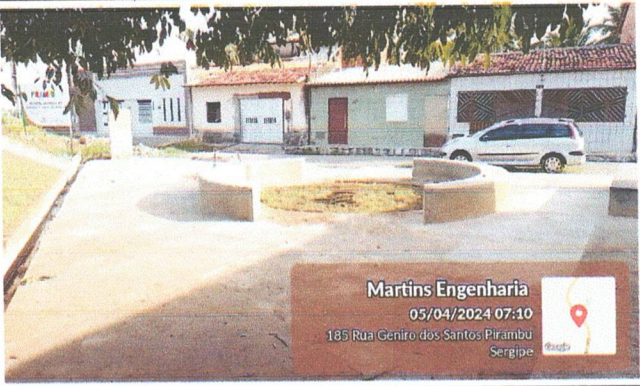
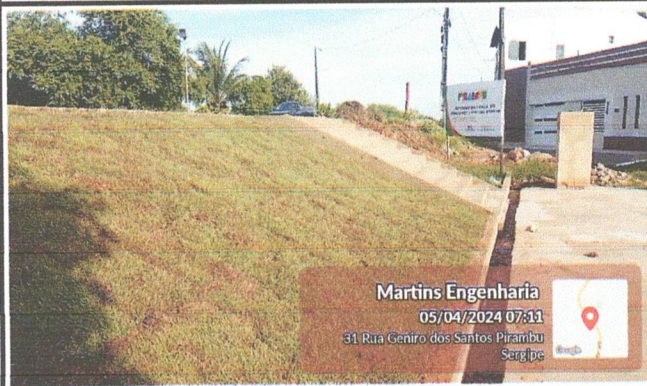
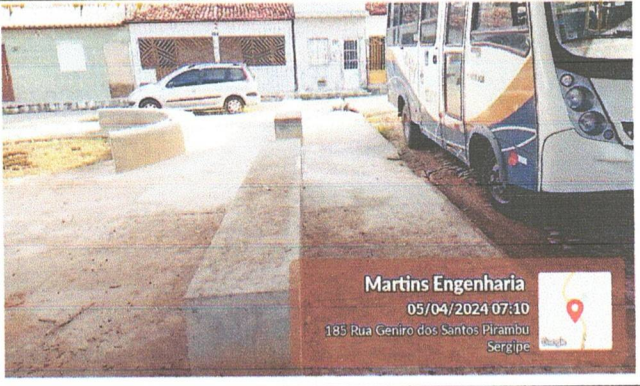
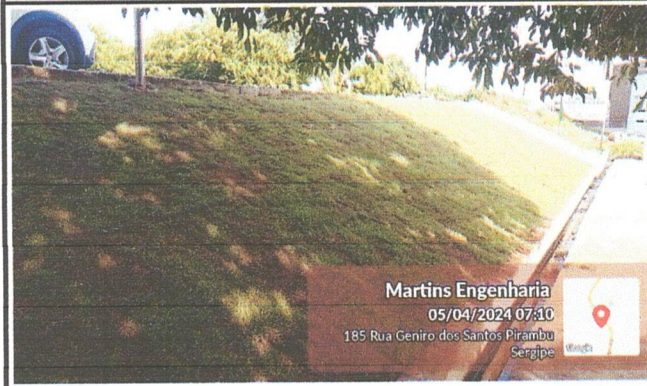
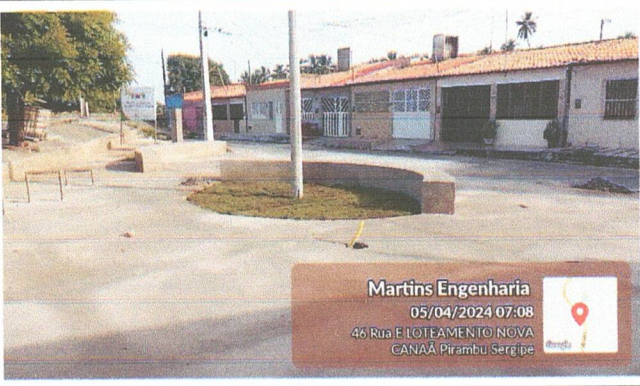


Martins Engenharia
 Dinesh Kumar
 Engenheiro Civil
 CREA: 200097088-8

Obra:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.	 MARTINS Locação e Serviços
Contratada:	MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ref.: BM: 02	Período : 01//03/2024 à 31/03/2024	CONTRATO Nº 22/2023
 Martins Engenharia 05/04/2024 07:08 46 Rua E LOTEAMENTO NOVA CANAÃ Pirambu Sergipe  Martins Engenharia 05/04/2024 07:12 31 Rua Geniro dos Santos Pirambu Sergipe  Martins Engenharia 05/04/2024 07:11 31 Rua Geniro dos Santos Pirambu Sergipe  Martins Engenharia 05/04/2024 07:12 31 Rua Geniro dos Santos Pirambu Sergipe  Martins Engenharia 05/04/2024 07:12 31 Rua Geniro dos Santos Pirambu Sergipe  Martins Engenharia 05/04/2024 07:11 31 Rua Geniro dos Santos Pirambu Sergipe		

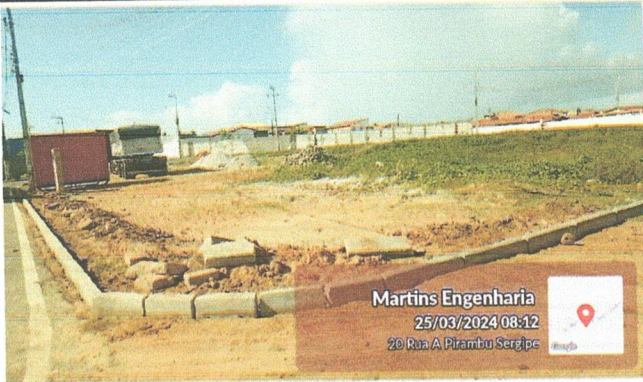
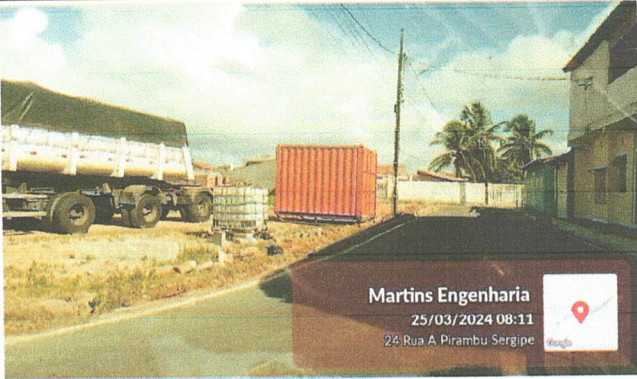
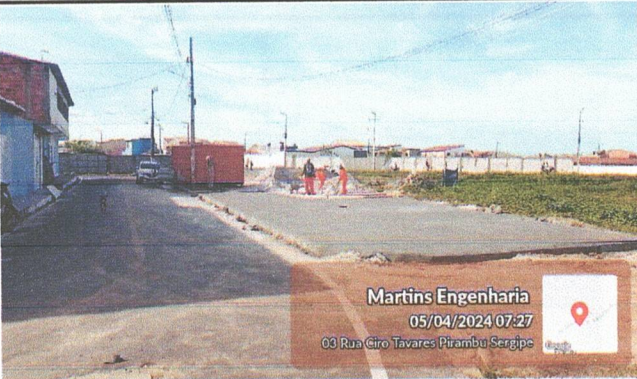
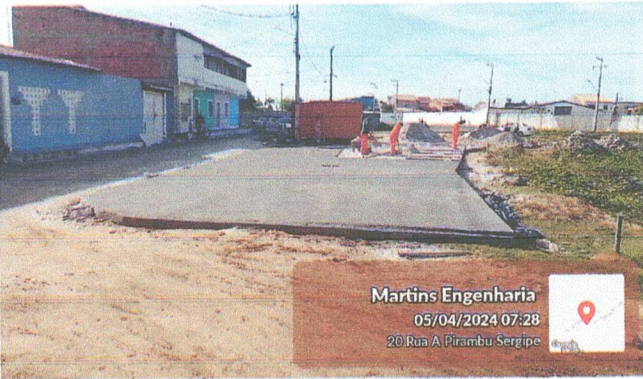


Martins Engenharia
Dinesh Kumar
 Engenheiro Civil
 CREA: 270097088-8

Obra:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.	 MARTINS Locação e Serviços
Contratada: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ref.: BM: 02	Período : 01/03/2024 à 31/03/2024	CONTRATO Nº 22/2023
 Martins Engenharia 05/04/2024 07:11 31 Rua Geniro dos Santos Pirambu Sergipe	 Martins Engenharia 05/04/2024 07:10 185 Rua Geniro dos Santos Pirambu Sergipe	
 Martins Engenharia 05/04/2024 07:11 31 Rua Geniro dos Santos Pirambu Sergipe	 Martins Engenharia 05/04/2024 07:10 185 Rua Geniro dos Santos Pirambu Sergipe	
 Martins Engenharia 05/04/2024 07:10 185 Rua Geniro dos Santos Pirambu Sergipe	 Martins Engenharia 05/04/2024 07:08 46 Rua E LOTEAMENTO NOVA CANAA Pirambu Sergipe	

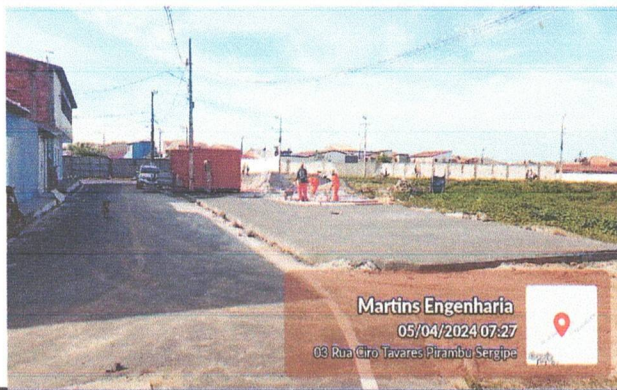
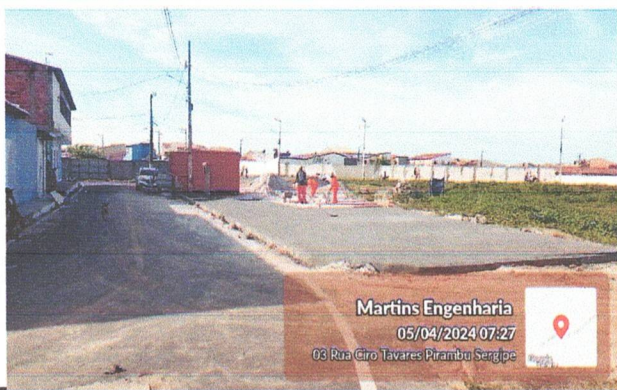
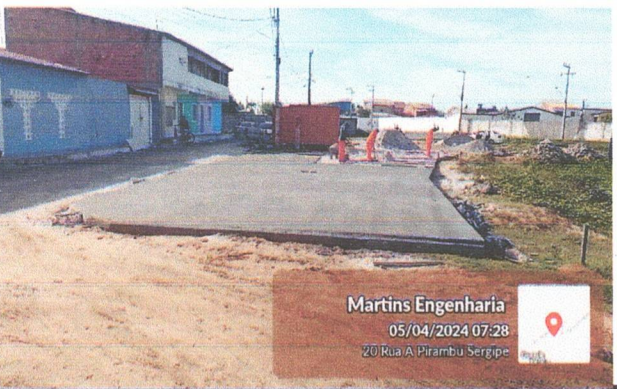
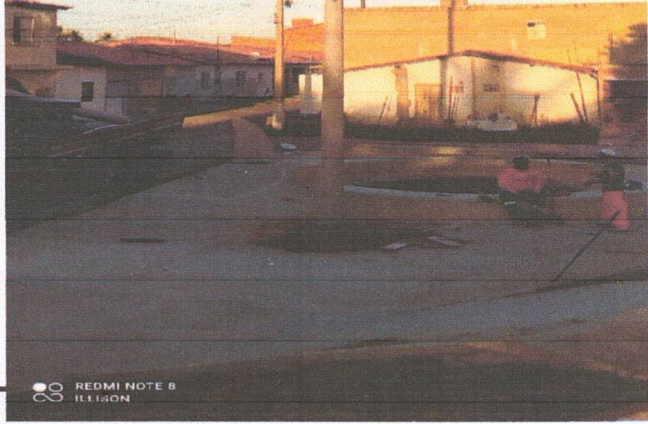


Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

Obra:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.	 MARTINS Locação e Serviços			
Contratada: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA					
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
Ref.: BM: 02	Período : 01//03/2024 à 31/03/2024	CONTRATO Nº 22/2023			
 Martins Engenharia 25/03/2024 08:12 20 Rua A Pirambu Sergipe			 Martins Engenharia 25/03/2024 08:11 24 Rua A Pirambu Sergipe		
 10.7346S 36.8529W 20 Rua A Pirambu Sergipe 5 de abr. de 2024 07:26:33			 10.7348S 36.8528W 04 Rua Ciro Tavares Pirambu Sergipe 5 de abr. de 2024 07:26:03		
 Martins Engenharia 05/04/2024 07:27 03 Rua Ciro Tavares Pirambu Sergipe			 Martins Engenharia 05/04/2024 07:28 20 Rua A Pirambu Sergipe		

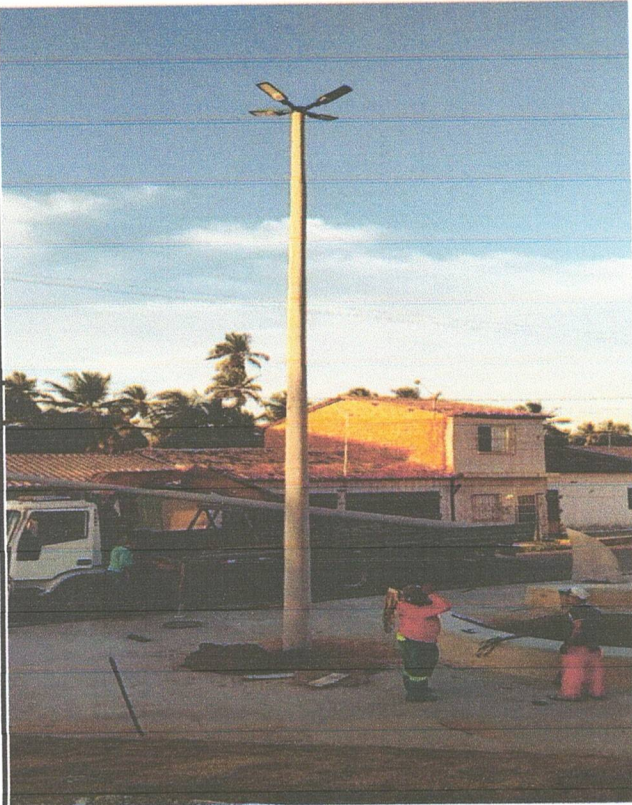
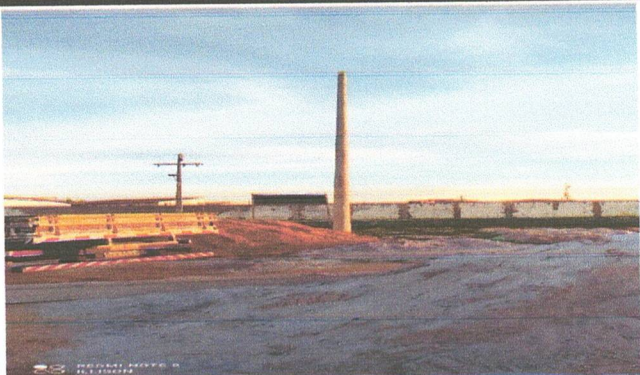
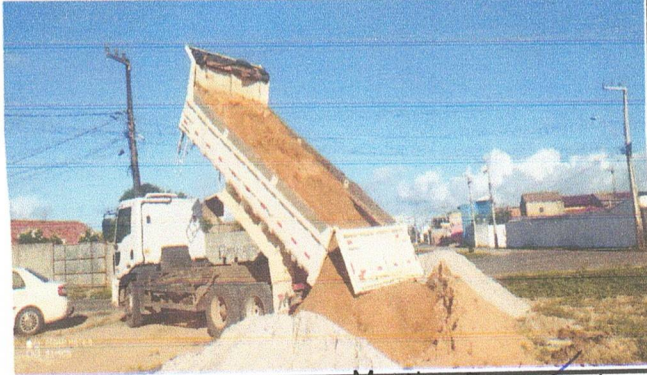



Martins Engenharia
Dinesh Kumar
Engenheiro Civil
CREA: 270097088-8

Obra:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.	 MARTINS Locação e Serviços
Contratada:	MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU	
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ref.: BM: 02	Período : 01//03/2024 à 31/03/2024	CONTRATO Nº 22/2023
 		
 		
 		

[Handwritten signature]

Martins Engenharia
Dinesh Kumar
 Engenheiro Civil
 CREA: 270097088-8

Obra:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.	 MARTINS Locação e Serviços
Contratada: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ref.: BM: 02	Período : 01//03/2024 à 31/03/2024	CONTRATO Nº 22/2023
		
		
		

Obra:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM SEDE DESTA MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.	
Contratada: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ref.: BM: 02	Período : 01/03/2024 à 31/03/2024	CONTRATO Nº 22/2023
		
Martins Engenharia Dinesh Kumar Engenheiro Civil CREA: 270097088-8 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA	ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. 	



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra	Nome da obra	Data do cadastramento	Origem do cadastramento
90.018.51436/73	REFORMA DE PRAÇAS	21/03/2024 14:38	e-CAC
Tipo Zona	ART	RRT	CIB
Zona Urbana	SE20240370700		
Cadastro Imobiliário	NÃO INFORMADO		
Data do início da obra	CNAE		
12/03/2024	4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas		

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	12/03/2024

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	PIRAMBU	SE	49.190-000
Bairro	Logradouro	Número	
DIVERSOS	CONJUNTO REINALDO MOURA E LOURIVAL BOMFIM	S N	

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	15.190.486/0001-45	Construtora
Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade	
12/03/2024		

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
13.095.039/0001-81	MUNICIPIO DE PIRAMBU

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Residencial unifamiliar	Mista	1.360,56 m²
Reforma	Residencial unifamiliar	Mista	1.360,56 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra
1.360,56 m²



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240370700

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

DINESH KUMAR

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2700970888**

Registro: **10595SE**

Empresa contratada: **MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA**

Registro : **0000162345-SE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE PIRAMBU**
PRAÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES

CPF/CNPJ: **13.095.039/0001-81**

Nº: **16**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PIRAMBU**

UF: **SE**

CEP: **49190000**

Contrato: **22/2023**

Celebrado em: **22/01/2024**

Valor: **R\$ 289.215,17**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Órgão Público**

3. Dados da Obra/Serviço

CONJUNTO REINALDO MOURA E LOURIVAL BOMFIM

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **PIRAMBU**

UF: **SE**

CEP: **49190000**

Data de Início: **12/03/2024**

Previsão de término: **05/04/2024**

Coordenadas Geográficas: **-10.740422, -36.861025**

Finalidade: **Outro**

Código: **44905100**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE PIRAMBU**

CPF/CNPJ: **13.095.039/0001-81**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

1.360,56

m2

49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO

285,18

m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATO Nº 22/2023; OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO REINALDO MOURA E CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SERGIPE



Documento assinado digitalmente

DINESH KUMAR

Data: 13/03/2024 22:01:28 -0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DINESH KUMAR - CPF: 267.687.395-49

Local _____ de _____ de _____
data

MUNICÍPIO DE PIRAMBU - CNPJ: 13.095.039/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 262,55**

Registrada em: **13/03/2024**

Valor pago: **R\$ 262,55**

Nosso Número: **8203066422**



Documento assinado digitalmente

MANOEL MESSIAS SOARES NETO

Data: 14/03/2024 08:04:57 -0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 60zbw
Impresso em: 13/03/2024 às 21:58:45 por: , ip: 191.190.220.26

www.crea-se.org.br
Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br
Fax: XXXX-XXXX



CNPJ
15.190.486/0001-45Razão Social
MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAPeríodo de Apuração
Fevereiro/2024Data de Vencimento
20/03/2024Número do Documento
07.16.24078.4891485-0Pagar este documento até
20/03/2024Observações
Nº Recibo Declaração: 50000216097612Valor Total do Documento
36.146,07**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	8.540,88			8.540,88
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	8.682,25			8.682,25
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.235,21			7.235,21
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	578,81			578,81
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	511,94			511,94
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	767,92			767,92
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	2.382,13			2.382,13
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	3.573,20			3.573,20
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.736,45			1.736,45
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.866,67			1.866,67
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

18/03/2024 10:03:12

85810000361 6 46070385240 9 80071624078 6 48914850175 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85810000361 6 46070385240 9 80071624078 6 48914850175 0

CNPJ: 15.190.486/0001-45
Número: 07.16.24078.4891485-0
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 36.146,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	66,00			66,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	204,61			204,61
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	36.146,07			36.146,07



Associado: MARTINS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAL LTDA

Cooperativa: 2102

Conta Corrente: 09791-8

Impresso em 20/03/2024 10:02:36

Tributos

Solicitante: MARCOS
Cooperativa Origem: 2102
Conta Origem: 09791-8
Número de Controle: 3165 - SE
Tipo de Documento: DARF COOP COD BARRAS
Agente Arrecadador: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras: 85810000361 6 46070385240 9 80071624078 6 48914850175 0
Valor Total (R\$): 36.146,07
Data Vencimento: 20/03/2024
Data do Pagamento: 20/03/2024
Hora do Pagamento: 10:02
Descrição do Pagamento:
Autenticação Mecânica: RIE43251-4H2SE 532431 * 36.146,07
20/03/2024 * *****- * 2SUDG12531324
Autenticação Eletrônica: 2YT1.4832.573T.2Y35P.Q158.1KUT2.TY2E.W12H4

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/03/2024 - 09:53:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MARTINS CONSTRUCAOMANUTENCAO E SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0799)99889649
03-FPAs 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 278.225,88	06-QTDE TRABALHADORES 118	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.190.486/0001-45	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 14/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22.258,07	14-ENCARGOS 1.225,51	15-TOTAL A RECOLHER 23.483,58
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2024

858700002343 835801802400 314686184814 519048600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/03/2024 - 09:53:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MARTINS CONSTRUCAOMANUTENCAO E SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0799)99889649
03-FPAs 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 278.225,88	06-QTDE TRABALHADORES 118	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.190.486/0001-45	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 14/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22.258,07	14-ENCARGOS 1.225,51	15-TOTAL A RECOLHER 23.483,58
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2024

858700002343 835801802400 314686184814 519048600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de pagamento de
FGTS

CAIXA

Valor

R\$ 23.483,58

Data

14/03/24

10:22



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagamento

Código de barras

**858700002343 835801802400 3146861848
14 519048600019**

Conta de débito

2382 | 003 | 00004008-6

CNPJ/CEI Empresa

15.190.486/0001-45

Cód. convênio

0180

Data de validade

14/03/2024

Competência

02/2024

Identificação da operação

Fgts 02 2024

Data/hora da operação

14/03/24 10:22

Data débito

14/03/2024

Código da operação

00520550

Chave de segurança

HNPUOV5YU1Y1T9EY



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700002343 835801802400 314686184814 519048600019

Nº ARQUIVO: ClzniwcSwUt0000-6
Nº CONTROLE: PEO0FGbvlm10000-6
EMPRESA: MARTINS CONSTRUCAOMANUTENCAO E SERVICOS INSCRIÇÃO: 15.190.486/0001-45
FAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024
TOMADOR/OBRA : REGAP BETIM INSCRIÇÃO: 33.000.167/0093-20 N° CONTROLE: OMZRIC00hcmp0000-2
LOCRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
REFINARIA GABRIEL PASSOS 690 DISTRITO IND PC SUL BETIM 32669205 MG

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO	231.890,82	REM SEM 13º SALÁRIO 229.230,82
REM BASE CALC 13º SAL	650,00	REM 13º SALÁRIO 0,00
		DEPÓSITO 18.338,45
		ENCARGOS FGTS 1.009,72
		CONTRIB SOCIAL 0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES	90	TOTAL TRABALHADORES 89

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO	231.890,82	REM SEM 13º SALÁRIO 229.230,82
REM BASE CALC 13º SAL	650,00	REM 13º SALÁRIO 0,00
CONTR SEGUROS DEVIDA	20.192,12	DEPÓSITO 18.338,45
VAL DEVIDO PREV SOC	87.163,86	ENCARGOS FGTS 1.009,72
		CONTRIB SOCIAL 0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES	90	TOTAL TRABALHADORES 89

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700002343 835801802400 314686184814 519048600019

EMPRESA:MARTINS CONSTRUCAOMANUTENCAO E SERVICOS

FPAS: 515

OUTRAS ENTIDADES: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 3,0

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 3,00

COD REC: 150

COMP: 02/2024

Nº ARQUIVO: ClzniwcSwUt0000-6

Nº CONTROLE: PEO0FGbvlm10000-6

TOMADOR/OBRA : PETROLEO BRASILEIRO SA

LOGRADOURO

31 DE MARCO S N

INSCRIÇÃO: 15.190.486/0001-45

INSCRIÇÃO: 900102948560

BAIRRO

CENTRO

CIDADE

CARMOPOLIS

CEP

49740000

UF

SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO	42.330,50	REM SEM 13º SALÁRIO 40.444,88
REV. BASE CALC 13º SAL	314,27	REM 13º SALÁRIO 0,00
		DEPÓSITO 3.235,62
		ENCARGOS FGTS 178,12
		CONTRIB SOCIAL 0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES	21	TOTAL TRAEALHADORES 20

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO	42.330,50	REM SEM 13º SALÁRIO 40.444,88
REV. BASE CALC 13º SAL	314,27	REM 13º SALÁRIO 0,00
CONTR. SEGURADOS DEVIDA	3.600,62	DEPÓSITO 3.235,62
VAL DEVIDO PREV SOC	15.572,10	ENCARGOS FGTS 178,12
		CONTRIB SOCIAL 0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES	21	TOTAL TRABALHADORES 20

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700002343 835801802400 314686184814 519048600019

EMPRESA: MARTINS CONSTRUCAOMANUTENCAO E SERVICOS

FPAS: 515

OUTRAS ENTIDADES: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 3,0

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 3,00

COD REC: 150

COMP: 02/2024

INSCRIÇÃO: 15.190.486/0001-45

INSCRIÇÃO: 900177170173

Nº ARQUIVO: ClzniwcSwUt0000-6

Nº CONTROLE: PEO0FGbvlm10000-6

Nº CONTROLE: IV7RzKb03VM0000-0

LOCRADOURO

BAIRRO

CIDADE

UF

FRANKLIN DELANO ROOSEVELT S N

AMERICA

ARACAJU

SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	8.550,18	REM SEM 13° SALÁRIO	8.550,18
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	684,00
		ENCARGOS FGTS	37,67
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	9	TOTAL TRABALHADORES	9

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	8.550,18	REM SEM 13° SALÁRIO	8.550,18
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	666,73	DEPÓSITO	684,00
VAL DEVIDO PREV SOC	2.925,94	ENCARGOS FGTS	37,67
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	9	TOTAL TRABALHADORES	9

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/ÓERA - RET
858700002343 835801802400 314686184814 519048600019

EMPRESA:MARTINS CONSTRUCAOMANUTENCAO E SERVICOS INSCRIÇÃO:15.190.486/0001-45 N° ARQUIVO: ClzniwcSwUt0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024 N° CONTROLE: PEO0FGbvlml0000-6

TOTAL'S DA EMPRESA		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	282.771,50	REM SEM 13° SALÁRIO	278.225,88		
REM BASE CALC 13° SAL	964,27	REM 13° SALÁRIO	0,00		
CONTR SEGURADOS DEVIDA	24.459,47	DEPÓSITO	22.258,07		
VAL DEVIDO PREV SOC	105.661,90	ENCARGOS FGTS	1.225,51		
		CONTRIB SOCIAL	0,00		
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		
TOTAL TRABALHADORES	120	TOTAL TRABALHADORES	118		
		TOTAL A RECOLHER	23.483,58		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 9.40 (06/03/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/03/2024
HORA: 09:53:43
PAG: 0001/0020

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002343 835801802400 314686184814 519048600019

EMPRESA: MARTINS CONSTRUCAOMANUTENCAO E SERVICOS
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLIES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 15.190.486/0001-45
TOMADOR/OBRA: REGAP BETIM INSCRIÇÃO: 33.000.16/0093-20

NOME TRABALHADOR		REM 13° SAL		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		CONTRIB SEG SOCIAL				DEPÓSITO		JAM	
MARIA ALICIA RAMALHO DE ALMEIDA		2.660,00		132.25855.93-5		09/01/2024		01				22/02/2024		03516	
		650,00		650,00		276,94						0,00		0,00	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002343 835801802400 314686184814 519048600019

EMPRESA: MARTINS CONSTRUCAOMANUTENCAO E SERVICOS
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLIES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: REGAP BETIM

INSCRIÇÃO: 15.190.486/0001-45
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 33.000.16//0093-20

Nome Trabalhador	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC							JAM
FLAVIANO APARECIDO MOURA 2.675,36	0,00	130.19635.11-9	0,00	16/06/2023	01				214,03	06220
FRANCIELLE MONIKE DE SOUZA 3.141,08	0,00	209.47129.74-4	0,00	26/09/2023	01				251,28	04110
GABRIEL VIEIRA SANTOS 2.311,33	0,00	204.60986.72-9	0,00	25/01/2024	01				184,90	06220
GEDAIL SILVA NASCIMENTO 2.814,90	0,00	123.62663.83-5	0,00	25/01/2024	01				225,20	06220
GERALDO MAGELA DE ASSIS 3.011,53	0,00	121.63902.16-3	0,00	05/07/2023	01				240,93	06220
GERALDO SALVIANO 2.763,35	0,00	121.03979.24-0	0,00	20/06/2023	01				221,07	06220
GIOVANI SOUZA GONZAGA 2.319,37	0,00	125.34690.26-6	0,00	25/01/2024	01				185,55	06220
GUILHERME SOUZA MAINARTE DA SILVA 1.841,77	0,00	210.41469.32-4	0,00	31/05/2023	01				147,34	06220
GUSTAVO RAMALHO DA SILVA 2.374,21	0,00	163.04638.64-8	0,00	01/08/2023	01				189,93	06220
HELIO TEIXEIRA 2.964,21	0,00	123.47116.50-0	0,00	01/12/2023	01				237,14	06220
ISAIAS MARIANO 2.997,41	0,00	127.16400.11-5	0,00	16/06/2023	01				239,80	06220
IVONE RIBEIRO GUIMARAES ARAUJO 2.138,05	0,00	162.34030.57-3	0,00	15/08/2023	01				171,04	05143
JAIME MAGALHAES DOS SANTOS 2.794,00	0,00	129.76766.12-8	0,00	20/06/2023	01				223,53	05143
JOANITA GONCALVES DE SOUZA 2.134,68	0,00	128.96768.12-4	0,00	15/08/2023	01				170,78	05143
JOSE BATISTA GERMANO 2.444,36	0,00	121.03829.10-9	0,00	05/07/2023	01				195,55	06220
				202,32						0,00

DATA: 14/03/2024
HORA: 09:53:43
PÁG: 0006/0020

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 9.40 (06/03/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002343 835801802400 314686184814 519048600019

EMPRESA: MARTINS CONSTRUCAOMANUTENCAO E SERVICOS
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPIES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 15.190.486/0001-45
TOMADOR/OBRA: REGAP BETIM FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO: 33.000.16//0093-20

NOME TRABALHADOR		REM 13° SAL	BASE CÁL	13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		REM 13° SAL	BASE CÁL	13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAM
		REM 13° SAL	BASE CÁL	13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAM
MARIA DO CARMO DOS SANTOS	2.134,68	0,00	127.77468.40-2	0,00	31/05/2023	01				170,78	05143
MARILENE JESUS DE OLIVEIRA	2.112,06	0,00	236.57777.48-9	0,00	31/05/2023	01				168,96	05143
MARIZA KELE BALMANT TEIXEIRA	2.133,66	0,00	163.62905.59-9	0,00	15/08/2023	01				170,69	05143
MARTA ROSA DE JESUS BATISTA	2.134,68	0,00	125.05002.79-9	0,00	05/06/2023	01				170,78	05143
MICHAEL DOUGLAS DE MORAES GOMES	2.373,21	0,00	236.18288.90-1	0,00	31/05/2023	01				189,85	06220
NEUZA NUNIS DE OLIVEIRA	2.237,27	0,00	120.04089.49-2	0,00	31/05/2023	01				178,99	05143
ODINEIA MARIA GARCIA DE CASTRO	2.134,68	0,00	204.10325.71-0	0,00	31/05/2023	01				170,77	05143
PATRICIA ALVES DAS GRACAS	2.133,97	0,00	207.05227.51-5	0,00	31/05/2023	01				170,71	05143
POLIANA LUCIA VIEIRA	2.068,38	0,00	165.41860.26-3	0,00	15/08/2023	01				165,47	05143
RAFAEL MARTINS DA SILVA	2.429,88	0,00	166.06183.67-8	0,00	31/05/2023	01				194,39	06220
RAFAEL SANTOS BRITO	3.040,16	0,00	212.83300.17-8	0,00	27/06/2023	01				243,21	04110
RAIMUNDO VALERIANO DOS SANTOS	2.972,25	0,00	126.14458.12-2	0,00	20/06/2023	01				237,79	06220
ROBSON DUTRA	2.641,22	0,00	127.44582.12-5	0,00	27/06/2023	01				211,30	06220
RONALDO ADRIANO OLIVEIRA CRUZ	3.007,82	0,00	124.71708.59-7	0,00	31/05/2023	01				240,63	06220
RONILSON BRITO	3.125,07	0,00	123.62791.93-0	0,00	28/06/2023	01				250,01	06410

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002343 835801802400 314686184814 519048600019

EMPRESA: MARTINS CONSTRUCAOMANUTENCAO E SERVICOS
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLIES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 15.190.486/0001-45
TOMADOR/OBRA: REGAP BETIM

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 33.000.16/0093-20

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ROSANA APARECIDA DA SILVA MACHADO	2.317,89	0,00	116.60481.42-7	0,00	01/08/2023	01	01/08/2023	01			185,44	05143
ROSEMEIRE PEREIRA DIAS	2.134,68	0,00	125.35183.27-9	0,00	01/06/2023	01	01/06/2023	01			170,78	05143
SERGIO GERALDO DA COSTA	2.807,53	0,00	124.46288.15-6	0,00	20/06/2023	01	20/06/2023	01			224,61	06220
SHEILA FERREIRA DE JESUS	2.289,31	0,00	207.29128.27-4	0,00	15/08/2023	01	15/08/2023	01			183,14	05143
SHIRLEI ALVES SANTOS SILVA	2.080,95	0,00	166.50489.80-9	0,00	15/08/2023	01	15/08/2023	01			166,47	05143
SHIRLEI DA SILVA PORTO CRUZ	2.134,68	0,00	125.48091.18-1	0,00	31/05/2023	01	31/05/2023	01			170,78	05143
SILVANIA APARECIDA OLIVEIRA NASCIMENTO M	2.259,37	0,00	190.16101.96-1	0,00	31/05/2023	01	31/05/2023	01			180,74	05143
TELMA APARECIDA MACHADO DOS SANTOS OLIVE	2.124,19	0,00	127.97960.03-4	0,00	31/05/2023	01	31/05/2023	01			169,94	05143
TEREZA DOS SANTOS	2.132,11	0,00	165.35523.80-3	0,00	31/05/2023	01	31/05/2023	01			170,56	05143
THAIS APARECIDA SILVA MARTINS	2.072,14	0,00	166.26804.28-7	0,00	15/08/2023	01	15/08/2023	01			165,77	05143
VALCIRLENE FATIMA SANTOS TEIXEIRA	2.115,49	0,00	127.31001.13-7	0,00	31/05/2023	01	31/05/2023	01			169,24	05143
VANDERLEI MIRANDA TEIXEIRA	2.442,00	0,00	166.58864.98-6	0,00	01/12/2023	01	01/12/2023	01			195,36	06220
VERONICA RODRIGUES OLIVEIRA NASCIMENTO	2.957,60	0,00	143.01782.74-1	0,00	13/06/2023	01	13/06/2023	01			236,60	05143
WELLINGTON ALBINO DE OLIVEIRA FILHO	2.712,15	0,00	138.45693.14-1	0,00	17/08/2023	01	17/08/2023	01			216,97	05143

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	231.890,82	650,00	650,00	20.192,12	18.338,45	0,00
---------------------------	------------	--------	--------	-----------	-----------	------

DATA: 14/03/2024
HORA: 09:53:43
PÁG : 0008/0020

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 9.40 (06/03/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002343 835801802400 314686184814 519048600019

Nº ARQUIVO: ClznlwSwUt0000-6
INSCRIÇÃO: 15.190.486/0001-45
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 33.000.16/0093-20
EMPRESA: MARTINS CONSTRUCAOMANUTENCAO E SERVICOS
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: REGAP BETIM
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLIES: 1 RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: OMZRI00hcmp0000-2
LOGRADOURO: RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS QUADRAB GALPA001
CIDADE: CARMOPOLIS
UF: SE CEP: 49740-000
BAIRRO: ANTONIO B TELES
CNAE PREPONDERANTE: 4311802
CNAE: 4311802

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	90	229.230,82	0,00	231.890,82	650,00
TOTALS:	90	229.230,82	0,00	231.890,82	650,00

DATA: 14/03/2024
HORA: 09:53:43
PÁG: 0009/0020

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 9.40 (06/03/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: ClznwCswUt0000-6
INSCRIÇÃO: 15.190.486/0001-45
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 33.000.16//0093-20

OUTRAS ENT: 0115 SIMPIES: 1 RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: OMZRI00hcmp0000-2

EMPRESA: MARTINS CONSTRUCAOMANUTENCAO E SERVICOS
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: REGAP BETIM

BAIRRO: ANTONIO B TELES
TELEFONE: 0799 9988 9649

CEP: 49740-000

LOGRADOURO: RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS QUADRAB GALPRA001
CIDADE: CARMOPOLIS

UF: SE
CEP: 49740-000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 87.163,86 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 0,00 PERÍODO FINAL: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	1	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

DATA: 14/03/2024
HORA: 09:53:43
PAG: 0011/0020

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 9.40 (06/03/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002343 835801802400 314686184814 519048600019

EMPRESA: MARTINS CONSTRUCAOMANUTENCAO E SERVICOS
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 15.190.486/0001-45
TOMADOR/OBRA: PETROLEO BRASILEIRO SA INSCRIÇÃO: 900102948560

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ADSON MENEZES BISPO	0,00	129.79658.76-8	0,00	21/02/2022	01				150,85	07102
AGATA RAIANE DOS SANTOS	0,00	128.11846.76-1	0,00	21/02/2022	01				248,26	03516
ANTONIO JOSE SANTA ROSA FILHO	0,00	160.65136.04-3	0,00	12/04/2022	01				112,96	07170
CLEITON NASCIMENTO DE JESUS	0,00	129.95152.76-8	0,00	12/09/2022	01				112,97	07170
DAVID COSTA SANTOS	0,00	127.25698.76-8	0,00	21/02/2022	01				112,97	07170
EDIMAR DOS SANTOS	0,00	204.58638.09-3	0,00	21/02/2022	01				150,84	07233
EDINALDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	0,00	161.42150.51-3	0,00	09/11/2022	01				112,96	07170
EDIVALDO ARAUJO DA SILVA	0,00	127.99052.76-4	0,00	21/02/2022	01				112,97	07170
EDSON DOMINGOS LIMA SANTOS	0,00	128.42690.76-3	0,00	13/04/2022	01				207,69	07102
FRANCISCO DA CONCEICAO SANTOS	0,00	161.94090.24-4	0,00	02/05/2022	01				150,84	07152
GERALDO DOS SANTOS	0,00	123.27418.50-1	0,00	21/02/2022	01				150,85	07233
HELIO DA SILVA	0,00	161.35054.31-8	0,00	16/10/2023	01				150,84	07152
JARISON NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	129.32267.76-2	0,00	16/10/2023	01				112,97	07170
JOAO LIMA ANDRADE FILHO	0,00	129.77908.76-7	0,00	02/03/2023	01				193,93	02142
JOSE BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	162.63189.08-9	0,00	11/04/2022	01				150,84	07152
	0,00			151,52						0,00

DATA: 14/03/2024
HORA: 09:53:43
PAG: 0013/0020

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 9.40 (06/03/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700002343 835801802400 314686184814 519048600019

Nº ARQUIVO: ClznlwCSwUt0000-6
INSCRIÇÃO: 15.190.486/0001-45
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900102948560

EMPRESA: MARTINS CONSTRUCAOMANUTENCAO E SERVICOS
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: PETROLEO BRASILEIRO SA

OUTRAS ENT: 0115 SIMPLIS: 1 RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: MZCjOWY108m0000-1

LOGRADOURO: RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS QUADRAB GALPA001
CIDADE: CARMOPOLIS

BAIRRO: ANTONIO B TELES

CNAE PREPONDERANTE: 4311802
CNAE: 4311802

UF: SE CEP: 49740-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	21	40.444,88	0,00	42.330,50	314,27
TOTAIS:	21	40.444,88	0,00	42.330,50	314,27

DATA: 14/03/2024
HORA: 09:53:43
PAG: 0014/0020

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 9.40 (06/03/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: C1zn1wCSwUt0000-6
INSCRIÇÃO: 15.190.486/0001-45
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900102948560
CNAE PREPONDERANTE: 4311802
CNAE: 4311802

EMPRESA: MARTINS CONSTRUCAOMANUTENCAO E SERVICOS
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: PETROLEO BRASILEIRO SA
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: MzcJOWY108m0000-1
LOGRADOURO: RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS QUADRAB GALPA001
CIDADE: CARMOPOLIS UF: SE CEP: 49740-000
BAIRRO: ANTONIO B TELES
TELEFONE: 0799 9988 9649

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 15.572,10 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.600,62
SALÁRIO FAMÍLIA: 310,20 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 9.40 (06/03/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/03/2024
HORA: 09:53:43
PAG: 0016/0020

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002343 835801802400 314686184814 5190486000019

EMPRESA: MARTINS CONSTRUCAOMANUTENCAO E SERVICOS
COMP: 02/2024 COD RFC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: PRAÇA FRANKLIN ROOSEVELT

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 STMPIFS: 1 RAT: 3.0
Nº DE CONTROLE: IV7RzKb03VM0000-0

Nº ARQUIVO: ClzniwSwUt0000-6
INSCRIÇÃO: 15.190.486/0001-45
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 90UL/1170173

LOGRADOURO: RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS QUADRAB GALPAO01
CIDADE: CARMOPOLIS

UF: SE CEP: 49740-000

BAIRO: ANTONIO B TELES
CNAE PREPONDERANTE: 4311802
CNAE: 4311802

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	8.550,18	0,00	8.550,18	0,00
TOTAIS:	9	8.550,18	0,00	8.550,18	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MARTINS CONSTRUCAOMANUTENCAO E SERVICOS
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPGAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLIES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: PRACA FRANKLIN ROOSEVELT N° DE CONTROLE: IV7RzKb03VM0000-0
LOGRADOURO: RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS QUADRAB GALPAO01
CIDADE: CARMOPOLIS UF: SE CEP: 49740-000 BAIRRO: ANTONIO B TELES
CNAE: CARMOPOLIS TELEFONE: 0799 9988 9649 CNAE: 4311802

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.925,94 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 666,73
SALÁRIO FAMÍLIA: 203,23 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 9.40 (06/03/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/03/2024
HORA: 09:53:43
PÁG: 0018/0020

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858700002343 835801802400 314686184814 519048600019

Nº ARQUIVO: CLzniwSwUt0000-6
INSCRIÇÃO: 15.190.486/0001-45
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PEO0FGbv1ml0000-6

EMPRESA: MARTINS CONSTRUCAOMANUTENCAO E SERVICOS

COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLIES: 1

RAT: 3,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS QUADRAB GALPAO01

CIDADE: CARMOPOLIS

UF: SE

CEP: 49740-000

BAIRRO: ANTONIO B TELES

CNAE PREPONDERANTE: 4311802

CNAE: 4311802

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUNERACÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	120	282.771,50	964,27	282.771,50	964,27
TOTAIS:	120	282.771,50	964,27	282.771,50	964,27

DATA: 14/03/2024
HORA: 09:53:43
PÁG: 0019/0020

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 9.40 (06/03/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700002343 835801802400 314686184814 519048600019

Nº ARQUIVO: ClznlwcsWt0000-6
INSCRIÇÃO: 15.190.486/0001-45
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: MARTINS CONSTRUCAOMANUTENCAO E SERVICOS Nº DE CONTROLE: PEO0FGbVIm10000-6
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 PPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLIES: 1 RAT: 3,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS QUADRAB GALPAO01
CIDADE: CARMOPOLIS UF: SE CEP: 49740-000

BAIRRO: ANTONIO B TELES

CNAE PREPONDERANTE: 4311802
CNAE: 4311802

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

278.225,88
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

118

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 14/03/2024

DEPÓSITO FGTS

22.258,07

ENCARGOS FGTS

1.225,51

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

23.483,58

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: ClzniwCSwUt0000-6
INSCRIÇÃO: 15.190.486/0001-45
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

N° DE CONTROLE: PEOCFGbv1m10000-6
OUTRAS ENT: 0115 SIMPLIS: 1 RAT: 3,0

EMPRESA: MARTINS CONSTRUCAOMANUTENCAO E SERVICOS
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS QUADRAB GALPAO01	BAIRRO: ANTONIO B TELES	CNAE: PREPONDERANTE.	4311802
CIDADE: CARMOIS	UF: SE	CEP: 49740-000	4311802
	TELEFONE: 0799 9988 9649	CNAE:	4311802

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO	SEFIP:	105.661,90	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	24.459,41
SALÁRIO FAMÍLIA:		513,43	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:		0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:		0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:		0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:		0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:		0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

[illegible]

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	N4:	0	O1:	0	O2:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (06/03/2024)

DATA: 14/03/2024
HORA: 09:53:43
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MARTINS CONSTRUCAOMANUTENCAO E SERVICOS		INSCRIÇÃO: 15.190.486/0001-45
COMPETÊNCIA: 02/2024		SIMPLES: 1
CÓD REC: 150		FPAS: 515

FGTS - 8% (TX 3%)		
QTDE TRABALHADORES	118	
REMUNERAÇÃO	278.225,88	
DEPÓSITO	22.258,07	
ENCARGOS FGTS	1.225,51	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	23.483,58	

VALIDADE DO CÁLCULO: 14/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2024

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
MARTINS CONSTRUCAO MANUTENCAO E SERVICOS	15.190.486/0001-45	0115	0,00	2100	515				
24.459,47	65.259,20	16.456,66	513,43	0,00	105.661,90	0,00			

DATA: 14/03/2024
HORA: 09:53:43
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS
EMPRESA

EMPRESA: MARTINS CONSTRUCAOMANUTENCAO E SERVICOS	N° ARQUIVO: CLzhiwCSwt0000-6
COMP: 02/2024 COD REC: 150	INSCRIÇÃO: 15.190.486/0001-45
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO: 15.190.486/0001-45
LOGRADOURC: RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS QUADRAB GALPA001	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
CIDADE: CARMOPOLIS	INSCRIÇÃO:
UF: SE	BAIRRO: ANTONIO B TELES
CEP: 49140-000	CNAE PREPONDERANTE: 4311802
TELEFONE: 799-99889649	CNAE: 4311802
515	744
620	779
744	TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	24.459,47	0,00	0,00	0,00	24.459,47
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	56.747,14	0,00	0,00	0,00	56.747,14
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	8.512,06	0,00	0,00	0,00	8.512,06
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	513,43	0,00	0,00	0,00	513,43
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	89.205,24	0,00	0,00	0,00	89.205,24
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	-6.456,66	0,00	0,00	0,00	16.456,66
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	-6.456,66	0,00	0,00	0,00	16.456,66
	105.661,90	0,00	0,00	0,00	105.661,90

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 14/03/2024 09:54:22.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo ClzniwcSwUt00006.SFP é:

fead55bc-b109-4008-9f62-c788eccc33cd

Transmissor: CONTEPA CONTABILIDADE EMPRESARIAL E ASSESSORIA LT:10451338000113

Inscrição do Transmissor: 10451338000113

Responsável: CONTEPA CONTABILIDADE EMP E AS

Inscrição do Responsável: 66332087587

Competência: 02/2024

NRA: ClzniwcSwUt00006

Base de Processamento: Aracaju / SE

Código de Recolhimento: 150

Contato: PAULO ALBERTO MESQUI

Telefone: 007932465082
