



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4471 / 006 / 00672005-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PIRAMBU GABINETE PREFEITO
CPF/CNPJ:	13.095.039/0001-81

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2206 / 00000007290-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	J A PROJECT E ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ:	05.325.864/0001-05
Valor:	R\$ 90.668,83
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	CONSTRUCAO DA NOVA ETAPA
Histórico:	REFERENTE CONSTRUCAO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU.

PAGO

Data de débito:	01/11/2024
Data / Hora da operação:	01/11/2024 14:22:06

Código da operação:	00118741
Chave de segurança:	PH5ZZWRRXLHJSMNX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4471 / 006 / 00672005-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PIRAMBU GABINETE PREFEITO
CPF/CNPJ:	13.095.039/0001-81

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 0000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2206 / 7290-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	J A PROJECT E ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ:	05.325.864/0001-05
Valor:	R\$ 90.668,83
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	CONSTRUCAO DA NOVA ETAPA
Histórico:	REFERENTE CONSTRUCAO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU.

Data de débito:	01/11/2024
Data / Hora da autorização:	01/11/2024 14:18:31

Código da operação: 84201445

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Nº Processo
0001006

Nº Fila
1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

TERMO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 05.325.864/0001-05
Nome: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA
Endereço: R A
Bairro: CENTRO
E-mail: @

Compl: LOTE ARTHUR B DO ROSARIO
Cidade: Japaratuba
Telefone: (79)99003-449

UF: SE
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Conta:

EMPENHO	EMIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	FONTE
0812011	12/08/2024	1055.44905100-17063110	Global	17063110 - Transferência Especial da União

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A 1º TERMO DE APOSTILAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2024 E CONTRATO Nº 76/2024.

Documentação	
Nota Fiscal	08
Valor	R\$ 91.770,07
Emissão	30/10/2024
Horário de Entrega	01/11/2024 10:11:50

Para acompanhar o andamento do seu processo na fila pública, acesse o link abaixo:

<http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pirambu/fornecedor/filapagamento>

Cadastrado por: Santiago Santos Gois

Secretaria de Controle Interno

☒ Aprovado
☐ Reprovado

Obs. _____



MUNICÍPIO DE JAPARATUBA

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento Tributário - Praça Padre Caio Tavares, Nº 86, Centro - CEP: 49.960-000
- Telefone: (79) 3272-3216

Nota: 2024000

00000008

Código Verificação

QRJ2-BSNH



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
30/10/2024 09:28:11

Período de Competência Município de Prestação do
10/2024

Serviço
Pirambu - SE

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte
(ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em
Pirambu

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia

J & A ENGENHARIA

CPF/CNPJ

05.325.864/0001-05

Inscrição Municipal

533

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

jcalex1@hotmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 9900-3449

Endereço

RUA A, LOT. ARTHUR BISPO DO ROSARIO, 75, Centro - CEP: 49960-000 - Japaratuba - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

CPF/CNPJ

13.095.039/0001-81

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3276-1375

E-mail

pmpirambu@hotmail.com

Endereço

Rua Givaldo Moura da Silva, 16 - Centro - CEP: 49190-000 - Pirambu - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
CNAE: 4213800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA ORLA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.
VINCULADO AO CONTRATO Nº 76/2024.

CONTRATO Nº 76/2024

PERÍODO: 26/09/2024 à 25/10/2024

CNO: 90.020.27538/76

(ISS 2,00%) RETIDO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/06. Art. 18, § 5, inc.I PERTINENTE AO REGIME TRIBUTARIO (SIMPLES NACIONAL)

SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

BASE DE CALCULO PARA EFEITO DO ISS CONFORME CODIGO TRIBUTARIO MUNICIOIO DE PIRAMBU/SE:

CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PREFEITURA DE PIRAMBU/SE - MATERIAL 40%

CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PREFEITURA DE PIRAMBU/SE - MAO DE OBRA 60%

VALOR DO ISS A SER RETIDO CONFORME BASE DE CALCULO

DADOS BANCARIOS:

J A PROJECT ENG

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2206-3

CONTA CORRENTE: 7290-7

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

91.770,07

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

2,3100

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

91.770,07

Valor Total da Nota (R\$)

91.770,07

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 12.343,07 Federal e R\$ 4.588,50 Municipal. Fonte: IBPT [AB35A7]

Visualizado em: 30/10/2024 09:28:12

Para validação desta NFS-e acesse: <http://japaratubase.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 370 de 23 de abril de 2014.

Manoel Assis Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2

A

Prefeitura Municipal de Pirambu/SE
Praça Nossa Senhora de Lurdes, nº 16, Centro
Pirambu/SE

Assunto: ENCAMINHAMENTO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 PARA PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 76/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU.

FATURA

A EMPRESA J & A PROJECT E ENGENHARIA LTDA, a importância supra de R\$ **91.770,07** (noventa e um mil, setecentos e setenta e sete reais e sete centavos) referente ao pagamento do 4º Boletim de Medição, referente ao Contrato 76/2024, CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU.

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pirambu/SE a importância supra de R\$ **91.770,07 (noventa e um mil, setecentos e setenta e sete reais e sete centavos)** referente ao pagamento do 4º Boletim de Medição, referente ao Contrato 76/2024, CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU. Em anexo.


Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme lei Federal Nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Banco do Brasil

Agência → : 2206-3

Conta Corrente: 7290-7

Japaratuba/SE, 30 de outubro de 2024



J A Project & Engenharia LTDA
Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Representante Legal

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03				BOLETIM DE MEDIÇÃO 04				CONTRATO Nº76/2024			
CONTRATADA: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				CONTRATO				Período: 26/09/2024 à 28/10/2024			
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE				ORDEM DE SERVIÇO				Data da Medição: 28/10/2024			
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades			Saldo a medir	Unit.	Contratado	Valores (R\$)			
		Und	Contratada	Acumulada Anterior				Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	% Medido
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	1,00	0,7746	0,8385	47,006.78	47,006.78	3,003.93	39,416.52	7,590.26	83.85
01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	0,7746	0,8385	47,006.78	47,006.78	3,003.93	39,416.52	7,590.26	83.85
02	CONSTRUÇÃO DA ORLA - TRECHO 003	m2	0.35								
02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	m2	0.35								
02.001.001	Placa em acrílico branco lileto dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	m2	1,00	1,00	1,00	888.95	888.95		888.95		100.00
02.001.002	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	1,00	1,00	2,34	16,380.00	0,00	16,380.00		100.00
02.001.003	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	7,000.00	7,000.00	7,000.00						
02.001.004	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	1,00	1,00	672.64	672.64		672.64		100.00
02.001.005	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1,00	1,00	1,921.69	1,921.69		1,921.69		100.00
02.001.006	Locação de container - Almoxiante com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	10,00	3,00	1,00	958.88	9,588.80	958.88	3,835.52	5,753.28	40.00
02.001.006.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padilhas areia dim. 0.35x0.45x0.23m - Confeção mecânica e transporte	m3	150.00	150.00	150.00	597.07	89,560.50	(0.00)	89,560.50		100.00
02.002	CICLOVIA	m2	600.00	600.00	600.00	1.67	1,002.00		1,002.00		100.00
02.002.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	600.00	600.00	600.00						
02.002.002	Melo-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	600.00	600.00	600.00	59.39	35,634.00		35,634.00	1,800.00	100.00
02.002.003	Pintura de meio fio (calçada)	m	600.00	600.00	600.00	3.00	1,800.00		1,800.00		100.00
02.002.004	Alto de caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	300.00	300.00	300.00	204.60	61,380.00		61,380.00		100.00
02.002.005	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desmoldado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m2	600.00	600.00	600.00	104.75	62,850.00		62,850.00		100.00
02.002.006	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples	m2	600.00	600.00	600.00	4.06	2,436.00	0.00	2,436.00		100.00
02.002.006.001	Pintura pl. piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	600.00	600.00	600.00	9.95	5,970.00	5,472.50	5,472.50	487.50	91.66
02.003	ESTACIONAMENTO	m2	240.00	240.00	240.00						
02.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	240.00	240.00	240.00	1.67	400.80	0.00	400.80		100.00
02.003.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	240.00	240.00	240.00	125.27	30,064.80		30,064.80		100.00
02.003.003	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	100.00	100.00	100.00	13.95	1,395.00		1,395.00	1,395.00	99.91
02.004	PASSEIO EM CONCRETO CINZA	m2	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1.67	2,505.00		2,505.00		100.00
02.004.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
02.004.002	Alto de caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	750.00	750.00	750.00	204.60	153,450.00		153,450.00		100.00

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - nº 271797661-2

Alar Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271583619-2

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03				BOLETIM DE MEDIÇÃO 04				CONTRATO Nº 76/2024			
CONTRATADA: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				CONTRATO				Período: 26/09/2024 à 25/10/2024			
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE				ORDEM DE SERVIÇO				Data da Medição: 28/10/2024			
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades			Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
		Unid.	Contratada	Acumulada até o Período							
02.004.003	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desmoldado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, regulariz., e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m2	1.500,00	1.500,00	-	157.125,00	157.125,00	-	157.125,00	-	100,00
02.004.004	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabamento simples	m2	1.500,00	1.500,00	-	6.090,00	6.090,00	0,00	6.090,00	-	100,00
02.004.004.001	Pintura pl. piso c/ aplicação de 2 demãos linta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	1.500,00	800,00	670,00	14.925,00	7.960,00	6.666,50	14.626,50	298,50	98,00
02.005	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					183.224,25	71.384,54	36.329,83	107.714,37	75.509,88	56,76
02.005.001	Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=8,00m, d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/RS, incl base concreto	un	16,00	16,00	-	37.741,12	37.741,12	-	37.741,12	-	100,00
02.005.002	Luminária em LED modular para iluminação pública 40W lentes em policarbonato, corpo em alumínio, pint. anti-incrustantes, grau de proteção IP67, IK08, temp de cor 5000°K, IRC >=70%, V.útl 50.000 horas, linha Street- Light da Ledstar-Unibeta ou similar	un	16,00	16,00	16,00	1.592,78	25.484,48	-	25.484,48	-	100,00
02.005.003	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	un	15,00	15,00	-	310,92	4.663,80	4.663,80	4.663,80	-	100,00
02.005.004	Eletroduto de pvc rígido oscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	1.100,00	645,00	300,00	24,32	26.752,00	7.296,00	22.982,40	3.769,60	85,90
02.005.005	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	2,00	1,00	-	236,88	473,76	236,88	236,88	-	50,00
02.005.006	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noal	un	1,00	1,00	-	562,34	562,34	-	562,34	-	100,00
02.005.007	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 450/750v / 70°C	m	600,00	-	-	34,68	20.808,00	-	-	20.808,00	-
02.005.008	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 450/750v / 70°C	m	2.000,00	100,00	55,00	19,37	38.740,00	1.055,35	3.002,35	35.737,65	7,75
02.005.009	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/750v / 70°C	m	2.000,00	850,00	200,00	12,42	24.840,00	2.484,00	13.041,00	11.799,00	52,50
02.005.010	Disjuntor termomagnético tipolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 6SKA	un	5,00	-	-	631,75	3.158,75	-	-	3.158,75	-
02.006	PAISAGISMO					37.341,00	16.585,40	13.442,90	30.028,30	7.312,70	80,41
02.006.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	600,00	380,00	-	30,34	18.204,00	-	11.529,20	6.674,80	63,33
02.006.002	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	150,00	130,00	15,00	127,58	19.137,00	1.913,70	18.499,10	637,90	96,66
02.007	DIVERSOS					17.654,35	16.585,40	9.495,07	8.159,28	53,78	-
02.007.001	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, tel. Sergipark ou similar	Un	1,00	1,00	-	1.284,48	1.284,48	-	1.284,48	-	100,00
02.007.002	Equipamento de ginástica - roda de ombro	un	1,00	1,00	-	2.108,96	2.108,96	-	2.108,96	-	100,00
02.007.003	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo	un	1,00	1,00	-	5.080,84	5.080,84	-	5.080,84	-	100,00
02.007.004	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou similar	Un	1,00	1,00	-	1.020,79	1.020,79	-	1.020,79	-	100,00
02.007.005	Marco inaugural - Rev. 01	un	1,00	-	-	896,64	896,64	-	-	896,64	-
02.007.006	Conjunto com 06 lveiras em fibra de vidro, com capacidade 500 cada, com lâmpa vai e vem	un	6,00	-	-	1.210,44	7.262,64	-	-	7.262,64	-
03	CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS DE VOLEI					144.904,92	135.748,97	3.463,01	139.231,98	5.672,94	96,08
03.001	QUADRA DE VOLEI DE AREIA					144.904,92	135.748,97	3.463,01	139.231,98	5.672,94	96,08
03.001.001	Escaravação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	23,00	23,00	-	60,77	1.397,71	-	1.397,71	-	100,00
03.001.002	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	4,00	4,00	4,00	40,51	162,04	-	162,04	-	100,00

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro CIVIL - nº 27197061-2

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 2715636/5-2

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03			BOLETIM DE MEDIÇÃO 04			CONTRATO Nº76/2024								
CONTRATADA: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA			CONTRATO			Período: 26/09/2024 à 25/10/2024								
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE			ORDEN DE SERVIÇO			Data da Medição:28/10/2024								
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades				Valores (R\$)							
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	% Medido
03.001.003	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	10,00	10,00		10,00	-	696,67	6.966,70	-	6.966,70	-	100,00	
03.001.004	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa	m	83,00	83,00		83,00	-	41,52	3.446,16	(0,00)	3.446,16	-	100,00	
03.001.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=8cm, com argamassa f5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m2	47,00	47,00		47,00	-	52,14	2.450,58	-	2.450,58	-	100,00	
03.001.006	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	188,00	188,00	-	188,00	-	7,77	1.460,76	-	1.460,76	-	100,00	
03.001.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço f5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	188,00	188,00	-	188,00	-	39,77	7.476,76	-	7.476,76	-	100,00	
03.001.008	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	188,00		-		188,00	18,12	3.406,56	-	-	3.406,56	-	
03.001.009	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zircão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	62,00	-	-	-	62,00	31,87	1.975,94	-	-	1.975,94	-	
03.001.010	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	150,00	150,00	-	150,00	-	206,45	30.967,50	-	30.967,50	-	100,00	
03.001.011	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00		-	-	1,00	290,44	290,44	-	-	290,44	-	
03.001.012	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/estecedor e catraca	par	1,00		1,00	1,00	-	1.289,85	1.289,85	-	1.289,85	-	100,00	
03.001.013	CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER													
04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	-	1,67	2.004,00	-	2.004,00	-	100,00	
04.001.002	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	20,00	20,00	-	20,00	-	595,07	11.901,40	(0,00)	11.901,40	-	100,00	
04.001.003	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	m2	30,00	30,00	-	30,00	-	52,49	1.574,70	-	1.574,70	-	100,00	
04.001.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	45,00		-	-	45,00	18,12	815,40	-	-	815,40	-	
04.001.005	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1,00), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2")	m	12,00		-	-	12,00	299,13	3.589,56	-	-	3.589,56	-	
04.001.006	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zircão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	10,00		-	-	10,00	31,87	318,70	-	-	318,70	-	
04.001.007	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	260,00	260,00	-	260,00	-	206,45	53.677,00	-	53.677,00	-	100,00	
04.001.008	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	100,00	100,00	-	100,00	-	31,07	3.107,00	-	3.107,00	-	100,00	
04.001.008.001	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desmoldado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m2	1.200,00	1.062,00	95,00	1.157,00	43,00	104,75	125.700,00	111.244,50	9.951,25	121.195,75	4.504,25	96,41

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 27119/2004 - 2

Alar Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 27156/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03				BOLETIM DE MEDIÇÃO 04				CONTRATO Nº76/2024			
CONTRATADA: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				CONTRATO				Período: 26/09/2024 à 25/10/2024			
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE				ORDEM DE SERVIÇO				Data da Medição:28/10/2024			
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades			Unid.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior		Saldo a medir	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	
04.001.008.002	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m2	24,00			24,00	4.575,12	-	-	-	4.575,12
04.001.008.003	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escomento em madeira e capotamento 4cm	m2	100,00	24,00		76,00	15.893,00	3.814,32	-	3.814,32	24,00
04.001.008.004	Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	20,00	20,00		-	12.875,20	12.875,20	-	12.875,20	100,00
04.001.008.005	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	1.200,00	600,00		600,00	11.940,00	5.970,00	-	5.970,00	50,00
04.002	Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação = 60x70x50cm	un	16,00	12,00		4,00	7.551,36	5.663,52	-	5.663,52	75,00
04.003	Mesa em concreto armado polido (c=1,60, f=0,80 e h=0,75mm), 2 bancos em concreto armado (c=1,40, f=0,40 e h=0,40mm), com pintura acrílica.	Un	4,00		2,00	2,00	5.932,40	-	2.966,20	2.966,20	50,00
05	PARQUE INFANTIL					-	33.820,59	-	-	33.820,59	-
05.001	SERVIÇOS										
05.001.001	Brinquedo - Toleim Nanilhas com pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Orla Alajala Nova	un	1,00			1,00	7.156,36	-	-	-	7.156,36
05.001.002	Brinquedo - Trem com manilhas de concreto, c/pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Orla Alajala Nova	un	1,00			1,00	5.019,40	-	-	-	5.019,40
05.001.003	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas	un	1,00			1,00	6.066,67	-	-	-	6.066,67
05.001.004	Brinquedo - Escorregadeira com manilha em concreto e piso granito cinza andorinha, c/pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Orla Alajala Nova	un	1,00			1,00	6.117,25	-	-	-	6.117,25
05.001.005	Brinquedo - Gira-gira (carrossel Ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00			1,00	4.864,53	-	-	-	4.864,53
05.001.006	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical.	Un	1,00			1,00	4.796,38	-	-	-	4.796,38
06	FRETE										
06.001	Frete: Arela grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m³	40,35	40,35		40,35	100,48	100,48	(0,00)	7.230,59	100,00
06.002	Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m³	5,67	5,67		5,67	174,34	174,34	0,00	100,48	100,00
06.003	Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m³	16,72	16,72		16,72	433,71	433,71	0,00	433,71	100,00
06.004	Frete: Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m³	91,24	91,24		91,24	6.522,06	6.522,06	(0,00)	6.522,06	100,00
TOTAL:							1.389.046,13	1.112.401,75		91.770,07	86,69%
PERCENTUAL											13,31%
AUTENTICAÇÃO											
ASSINATURA EMPRESA		FISCAL DO CONTRATO									
ATESTO QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTE BM 04 FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM, FISCAL DO CONTRATO Nº. 76/2024, EM PERFEITA ORDEM.											
ASSINATURA DA EMPRESA											

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 27191601-2

Alex Sandro Nogueira de Farias
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 27163516-2



J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA
RUA (A) 75 CONJ. ARTHUR BISPO CENTRO JAPARATUBA-SE
CNPJ: 05.325.864/0001-05

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03

ORDEN DE SERVIÇO: 04/07/2024

CONTRATO: 76/2024


PERÍODO DE CONTRATO: 06 meses

BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 04

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/09/2024 a 25/10/2024

DATA: 28/10/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		X		Y		Z		TOTAL	UNID
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
01.001	Equipe Dirigente	un	1,00				x		= 0,0639	un
02	CONSTRUÇÃO DA ORLA - TRECHO 003									
02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES									
02.001.006	Locação de container - Almoxnado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	10,00						1,00	mês
02.002	CICLOVIA									
02.002.006.001	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	600,00		183,33	m	x	3,00	m = 550,00	m2
02.003	ESTACIONAMENTO									
02.004	PASSEIO EM CONCRETO CINZA									
02.004.004.001	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	1.500,00		670,00	m	x	1,00	m = 670,00	m2
02.005	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
02.005.002	Luminária em LED modular para iluminação pública, 40W, lentes em policarbonato, corpo em alumínio, pint. anti-incrustantes, grau de proteção IP67, IK09, temp de cor 5000°K, IRC >= 70%, v. útil 50.000 horas, linha Street-Light da Ledstar- Unicoba ou similar	un	16,00		16,00	uni	x	1,00	= 16,00	un
02.005.004	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	1.100,00		300,00	m	x	1,00	= 300,00	m
02.005.008	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 450/750v / 70°C	m	2.000,00		55,00			1,00	= 55,00	m
02.005.009	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/750v / 70°C	m	2.000,00		200,00			1,00	= 200,00	m
02.006	PAISAGISMO									
02.006.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	600,00		13,57	m	x	28,00	m = 380,00	m2
02.006.002	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	150,00		150,00	m	x	0,10	m = 15,00	m3
02.007	DIVERSOS									
02.007.001	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	1,00		1,00	uni	x	1,00	= 1,00	Un
02.007.002	Equipamento de ginástica - roda de ombro	un	1,00		1,00	uni	x	1,00	= 1,00	un
02.007.003	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo	un	1,00		1,00	uni	x	1,00	= 1,00	un
02.007.004	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2". Sergipark ou similar	Un	1,00		1,00	uni	x	1,00	= 1,00	Un
03	CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS DE VOLEI									
03.001	QUADRA DE VOLEI DE AREIA									
03.001.006	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m2	244,00		6,40	m	x	1,00	m = 6,40	m2
04	CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER									
04.001	CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER									
04.001.008.001	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desmoldado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m2	1.200,00		55,20	m	x	2,50	m = 95,00	m2
04.001.008.002	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m2	24,00							m2
04.003	Mesa em concreto armado polido (c=1,60, l=0,80 e h=0,75mm), 2 bancos em concreto armado (c=1,40, l=0,40 e h=0,40mm), com pintura acrílica.	Un	4,00		2,00	uni	x	1,00	= 2,00	Un
05	PARQUE INFANTIL									
05.001	SERVIÇOS									
06	FRETE									

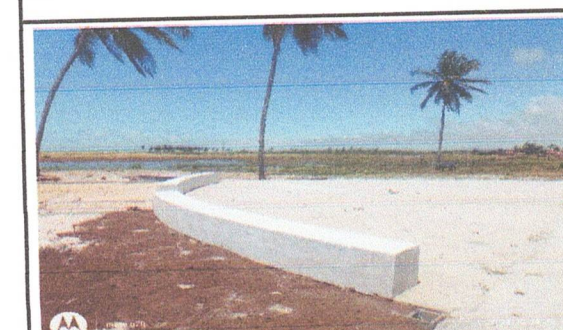


Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 2715636/0-2

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)

RESPONSÁVEL FISCAL DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

OBRA;	CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03		 PROJECT ENGENHARIA LTDA
Contratada: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA			
Contratante: MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE			
REGISTRO FOTOGRÁFICO - BM 04			
REF. BM: 04	Período : 01/09/2024 à 25/09/2024		CONTRATO Nº76/2024 PMJ
			
			
			
			


Alex Sandro Rodrigues dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-SE nº 271563679-2

Página 1 de 3

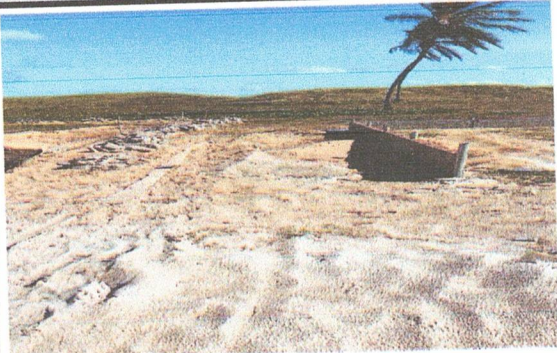
Manoel  Messias Soares Neto
 Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2

OBRA;	CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03		
Contratada: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA			
Contratante: MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE			
REGISTRO FOTOGRÁFICO - BM 04			
REF. BM: 04	Período : 01/09/2024 à 25/09/2024		CONTRATO Nº76/2024 PMJ
			
			
			
			


Alex Sandro Rodrigues dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-SE nº 271563678-2

Página 2 de 3


Manoel Messias Soares Neto
 Engenheiro Civil RN - nº 271737861 - 2

OBRA;	CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03		
Contratada: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA			
Contratante: MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE			
REGISTRO FOTOGRÁFICO - BM 04			
REF. BM: 04	Período : 01/09/2024 à 25/09/2024		CONTRATO Nº76/2024 PMJ
			
			
			
FISCALIZAÇÃO		ASSINATURA DA EMPRESA  Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	
		Manoel Moisés Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS



Objeto:

**CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU -
TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024**

Contratante: MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

Contratada: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

Ordem de Serviço: 04/07/2024

Período: 26/09/2024 à 25/10/2024

Mance Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

quinta-feira, 26 de setembro de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024

J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:

07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Corridos

89 dias

Prazo da Obra

150 dias

Restantes

61 dias

Condições Climáticas:

Manhã: Boa. / Tarde:

Equipam.

Betoneira estacionária

Serra Manual

Policorte

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Motorista / Operador

-

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Topógrafo

-

Calceteiro

-

Eletricista

-

Pedreiro

2

Pintor

-

Armador

-

Carpinteiro

-

Servente

4

Gesseiro

-

Serviços Executados

Serviços diversos de piso, pintura de piso, elétrica

Anotação da Fiscalização

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271737001 - 2

Fiscalização:

Contratada:

Vistos

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563678-2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			sexta-feira, 27 de setembro de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 90 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 60 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	1
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	4	Gesseiro	-
Serviços Executados	Serviços diversos de piso, pintura de piso, elétrica			
	Execução de piso intertravado			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 27173661-2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

sábado, 28 de setembro de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024

J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:

07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Corridos

91 dias

Prazo da Obra

150 dias

Restantes

59 dias

Condições Climáticas:

Manhã: Boa. / Tarde:

Equipam.

Pessoal

Serviços Executados

Anotação da Fiscalização

Vistos

Fiscalização:

Contratada:

Manda Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

Alex Sandro Roxrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-3

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

domingo, 29 de setembro de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024

J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:

07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Corridos

92 dias

Prazo da Obra

150 dias

Restantes

58 dias

Condições Climáticas:

Manhã: Boa. / Tarde:

Equipam.

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

Motorista / Operador

-

Mestre de Obras/ Encarregado

Topografo

-

Calceteiro

Eletricista

-

Pedreiro

Pintor

-

Armador

Carpinteiro

-

Servente

Gesseiro

-

sem atividades

Serviços Executados

Anotação da Fiscalização

Vistos

Fiscalização:

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro
RN nº 271797661-2

Contratada:

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 27156357-5

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			segunda-feira, 30 de setembro de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 93 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 57 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	1
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	4	Gesseiro	-
Serviços Executados	Serviços diversos de piso, pintura de piso, elétrica			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Manoel Messias Soares AL Engenheiro Civil RN - 27170760-0		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

terça-feira, 1 de outubro de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024

J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:

07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Corridos

94 dias

Prazo da Obra

150 dias

Restantes

56 dias

Condições Climáticas:

Manhã: Boa. / Tarde:

Equipam.

Betoneira estacionária

Serra Manual

Policorte

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Motorista / Operador

-

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Topografo

-

Calceteiro

-

Eletricista

1

Pedreiro

2

Pintor

-

Armador

-

Carpinteiro

-

Servente

4

Gesseiro

-

Serviços Executados

Serviços diversos de piso, pintura de piso, elétrica

Anotação da Fiscalização

Vistos

Fiscalização:

Contratada:

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271737661-2

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563578-3

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				quarta-feira, 2 de outubro de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024					
		J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA			
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	95 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	55 dias
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária				
	Serra Manual				
	Policorte				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro	-	Eletricista	1	
	Pedreiro	2	Pintor	-	
	Armador	-	Carpinteiro	-	
	Servente	4	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Serviços diversos de piso, pintura de piso, elétrica				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:		Contratada:		
		 Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2			

Manoel M. V. Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

quinta-feira, 3 de outubro de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024

J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:

07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Corridos

96 dias

Prazo da Obra

150 dias

Restantes

54 dias

Condições Climáticas:

Manhã: Boa. / Tarde:

Equipam.

Betoneira estacionária

Serra Manual

Policorte

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Motorista / Operador

-

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Topografo

-

Calceteiro

-

Eletricista

1

Pedreiro

2

Pintor

-

Armador

-

Carpinteiro

-

Servente

4

Gesseiro

-

Serviços Executados

Serviços diversos de piso, pintura de piso, elétrica

Anotação da Fiscalização

Vistos

Fiscalização:

Contratada:

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563078-2

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - nº 271737661-2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			sexta-feira, 4 de outubro de 2024		
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024					
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA					
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	97 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	53 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:		
Equipam.	Betoneira estacionária				
	Serra Manual				
	Policorte				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro	-	Eletricista	1	
	Pedreiro	2	Pintor	-	
	Armador	-	Carpinteiro	-	
	Servente	4	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Serviços diversos de piso, pintura de piso, elétrica				
	Execução de alambrado				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:		Contratada:		
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271737661-2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			sábado, 5 de outubro de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 98 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 52 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro		Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado		Topografo	-
	Calceteiro		Eletricista	-
	Pedreiro		Pintor	-
	Armador		Carpinteiro	-
	Servente		Gesseiro	-
Serviços Executados	sem atividades			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Manoel Mesquita Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271757661-2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563579-7	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

domingo, 6 de outubro de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024

J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:

07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Corridos

99 dias

Prazo da Obra

150 dias

Restantes

51 dias

Condições Climáticas:

Manhã: Boa. / Tarde:

Equipam.

Betoneira estacionária

Serra Manual

Policorte

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

Mestre de Obras/ Encarregado

Calceteiro

Pedreiro

Armador

Servente

Motorista / Operador

Topografo

Eletricista

Pintor

Carpinteiro

Gesseiro

Serviços Executados

sem atividades

Anotação da Fiscalização

Vistos

Fiscalização:

Contratada:

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - CRM 27150-1/2

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CRM 27150-1/2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			segunda-feira, 7 de outubro de 2024		
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024					
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA					
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	100 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	50 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:		
Equipam.	Betoneira estacionária				
	Serra Manual				
	Policorte				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro	-	Eletricista	1	
	Pedreiro	2	Pintor	-	
	Armador	-	Carpinteiro	-	
	Servente	4	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Concretagem				
	Pintura de piso, instalação de equipamentos				
Anotação da Fiscalização	serviços de elétrica				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:		
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 27165621-2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 27165621-2		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

terça-feira, 8 de outubro de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024

J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:

07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Corridos

101 dias

Prazo da Obra

150 dias

Restantes

49 dias

Condições Climáticas:

Manhã: Boa. / Tarde:

Equipam.

Betoneira estacionária

Serra Manual

Policorte

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Motorista / Operador

-

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Topografo

-

Calceteiro

-

Eletricista

1

Pedreiro

2

Pintor

-

Armador

-

Carpinteiro

-

Servente

4

Gesseiro

-

Serviços Executados

Pintura de piso, instalação de equipamentos
serviços de elétrica

Anotação da Fiscalização

Vistos

Fiscalização:

Contratada:

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - RN - nº 2711937861 - 2

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CRECA/SE nº 271563679-2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			quarta-feira, 9 de outubro de 2024		
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024					
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA					
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	102 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	48 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:		
Equipam.	Betoneira estacionária				
	Serra Manual				
	Policorte				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro	-	Eletricista	1	
	Pedreiro	2	Pintor	-	
	Armador	-	Carpinteiro	-	
	Servente	4	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Pintura de piso, instalação de equipamentos serviços de elétrica				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:		Contratada:		
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil Rn - nº 271563679-2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

quinta-feira, 10 de outubro de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024

J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:

07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Corridos

103 dias

Prazo da Obra

150 dias

Restantes

47 dias

Condições Climáticas:

Manhã: Boa. / Tarde:

Equipam.

Betoneira estacionária

Serra Manual

Policorte

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Motorista / Operador

-

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Topografo

-

Calceteiro

-

Eletricista

1

Pedreiro

2

Pintor

-

Armador

-

Carpinteiro

-

Servente

4

Gesseiro

-

Serviços Executados

Pintura de piso, instalação de equipamentos

Anotação da Fiscalização

Vistos

Fiscalização:

Contratada:

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RIV nº 271137001-2Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

sexta-feira, 11 de outubro de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024

J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:

07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Corridos

104 dias

Prazo da Obra

150 dias

Restantes

46 dias

Condições Climáticas:

Manhã: Boa. / Tarde:

Equipam.

Betoneira estacionária

Serra Manual

Policorte

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Motorista / Operador

-

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Topografo

-

Calceteiro

-

Eletricista

1

Pedreiro

2

Pintor

-

Armador

-

Carpinteiro

-

Servente

4

Gesseiro

-

Serviços Executados

Aplicação de terra vegetal
Instalações elétricas

Anotação da Fiscalização

Vistos

Fiscalização:

Contratada:

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2Mandel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - RN - nº 271751051-2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

sábado, 12 de outubro de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024



J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:

07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Corridos

105 dias

Prazo da Obra

150 dias

Restantes

45 dias

Condições Climáticas:

Manhã: Boa. / Tarde:

Equipam.

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

Motorista / Operador

-

Mestre de Obras/ Encarregado

Topografo

-

Calceteiro

Eletricista

-

Pedreiro

Pintor

-

Armador

Carpinteiro

-

Servente

Gesseiro

-

Serviços Executados

Anotação da Fiscalização

Vistos

Fiscalização:

Contratada:

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - CRM nº 271797661-2

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			domingo, 13 de outubro de 2024		
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024					
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA					
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	106 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	44 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:		
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Motorista / Operador	-	
	Mestre de Obras/ Encarregado		Topografo	-	
	Calceteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor	-	
	Armador		Carpinteiro	-	
	Servente		Gesseiro	-	
Serviços Executados					
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:		Contratada:		
	Manoel Mesias Soares Neto Engenheiro Civil RA-11.211.995-7		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 27150-678-7		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

segunda-feira, 14 de outubro de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024

J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:

07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Corridos

107 dias

Prazo da Obra

150 dias

Restantes

43 dias

Condições Climáticas:

Manhã: Boa. / Tarde:

Equipam.

Betoneira estacionária

Serra Manual

Policorte

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Motorista / Operador

-

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Topografo

-

Calceteiro

-

Eletricista

-

Pedreiro

2

Pintor

-

Armador

-

Carpinteiro

-

Servente

4

Gesseiro

-

Serviços Executados

Instalações elétricas

Piso

Luminárias

Anotação da Fiscalização

Vistos

Fiscalização:

Contratada:

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271737661 - 2

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			terça-feira, 15 de outubro de 2024		
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024					
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA					
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	108 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	42 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:		
Equipam.	Betoneira estacionária				
	Serra Manual				
	Policorte				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro	-	Eletricista	-	
	Pedreiro	2	Pintor	-	
	Armador	-	Carpinteiro	-	
	Servente	4	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Instalações elétricas				
	Piso				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:		Contratada:		
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 27197881-0		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-0		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			quarta-feira, 16 de outubro de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 109 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 41 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topógrafo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	-
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	4	Gesseiro	-
Serviços Executados	Instalações elétricas			
	Piso pintura, terra vegetal e grama			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil - CRN nº 271733821-1		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil - CREA-SE nº 271563678-1	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

quinta-feira, 17 de outubro de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024

J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:

07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Corridos

110 dias

Prazo da Obra

150 dias

Restantes

40 dias

Condições Climáticas:

Manhã: Boa. / Tarde:

Equipam.

Betoneira estacionária

Serra Manual

Policorte

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Motorista / Operador

-

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Topografo

-

Calceteiro

-

Eletricista

1

Pedreiro

2

Pintor

-

Armador

-

Carpinteiro

-

Servente

4

Gesseiro

-

Serviços Executados

Instalações elétricas

Piso pintura, terra vegetal e grama

Anotação da Fiscalização

Vistos

Fiscalização:

Contratada:

Manoel Mendes Soares Neto
Engenheiro Civil - R.N. nº 27123224-2

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563072

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			sexta-feira, 18 de outubro de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 111 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 39 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	1
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	4	Gesseiro	-
Serviços Executados	Instalações elétricas			
	Piso pintura, terra vegetal e grama			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

sábado, 19 de outubro de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024

J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:

07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Corridos

112 dias

Prazo da Obra

150 dias

Restantes

38 dias

Condições Climáticas:

Manhã: Boa. / Tarde:

Equipam.

Pessoal

Serviços Executados

Anotação da Fiscalização


Vistos

Fiscalização:

Contratada:

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2

Manoel Márcio Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			domingo, 20 de outubro de 2024		
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024					
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA					
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	113 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	37 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:		
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	-	Motorista / Operador	-	
	Mestre de Obras/ Encarregado	-	Topografo	-	
	Calceteiro	-	Eletricista	-	
	Pedreiro	-	Pintor	-	
	Armador	-	Carpinteiro	-	
	Servente	-	Gesseiro	-	
Serviços Executados					
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:		Contratada:		
	 Manoel Neresias Soares Neto Engenheiro Civil - nº 271563679-2		 Alex Sandro Rodrigues Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			segunda-feira, 21 de outubro de 2024		
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024					
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA					
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	114 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	36 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:		
Equipam.	Betoneira estacionária				
	Serra Manual				
	Policorte				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro	-	Eletricista	1	
	Pedreiro	2	Pintor	-	
	Armador	-	Carpinteiro	-	
	Servente	4	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Instalações elétricas				
	Piso pintura, terra vegetal e grama				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:		Contratada:		
	Manoel Medeiros Soares Neto Engenheiro Civil - N.º 27112-0/2017		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			terça-feira, 22 de outubro de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 115 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 35 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	1
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	4	Gesseiro	-
Serviços Executados	Serviços diversos de piso, pintura de piso, elétrica			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RRT 123456789		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			quarta-feira, 23 de outubro de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 116 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 34 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	1
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	4	Gesseiro	-
Serviços Executados	Serviços diversos de piso, pintura de piso, elétrica			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Manoel Mesquita Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271757621-0		Alex Sandro Rodrigues das Neves Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563675-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

quinta-feira, 24 de outubro de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024

J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:

07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Corridos

117 dias

Prazo da Obra

150 dias

Restantes

33 dias

Condições Climáticas:

Manhã: Boa. / Tarde:

Equipam.

Betoneira estacionária

Serra Manual

Policorte

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Motorista / Operador

-

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Topografo

-

Calceteiro

-

Eletricista

1

Pedreiro

2

Pintor

-

Armador

-

Carpinteiro

-

Servente

4

Gesseiro

-

Serviços Executados

Serviços diversos de piso, pintura de piso, elétrica

Anotação da Fiscalização

Vistos

Fiscalização:

Contratada:

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2

Manoel Mesquita Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797021-2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			sexta-feira, 25 de outubro de 2024		
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024					
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA					
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	118 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	32 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:		
Equipam.	Betoneira estacionária				
	Serra Manual				
	Policorte				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro	-	Eletricista	1	
	Pedreiro	2	Pintor	-	
	Armador	-	Carpinteiro	-	
	Servente	4	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Serviços diversos de piso, pintura de piso, elétrica				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:		Contratada:		
Manoel Mesquita Soares Neto Engenheiro Civil - CRN nº 27113-2024		Alex Sandro Rodrigues de Sousa Engenheiro Civil - CREA-SE nº 271563679-2			



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

MANOEL MESSIAS SOARES NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2717976612

Registro: 2717976612SE

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Pirambu

RUA RUA GIVALDO MOURA DA SILVA

Complemento:

Cidade: PIRAMBU

Bairro: CENTRO

UF: SE

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

Nº: 16

CEP: 49190000

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 0,00

Ação Institucional: Outros

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA PIRAMBU

Complemento:

Cidade: PIRAMBU

Data de Início: 17/04/2024

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pirambu

Nº: s/n

Bairro: CENTRO

UF: SE

CEP: 49190000

Previsão de término: 31/12/2024

Coordenadas Geográficas: -10.738536, -36.856371

Código: 49190-000

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO

Quantidade
2.000,00

Unidade
m2

2.000,00

m2

1.000,00

m

14 - Elaboração

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

Quantidade
1,00

Unidade
un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART referente ao serviço de elaboração do orçamento e fiscalização na construção da nova etapa da orla na Sede do Município de Pirambu-SE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Documento assinado digitalmente

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE



MANOEL MESSIAS SOARES NETO
Data: 03/09/2024 09:53:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MANOEL MESSIAS SOARES NETO - CPF: 049.126.295-70

Local de data

Prefeitura Municipal de Pirambu - CNPJ: 13.095.039/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em: 19/07/2024

Valor pago: R\$ 99,64

Nosso Número: 8203223990

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 56cWz
Impresso em: 03/09/2024 às 09:52:30 por: , Ip: 177.37.182.61





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 476414/2024
Emissão: 12/08/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: BADCA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Registro: 2715636792

CPF: 995.***-**-68

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 29/07/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE TIRADENTES

Data de Formação: 21/07/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000003307

CNPJ: 05.325.864/0001-05

Data Início: 10/04/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 476415/2024
Emissão: 12/08/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 18A1x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

quadro técnico.

- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Registro: 2715636792

CPF: 995.***.***-68

Data Início: 10/04/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 476415/2024
Emissão: 12/08/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 18A1x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 05.325.864/0001-05

Registro: 0000003307

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 10/04/2019

Faixa: 2

Objetivo Social Pleno: CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DE QUALQUER TIPO, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS OLÍMPICAS E OUTRAS CONSTRUÇÕES SIMILARES; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, GESTÃO DE ATERROS SANITÁRIOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DO RESÍDUOS PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL E ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E RODAGENS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; ATIVIDADES DE CONSULTORIA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA; OS SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTE DE TELECOMUNICAÇÕES - SRTI; ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES MOVEIS, PARA PROMOVA A TRANSMISSÃO DE VOZ, DADOS E IMAGEM; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO E DE DIAGRAMAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO DOMÉSTICO OU INDUSTRIAL E DE ÁGUAS PLUVIAIS POR MEIO DE REDES DE COLETORES, TANQUES E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS. RODOVIAS, FERROVIAS E PORTOS; USINAS DE COMPOSTAGEM; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL (NÃO ESPECIALIZADA) DE PRÉDIOS DE QUALQUER TIPO: RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, FÁBRICAS, ARMAZÉNS, HOSPITAIS, PRÉDIOS PÚBLICOS E OUTROS PRÉDIOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA CORNO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, LIMPEZA DE RUAS; CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AUTO - ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NÃO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA: AS ATIVIDADES DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL SÃO: CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DE QUALQUER TIPO, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS OLÍMPICAS E OUTRAS CONSTRUÇÕES SIMILARES; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, GESTÃO DE ATERROS SANITÁRIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL E ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E URBANISMO; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E RODAGENS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA CIVIL; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES EM BAIXA TENSÃO; COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO DOMÉSTICO OU INDUSTRIAL E DE ÁGUAS PLUVIAIS POR MEIO DE REDES DE COLETORES, TANQUES E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODESIA; USINAS DE COMPOSTAGEM; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; LIMPEZA DE RUAS; CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AUTO - ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NÃO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS.

Endereço Matriz: RUA A, 75, LOT. ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO, CENTRO, JAPARATUBA, SE, 49960000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 26/05/2003

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000002659EMSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais co





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240390999

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2715636792**

Registro: **2715636792SE**

Empresa contratada: **J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA**

Registro : **0000003307-SE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE PIRAMBU ESTADO DE SERGIPE**

CPF/CNPJ: **13.095.039/0001-81**

PRAÇA Praça dos Esportes

Nº: **75**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PIRAMBU**

UF: **SE**

CEP: **49190000**

Contrato: **76/2024**

Celebrado em: **07/05/2024**

Valor: **R\$ 1.389.046,13**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Calamidade Pública**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA Praça dos Esportes

Nº: **75**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PIRAMBU**

UF: **SE**

CEP: **49190000**

Data de Início: **04/07/2024**

Previsão de término: **31/12/2024**

Coordenadas Geográficas: **-10.701820, -36.861510**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE PIRAMBU ESTADO DE SERGIPE**

CPF/CNPJ: **13.095.039/0001-81**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA	240,00	m3
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS	3.300,00	m2
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	3.300,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES	244,00	m2
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO	1.460,00	m3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03, CONTRATO Nº 76/2024, PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA/SE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

ABENC/SE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS DE SERGIPE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 995.239.735-68

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

MUNICÍPIO DE PIRAMBU ESTADO DE SERGIPE - CNPJ: 13.095.039/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YdDCZ
 Impresso em: 19/07/2024 às 10:35:01 por: , ip: 45.161.179.118

www.crea-se.org.br
 Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br
 Fax: XXXX-XXXX

CREA-SE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia de Sergipe





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.325.864/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:01:32 do dia 25/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/03/2025.

Código de controle da certidão: **2B6D.5345.668A.69C2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 557602 / 2024

Identificação do Solicitante: 05.325.864/0001-05

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **05.325.864/0001-05** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **05.325.864/0001-05** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **10/10/2024 às 09:17:37**, válida até **09/11/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 10 de Outubro de 2024

Autenticação: 20241010QOEACL

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.325.864/0001-05

Razão

Social:

J A PROJECT E ENGENHARIA LTDA

Endereço: R A 75 LOT ARTHUR B DO ROS / CENTRO / JAPARATUBA /
SE / 49960-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/10/2024 a 02/11/2024 ✓

Certificação Número: 2024100419471225508437

Informação obtida em 10/10/2024 09:22:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Japaratuba

Certidão N°
5432024

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

C.M.C
0533

Em cumprimento à solicitação do requerente, com as características acima e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito, que mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte.

CONTRIBUINTE

Código 3461	Nome ou Razão Social J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ 05.325.864/0001-05
Endereço LOT RUA A LOT ARTHUR BISPO DO ROSARIO N° 75	Complemento	
Bairro CENTRO	Cidade Japaratuba	UF SE

Data Emissão

10/09/2024

Data Validade

09/11/2024 ✓

IMPORTANTE

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<http://municipioonline.com.br/se/prefeitura/japaratuba>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 611E4DD8

terça-feira, 10 de setembro de 2024



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.325.864/0001-05

Certidão nº: 55266873/2024

Expedição: 12/08/2024, às 17:48:25

Validade: 08/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.325.864/0001-05, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Data da consulta: 30/10/2024 08:52:48

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.325.864/0001-05**

Opção pelo Simples Nacional/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra		Nome da obra		Data do cadastramento	
90.020.27538/76		J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA		01/08/2024 15:54	
Origem do cadastramento					
e-CAC					
Tipo Zona		ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Zona Urbana		Nº SE20240390999			S/N
Data do início da obra		CNAE			
04/07/2024		4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas			

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	04/07/2024

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	PIRAMBU	SE	49.190-000
Bairro	Logradouro	Número	
CENTRO	AVENIDA MARIA A OLIVEIRA	S/N	

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA	05.325.864/0001-05	Construtora
Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade	
04/07/2024		

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
13.095.039/0001-81	MUNICIPIO DE PIRAMBU

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Residencial multifamiliar	Alvenaria	100,00 m²

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Residencial multifamiliar	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	20,00 m²	250,00 m²	270,00 m²
Obra Nova	Edifício de Garagens	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	15,00 m²	50,00 m²	65,00 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra

435,00 m²

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA

Alvará Nº
1/2024

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

C.M.C
0533

Nome ou Razão Social
J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia
J & A ENGENHARIA

Endereço
LOT RUA A LOT ARTHUR BISPO DO ROSARIO Nº 75

Complemento

Bairro
CENTRO

Cidade
Japaratuba

UF
SE

CPF/CNPJ
05.325.864/0001-05

Ramo Atividade
SERVIÇOS

Data Início das Atividades
07/10/2002

Observação

CNAE	Descrição CNAE	Principal
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Sim
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	Não
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO	Não
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES	Não
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	Não
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	Não
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	Não
3839401	USINAS DE COMPOSTAGEM	Não
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	Não
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS	Não
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	Não
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES	Não
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	Não
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS	Não
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL	Não
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	Não
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Não
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Não
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM	Não
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL	Não
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA	Não
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO,	Não
6110802	SERVIÇOS DE REDES DE TRANSPORTE DE TELECOMUNICAÇÕES - SRTT	Não
6120599	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SEM FIO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Não
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA	Não
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Não
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA	Não
7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS	Não
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA	Não
7410299	ATIVIDADES DE DESIGN NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Não
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	Não
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	Não
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS	Não
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	Não
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Não
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS	Não

Mirabel Xavier Santos
Coordenadora da Área de
Fiscalização e Tributação



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA

Alvará Nº
1/2024

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

C.M.C
0533

Data Emissão

19/01/2024

Data Validade

31/12/2024

Mirabeli Vitor Santos
Mirabeli Vitor Santos
Coordenadora Geral de
Licenciamento e Tributação

IMPORTANTE

O Alvará de Licença original deverá ficar exposto no estabelecimento licenciado. Em caso de encerramento, mudança de endereço, alteração do ramo de atividade, de razão social do quadro societário, deverá solicitar tais alterações previamente a prefeitura.
A aceitação deste alvará está condicionado à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://municipioonline.com.br/se/prefeitura/japaratuba>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: E4574A94

sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

CPF/CNPJ do Empregador 05.325.864		Nome/Razão Social do Empregador J A PROJECT ENGENHARIA LTDA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124102934826702-0	Tag 05325864 10/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 271,35

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	2	271,35	0,00	0,00	0,00	271,35
Total Geral:		271,35	0,00	0,00	0,00	271,35

Data de geração da Guia: 29/10/2024 às 09:57:27 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014hr.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eec3a4ee2a824b3c862f2d89a2defa705204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A8P1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eec3a4002a824b3c862f2d89a2defa70

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

(00052)

Página : 00001

End. : RUA A , 75 LOTEAMENTO ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO CNPJ/CEI: 05.325.864/0001-05

Ref.: 01/10/2024 a 31/10/2024

Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000015 JOAO DOS SANTOS

1.412,00 Função : Ajudante de Pedreiro

Livro: 0000 Folha. : 015

Admissão : 01/02/2021

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

220:00

1.412,00

903 INSS Folha

105,90

1.412,00

105,90

*****1.306,10

_____/_____/_____

Base INSS: 1.412,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.412,00 (Valor: 112,96)

Base IRRF Folha: 847,20

000018 JOSE HUMBERTO DOS SANTOS

1.979,90 Função : Pedreiro

Livro: 0000 Folha. : 018

Admissão : 16/09/2024

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

220:00

1.979,90

903 INSS Folha

157,01

1.979,90

157,01

*****1.822,89

_____/_____/_____

Base INSS: 1.979,90 (Aliq.: 7,9301%)

Base FGTS: 1.979,90 (Valor: 158,39)

Base IRRF Folha: 1.415,10

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****3.391,90	Total Funcionários	2
		Total Cotas Sal. Família	0
(-) Total de Descontos	*****262,91	Total INSS	262,91
(=) Total Líquido	*****3.128,99	Total FGTS	271,35
		Total IRRF	0,00

** Empresa Optante pelo Super Simples - (Lei Complementar 123/96) **

J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA RUA A , 75 LOTEAMENTO ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO CNPJ: 05.325.864/0001-05 Japaratub/ SE				Demonstrativo de Pagamento de Salário 01/10/2024 a 31/10/2024	
000018 JOSE HUMBERTO DOS SANTOS				DEP: UNICO	
ADMISSÃO: 16/09/2024 CPF: 31198317515 CTPS: 04963751 / 00020 FUNÇÃO: Pedreiro				CBO: 715210	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.979,90	157,01	
903	INSS Folha				
			1.979,90	157,01	
			Valor Líquido	1.822,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
1.979,90	1.979,90	1.979,90	158,39	1.415,10	0,00 %
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA RUA A , 75 LOTEAMENTO ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO CNPJ: 05.325.864/0001-05 Japaratub/ SE				Demonstrativo de Pagamento de Salário 01/10/2024 a 31/10/2024	
000018 JOSE HUMBERTO DOS SANTOS				DEP: UNICO	
ADMISSÃO: 16/09/2024 CPF: 31198317515 CTPS: 04963751 / 00020 FUNÇÃO: Pedreiro				CBO: 715210	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.979,90	157,01	
903	INSS Folha				
			1.979,90	157,01	
			Valor Líquido	1.822,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
1.979,90	1.979,90	1.979,90	158,39	1.415,10	0,00 %
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA RUA A , 75 LOTEAMENTO ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO CNPJ: 05.325.864/0001-05 Japaratub/ SE				Demonstrativo de Pagamento de Salário 01/10/2024 a 31/10/2024	
000015 JOAO DOS SANTOS				DEP: UNICO	
ADMISSÃO: 01/02/2021 CPF: 55778380534 CTPS: 02310666 / 00020 FUNÇÃO: Ajudante de Pedreiro				CBO: 717020	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.412,00		
903	INSS Folha			105,90	
			1.412,00	105,90	
			Valor Líquido	1.306,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	847,20	0,00 %
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			_____/_____/_____ DATA		
			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA RUA A , 75 LOTEAMENTO ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO CNPJ: 05.325.864/0001-05 Japaratub/ SE				Demonstrativo de Pagamento de Salário 01/10/2024 a 31/10/2024	
000015 JOAO DOS SANTOS				DEP: UNICO	
ADMISSÃO: 01/02/2021 CPF: 55778380534 CTPS: 02310666 / 00020 FUNÇÃO: Ajudante de Pedreiro				CBO: 717020	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.412,00		
903	INSS Folha			105,90	
			1.412,00	105,90	
			Valor Líquido	1.306,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	847,20	0,00 %
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			_____/_____/_____ DATA		
			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.325.864 Nome Empregador: J A PROJECT ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0124102934826702-0 Data Emissão: 29/10/2024 09:57:27 (Brasília)

Total da Guia (FGTS): 271,35

Emitida por: 10.451.338/0001-13 - CONTEPA -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.325.864/0001-05										Tomador: Sem Tomador			
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		JOAO DOS SANTOS	000520000015	557.783.805-34	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		JOSE HUMBERTO DOS SANTOS	000520000018	311.983.175-15	101	19/11/2024	Mensal	1.979,90	158,39	0,00	0,00	0,00	158,39
Total do Tomador									3.391,90	0,00	0,00	0,00	271,35
Total do Estabelecimento									3.391,90	0,00	0,00	0,00	271,35
Total FGTS									3.391,90	0,00	0,00	0,00	271,35

Empregador:	05.325.864	Nome Empregador:	J A PROJECT ENGENHARIA LTDA		
Vencimento da Guia:	19/11/2024				
Número da Guia:	0124102934826702-0	Data Emissão:	29/10/2024 09:57:27 (Brasília)		
				Total Parcelado:	0,00
				Qtd. Trabalhadores FGTS:	2
				Origem: Gestão de Guias	271,35
				Total da Guia (FGTS):	

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.325.864/0001-05										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	2	3.391,90	271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,35
		Total FGTS	3.391,90	271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,35

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.001/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 110 - Trabalhador avulso portuário
- 111 - Trabalhador avulso não portuário
- 112 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 113 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 114 - Exercente de mandato eletivo
- 115 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 116 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante da administração pública
- 117 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 118 - Militar
- 119 - Conscrito
- 120 - Agente público - Outros
- 121 - Agente público - Outros
- 122 - Juiz
- 123 - Ministros, juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 124 - Auxiliar local
- 125 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 126 - Trabalhador cedido/exercido em outro órgão/empresa - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 127 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 128 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 129 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 130 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 131 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 132 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 133 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 134 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 135 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 136 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 137 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico
- 138 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 139 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 140 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 141 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 142 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 143 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 144 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 145 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 146 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 147 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 148 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 149 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 150 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 151 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 152 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 153 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 154 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 155 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 156 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 157 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 158 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 159 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 160 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 161 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 162 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 163 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 164 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 165 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 166 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 167 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 168 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 169 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 170 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 171 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 172 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 173 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 174 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 175 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 176 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 177 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 178 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 179 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 180 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 181 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 182 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 183 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 184 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 185 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 186 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 187 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 188 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 189 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 190 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 191 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 192 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 193 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 194 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 195 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 196 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 197 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 198 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 199 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 200 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 201 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 202 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 203 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 204 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 205 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 206 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 207 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 208 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 209 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 210 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 211 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 212 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 213 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 214 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 215 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 216 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 217 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 218 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 219 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 220 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 221 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 222 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 223 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 224 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 225 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 226 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.325.864 Nome Empregador: J A PROJECT ENGENHARIA LTDA

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Número da Guia: 0124102934826702-0 Data Emissão: 29/10/2024 09:57:27 (Brasília) Emitida por: 10.451.338/0001-13 - CONTEPA -

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 271,35

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	05.325.864/0001-05	2	3.391,90	271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,35
		Total FGTS	3.391,90	271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,35



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.325.864 Nome Empregador: J A PROJECT ENGENHARIA LTDA

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Número da Guia: 0124102934826702-0 Data Emissão: 29/10/2024 09:57:27 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 10.451.338/0001-13 - CONTEPA -

Total da Guia (FGTS): 271,35

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.325.864/0001-05										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	2	3.391,90	271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,35
		Total FGTS	3.391,90	271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,35



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.325.864 Nome Empregador: J A PROJECT ENGENHARIA LTDA
Vencimento da Guia: 19/11/2024
Número da Guia: 0124102934826702-0 Data Emissão: 29/10/2024 09:57:27 (Brasília) Emitida por: 10.451.338/0001-13 - CONTEPA -

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 271,35

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	2	3.391,90	271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,35
	Total FGTS	3.391,90	271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,35
