



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4471 / 006 / 00672005-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PIRAMBU GABINETE PREFEITO
CPF/CNPJ:	13.095.039/0001-81

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2206 / 00000007290-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	J A PROJECT E ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ:	05.325.864/0001-05
Valor:	R\$ 210.025,34
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONSTRUCAO DA NOVA E
Histórico:	

PAGO

Data de débito:	20/08/2024
Data / Hora da operação:	20/08/2024 15:56:14

Código da operação:	00139349
Chave de segurança:	80RLAECKNCLPQKWP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4471 / 006 / 00672005-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PIRAMBU GABINETE PREFEITO
CPF/CNPJ:	13.095.039/0001-81

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2206 / 7290-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	J A PROJECT E ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ:	05.325.864/0001-05
Valor:	R\$ 210.025,34
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONSTRUCAO DA NOVA ETAPA
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE CONSTRUCAO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU.

Data de débito:	20/08/2024
Data / Hora da autorização:	20/08/2024 15:38:12

Código da operação:	48036021
---------------------	----------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 05.325.864/0001-05

Nome: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Endereço: R A

Bairro: CENTRO

E-mail: @

Compl: LOTE ARTHUR B DO ROSARIO

Cidade: Japaratuba

Telefone: (79)99003-449

UF: SE

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Conta:

EMPENHO	EMIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	FONTE
0812011	12/08/2024	1055.44905100-17063110	Global	17063110 - Transferência Especial da União

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A 1º TERMO DE APOSTILAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2024 E CONTRATO Nº 76/2024.

Documentação	
Nota Fiscal	05
Valor	R\$ 212.576,25
Emissão	12/08/2024
Horário de Entrega	16/08/2024 12:32:26

Para acompanhar o andamento do seu processo na fila pública, acesse o link abaixo:

<http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pirambu/fornecedor/filapagamento>

Cadastrado por: Santiago Santos Gois

☒ Aprovado

☐ Reprovado

Obs.



MUNICÍPIO DE JAPARATUBA

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento Tributário - Praça Padre Caio Tavares, Nº 86, Centro - CEP: 49.960-000

- Telefone: (79) 3272-3216

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
12/08/2024 16:59:20

Período de Competência Município de Prestação do
08/2024

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte
(ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em
Pirambu

Serviço
Pirambu - SE

Nota: 2024000

00000005

Código Verificação
EC5H-FUYA



MUNICÍPIO DE JAPARATUBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia

J & A ENGENHARIA

CPF/CNPJ

05.325.864/0001-05

Inscrição Municipal

533

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

jcalex1@hotmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 9900-3449

Endereço

RUA A, LOT. ARTHUR BISPO DO ROSARIO, 75, Centro - CEP: 49960-000 - Japaratuba - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

CPF/CNPJ

13.095.039/0001-81

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3276-1375

E-mail

pmpirambu@hotmail.com

Endereço

Rua Givaldo Moura da Silva, 16 - Centro - CEP: 49190-000 - Pirambu - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
CNAE: 4213800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA ORLA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.
VINCULADO AO CONTRATO Nº 76/2024.

CONTRATO Nº 76/2024

PERÍODO: 04/07/2024 à 31/07/2024

CNO: 90.020.27538/76

(ISS 2,00%) RETIDO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/06. Art. 18, § 5, inc.I PERTINENTE AO REGIME TRIBUTARIO (SIMPLES NACIONAL)

SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

BASE DE CALCULO PARA EFEITO DO ISS CONFORME CODIGO TRIBUTARIO MUNICIOIO DE PIRAMBU/SE:

CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PREFEITURA DE PIRAMBU/SE - MATERIAL 40%

CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PREFEITURA DE PIRAMBU/SE - MAO DE OBRA 60%

VALOR DO ISS A SER RETIDO CONFORME BASE DE CALCULO (R\$ 127.545,75 X 2,00%)

DADOS BANCARIOS:

J A PROJECT ENG

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2206-3

CONTA CORRENTE: 7290-7

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

212.576,25

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

2,0000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

212.576,25

Valor Total da Nota (R\$)

212.576,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 28.591,51 Federal e R\$ 10.628,81 Municipal. Fonte: IBPT [B047CD]

Visualizado em: 12/08/2024 17:01:42

Para validação desta NFS-e acesse: <http://japaratubase.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 370 de 23 de abril de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
DECLARO QUE

☒ Os serviços foram prestados

☐ Os produtos foram entregues

☐ A obra foi executada

Data: 12 / 08 / 2024

A

Prefeitura Municipal de Pirambu/SE
Praça Nossa Senhora de Lurdes, nº 16, Centro
Pirambu/SE

Assunto: ENCAMINHAMENTO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 PARA PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 76/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU.

FATURA

A EMPRESA J & A PROJECT E ENGENHARIA LTDA, a importância supra de R\$ **212.576,25** (duzentos e doze mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) referente ao pagamento do 1º Boletim de Medição, referente ao Contrato 76/2024, CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU.

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pirambu/SE a importância supra de R\$ **212.576,25** (duzentos e doze mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) referente ao pagamento do 1º Boletim de Medição, referente ao Contrato 76/2024, CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU. Em anexo.


Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme lei Federal Nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Banco do Brasil

Agência → : 2206-3

Conta Corrente: 7290-7

Japaratuba/SE, 13 de agosto de 2024



J A Project & Engenharia LTDA
Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Representante Legal

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03			BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO Nº78/2024			
CONTRATADA: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA			CONTRATO				Período: 04/07/2024 à 31/07/2024			
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE			ORDEM DE SERVIÇO				Data da Medição: 02/08/2024			
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades			Saldo a medir	Unit.	Valores (R\$)			
		Und	Contratada	Acumulada Anterior			Do Período	Acumulada Anterior	Acumulada até o Período	% Medido
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
01.001	Equipe Dirigente	un	1,00		0,148	0,148	0,852	47.006,78	47.006,78	14,80
02	CONSTRUÇÃO DA ORLA - TRECHO 003									
02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES									
02.001.001	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	m2	0,35		1,00	1,00		894.622,41	894.622,41	21,21
02.001.002	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00		7.000,00	7.000,00		119.375,21	119.375,21	63,08
02.001.002	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até instalada	m2	7.000,00		1,00	1,00		652,63	652,63	-
02.001.003	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00		1,00	1,00		898,95	898,95	100,00
02.001.004	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00		1,00	1,00		1.921,69	1.921,69	100,00
02.001.005	Locação de container - Almostrado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	10,00		1,00	1,00		958,88	958,88	10,00
02.001.006	Avenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedreiras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeição mecânica e transporte	m3	150,00		91,24	91,24	58,76	89.580,50	89.580,50	60,82
02.002	CICLOVIA									
02.002.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	600,00		600,00	600,00		1.002,00	1.002,00	100,00
02.002.002	Melo-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	600,00		600,00	600,00		35.634,00	35.634,00	100,00
02.002.003	Pintura de meio fio (calçada)	m	600,00			600,00		1.800,00	1.800,00	-
02.002.004	Atorro de caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	300,00		225,00	225,00	75,00	61.380,00	61.380,00	75,00
02.002.005	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desmoldado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m2	600,00		300,00	300,00	300,00	62.850,00	62.850,00	50,00
02.002.006	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples	m2	600,00			600,00	600,00	2.436,00	2.436,00	-
02.002.006.001	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	600,00			600,00	600,00	5.970,00	5.970,00	-
02.003	ESTACIONAMENTO									
02.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	240,00		240,00	240,00		400,80	400,80	1,25
02.003.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	240,00			240,00	240,00	30.064,80	30.064,80	-
02.003.003	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	100,00			100,00	100,00	1.395,00	1.395,00	-
02.004	PASSEIO EM CONCRETO CINZA									
02.004.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.500,00			1.500,00	1.500,00	334.095,00	334.095,00	-

Manoel Medeiros Soares Neto
Engenheiro Civil - nº 271797661-2
CREA-SE nº 27155/519-2

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03			BOLETIM DE MEDIÇÃO 01			CONTRATO Nº78/2024								
CONTRATADA: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA			CONTRATO			Período: 04/07/2024 à 31/07/2024								
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE			ORDEN DE SERVIÇO			Data da Medição: 02/08/2024								
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades				Valores (R\$)							
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
02.004.002	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	750,00		-	-	-	750,00	204,60	153.450,00	-	-	153.450,00	-
02.004.003	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desmoldado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m2	1.500,00		-	-	-	1.500,00	104,75	157.125,00	-	-	157.125,00	-
02.004.004	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples	m2	1.500,00		-	-	-	1.500,00	4,06	6.090,00	-	-	6.090,00	-
02.004.004.001	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	1.500,00		-	-	-	1.500,00	9,95	14.925,00	-	-	14.925,00	-
02.005	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-	-	-	-		183.224,25	-	-	183.224,25	-
02.005.001	Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=8,00m, d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref. 1008/B, incl base concreto	un	16,00		-	-	-	16,00	2.358,82	37.741,12	-	-	37.741,12	-
02.005.002	Luminária em LED modular para iluminação pública, 40W, lentes em policarbonato, corpo em alumínio, pint anti-incrustantes, grau de proteção IP67, IK09 temp de cor 5000°K, IRC >ou=70%, v.útil 50.000 horas, linha Street-Light da Ledstar-Unicoba ou similar	un	16,00		-	-	-	16,00	1.592,78	25.484,48	-	-	25.484,48	-
02.005.003	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	un	15,00		-	-	-	15,00	310,92	4.663,80	-	-	4.663,80	-
02.005.004	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	1.100,00		-	-	-	1.100,00	24,32	26.752,00	-	-	26.752,00	-
02.005.005	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	2,00		-	-	-	2,00	236,88	473,76	-	-	473,76	-
02.005.006	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em nobil	un	1,00		-	-	-	1,00	562,34	562,34	-	-	562,34	-
02.005.007	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 450/750v / 70°c	m	600,00		-	-	-	600,00	34,68	20.808,00	-	-	20.808,00	-
02.005.008	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 450/750v / 70°c	m	2.000,00		-	-	-	2.000,00	19,37	38.740,00	-	-	38.740,00	-
02.005.009	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/750v / 70°c	m	2.000,00		-	-	-	2.000,00	12,42	24.840,00	-	-	24.840,00	-
02.005.010	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	5,00		-	-	-	5,00	631,75	3.158,75	-	-	3.158,75	-
02.006	PAISAGISMO				-	-	-	-		37.341,00	-	-	37.341,00	-
02.006.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	600,00		-	-	-	600,00	30,34	18.204,00	-	-	18.204,00	-
02.006.002	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	150,00		-	-	-	150,00	127,58	19.137,00	-	-	19.137,00	-
02.007	DIVERSOS				-	-	-	-		17.654,35	-	-	17.654,35	-
02.007.001	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Seripark ou similar	un	1,00		-	-	-	1,00	1.284,48	1.284,48	-	-	1.284,48	-
02.007.002	Equipamento de ginástica - roda de ombro	un	1,00		-	-	-	1,00	2.108,96	2.108,96	-	-	2.108,96	-
02.007.003	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo	un	1,00		-	-	-	1,00	5.080,84	5.080,84	-	-	5.080,84	-
02.007.004	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Seripark ou similar	un	1,00		-	-	-	1,00	1.020,79	1.020,79	-	-	1.020,79	-
02.007.005	Marco inaugural - Rev. 01	un	1,00		-	-	-	1,00	896,64	896,64	-	-	896,64	-
02.007.006	Conjunto com 06 fixas em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	6,00		-	-	-	6,00	1.210,44	7.262,64	-	-	7.262,64	-
03	CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS DE VOLEI				-	-	-	-		144.904,92	-	-	144.904,92	-
03.001	QUADRA DE VOLEI DE AREIA				-	-	-	-		9.290,25	-	-	9.290,25	-
03.001.001	Escavação manual da vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	23,00		-	-	-	23,00	60,77	1.397,71	-	-	1.397,71	-

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - nº 271197661-2

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CRECA/SE nº 271503519-2

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03				BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO Nº76/2024						
CONTRATADA: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				CONTRATO				Período: 04/07/2024 à 31/07/2024						
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE				ORDEM DE SERVIÇO				Data da Medição:02/08/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Quantidades			Valores (R\$)						
					Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
03.001.002	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sapô, sem controle do grau de compactação	m3	4,00	-	-	-	4,00	40,51	162,04	-	-	-	162,04	-
03.001.003	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	10,00	-	-	-	10,00	696,67	6.966,70	-	-	-	6.966,70	-
03.001.004	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "U" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa	m	83,00	-	-	-	83,00	41,52	3.446,16	-	-	-	3.446,16	-
03.001.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), juntas=2cm	m2	47,00	-	-	-	47,00	52,14	2.450,58	-	-	-	2.450,58	-
03.001.006	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto murela	m2	244,00	-	-	-	244,00	342,68	83.613,92	-	-	-	83.613,92	-
03.001.007	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 09/2015	m2	188,00	-	-	-	188,00	7,77	1.460,76	-	-	-	1.460,76	-
03.001.008	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	188,00	-	-	-	188,00	39,77	7.476,76	-	-	-	7.476,76	-
03.001.009	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	188,00	-	-	-	188,00	18,12	3.406,56	-	-	-	3.406,56	-
03.001.010	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	62,00	-	-	-	62,00	31,87	1.975,94	-	-	-	1.975,94	-
03.001.011	Aterro de áreas com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	150,00	-	45,00	45,00	105,00	206,45	30.967,50	-	9.290,25	9.290,25	21.677,25	30,00
03.001.012	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	-	-	-	1,00	290,44	290,44	-	-	-	290,44	-
03.001.013	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/estacador e catraca	par	1,00	-	-	-	1,00	1.289,85	1.289,85	-	-	-	1.289,85	-
04.001.001	CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER	m2	1.200,00	-	-	-	1.200,00	1,67	2.004,00	-	-	-	2.004,00	-
04.001.002	Locação de serviços de pavimentação	m2	20,00	-	-	-	20,00	595,07	11.901,40	-	-	-	11.901,40	-
04.001.003	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 sacco cimento 50kg / 5 pedrolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeccção mecânica e transporte	m3	30,00	-	-	-	30,00	52,49	1.574,70	-	-	-	1.574,70	-
04.001.004	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	m2	45,00	-	-	-	45,00	18,12	815,40	-	-	-	815,40	-
04.001.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	12,00	-	-	-	12,00	299,13	3.589,56	-	-	-	3.589,56	-
04.001.006	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1,00), com barras verticais e cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2")	m	10,00	-	-	-	10,00	31,87	318,70	-	-	-	318,70	-
04.001.007	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	260,00	-	-	-	260,00	206,45	53.677,00	-	-	-	53.677,00	-
04.001.008	Aterro de áreas com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	100,00	-	-	-	100,00	31,07	3.107,00	-	-	-	3.107,00	-
04.001.008.001	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	1.200,00	-	-	-	1.200,00	104,75	125.700,00	-	-	-	125.700,00	-
04.001.008.002	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempenado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m2	1.200,00	-	-	-	1.200,00	104,75	125.700,00	-	-	-	125.700,00	-

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - nº 271797661-2

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 27156373-2


OBRA: CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03			BOLETIM DE MEDIÇÃO 01			CONTRATO Nº78/2024								
CONTRATADA: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA			CONTRATO		Período: 04/07/2024 à 31/07/2024									
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE			ORDEM DE SERVIÇO		Data da Medição: 02/08/2024									
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades				Valores (R\$)								
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
04.001.008.002	Coboto de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m2	24,00		-		24,00	190,63	4.575,12	-		-	4.575,12	
04.001.008.003	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	100,00		-		100,00	158,93	15.893,00	-		-	15.893,00	-
04.001.008.004	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	20,00		-		20,00	643,76	12.875,20	-		-	12.875,20	
04.001.008.005	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	1.200,00		-		1.200,00	9,95	11.940,00	-		-	11.940,00	-
04.002	Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação = 60x70x50cm	un	16,00		-		16,00	471,96	7.551,36	-		-	7.551,36	-
04.003	Mesa em concreto armado polido (c=1,60, l=0,80 e h=0,75mm), 2 bancos em concreto armado (c=1,40, l=0,40 e h=0,40mm), com pintura acrílica.	Un	4,00		-		4,00	1.483,10	5.932,40	-		-	5.932,40	-
05	PARQUE INFANTIL				-		-		33.820,59	-		-	33.820,59	-
05.001	SERVIÇOS				-		-			-		-		-
05.001.001	Brinquedo - Tolem Manilhas com pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Oria Atalaia Nova	un	1,00		-		1,00	7.156,36	7.156,36	-		-	7.156,36	-
05.001.002	Brinquedo - Trem com manilhas de concreto, c/pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Oria Atalaia Nova	un	1,00		-		1,00	5.019,40	5.019,40	-		-	5.019,40	-
05.001.003	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas	un	1,00		-		1,00	6.066,67	6.066,67	-		-	6.066,67	-
05.001.004	Brinquedo - Escorregadeira com manilha em concreto e piso granito cinza andorinha, c/pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Oria Atalaia Nova	un	1,00		-		1,00	6.117,25	6.117,25	-		-	6.117,25	-
05.001.005	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergapark ou similar	un	1,00		-		1,00	4.664,53	4.664,53	-		-	4.664,53	-
05.001.006	Brinquedo - Labirinto (trepá-trepá) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical.	Un	1,00		-		1,00	4.796,38	4.796,38	-		-	4.796,38	-
05	FRETE				-		-		7.230,59	-		-	7.230,59	-
06.001	Frete: Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m³	40,35		-		40,35	2,49	100,48	-		-	100,48	-
06.002	Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m³	5,67		-		5,67	30,73	174,34	-		-	174,34	-
06.003	Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m³	16,72		-		16,72	25,94	433,71	-		-	433,71	-
06.004	Frete: Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	91,24		-		91,24	71,48	6.522,06	-		-	6.522,06	-
TOTAL:					91,24		91,24		1.389.046,13				212.576,25	15,30%
													1.176.463,88	84,70%
													15.30%	

PERCENTUAL			AUTENTICAÇÃO		
ASSINATURA EMPRESA			FISCAL DO CONTRATO		
ATESTO QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTE BME FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM, FISCAL DO CONTRATO Nº. 76/2024, EM PERFEITA ORDEM.					
_____ ASSINATURA DA EMPRESA					

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 27197661-2

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2

		J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA RUA (A) 75 CONJ. ARTHUR BISPO CENTRO JAPARATUBA-SE CNPJ : 05.325.864/0001-05									
MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO											
OBJETO:		CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03									
ORDEM DE SERVIÇO:		04/07/2024									
CONTRATO:		76/2024									
PERÍODO DE CONTRATO:		06 meses									
BOLETIM DE MEDIÇÃO:		Nº 01									
PERÍODO DE MEDIÇÃO:		04/07/2024 a 31/07/2024									
DATA:		01/08/2024									
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		X		Y		Z		TOTAL	UNID	
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
01.001	Equipe Dirigente	un	1,00			x		=	0,148	un	
02	CONSTRUÇÃO DA ORLA - TRECHO 003										
02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES										
02.001.002	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00		3,00	m	x	2,00	m	= 6,00 un	
02.001.003	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	7.000,00		151,00		x	46,3576	un	= 7.000,00 m2	
02.001.004	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00					=	1,00	UN	
02.001.005	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00					=	1,00	un	
02.001.006	Locação de container - Almoarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	10,00					=	1,00	mês	
02.001.006.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	150,00		172,80	m	x	0,48 x 1,1	m	= 91,24 m3	
02.002	CICLOVIA										
02.002.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	600,00		240,00	m	x	2,50	m	= 600,00 m2	
02.002.002	Melo-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	600,00					=	600,00	m	
02.002.003	Pintura de melo fio (calçada)	m	600,00					=	-	m	
02.002.004	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	300,00		642,86		x	0,35	un	= 225,00 m3	
02.002.005	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, despolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m2	600,00		120,00	m	x	2,50	m	= 300,00 m2	
02.002.006	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples	m2	600,00				x		un	= - m2	
02.002.006.001	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	600,00				x		un	= - m2	
02.003	ESTACIONAMENTO										
02.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	240,00		96,00	m	x	2,50	m	= 240,00 m2	
02.004	PASSEIO EM CONCRETO CINZA										
02.005	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
02.006	PAISAGISMO										
02.007	DIVERSOS										
03	CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS DE VOLEI										
03.001	QUADRA DE VOLEI DE AREIA										
03.001.011	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	150,00		128,57		x	0,35	un	= 45,00 m3	
04	CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER										
04.001	CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER										
05	PARQUE INFANTIL										
05.001	SERVIÇOS										
06	FRETE										
06.004	Frete: Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	91,24						91,24	m3	


Alex Sandro Rodrigues dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-SE nº 271563673-2

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)

 RESPONSÁVEL FISCAL DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)


Manoel Messias Soares Neto
 Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

ORDEM DE SERVIÇO

**VIGÊNCIA:
07/05/2024**

CONTRATO: Nº _76/2024

**OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA
NOVA ETAPA DA ORLA , DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU, SERGIPE "**

PRAZO DO CONTRATO: 12 meses

PRAZO DA OBRA: 06 meses

DATA DO CONTRATO: 07 de Maio de 2024

RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONTRATADA: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Tendo em vista o instrumento contratual acima descrito, celebrado com esta Prefeitura, fica Vossa Senhoria cientificado de que o prazo para início dos serviços objeto do contrato começará a partir de 04/07/2024.

Outrossim, informamos que foi designado pela Prefeitura Municipal de Pirambu, o engenheiro Manoel Messias Soares Neto, para fiscalização dos serviços.

Pirambu, 03 de Julho de 2024



Prefeitura de Pirambu
Guilherme Jullius Zacarias de Melo
PREFEITO

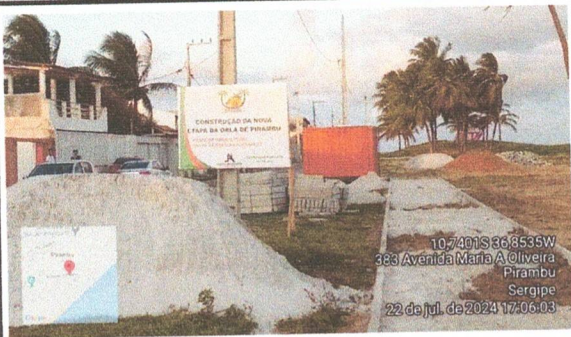
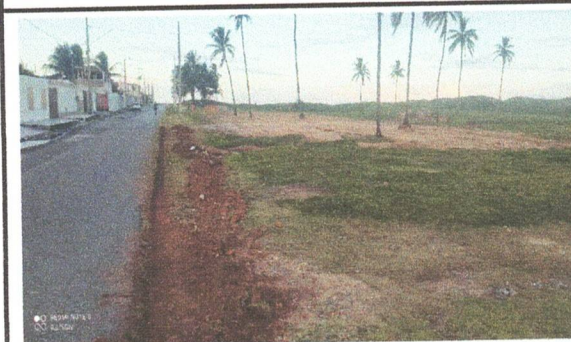
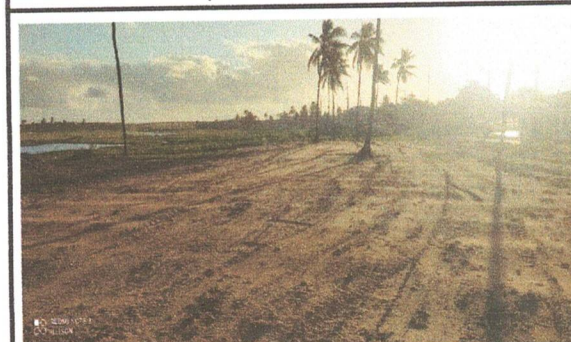
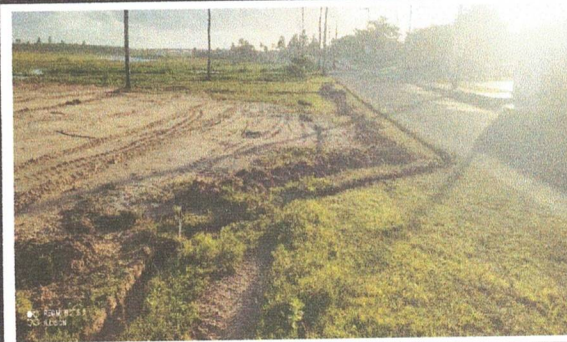
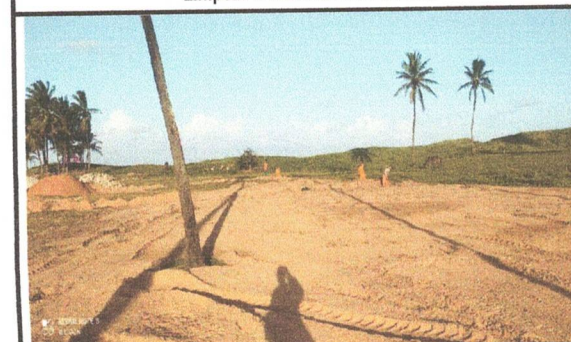
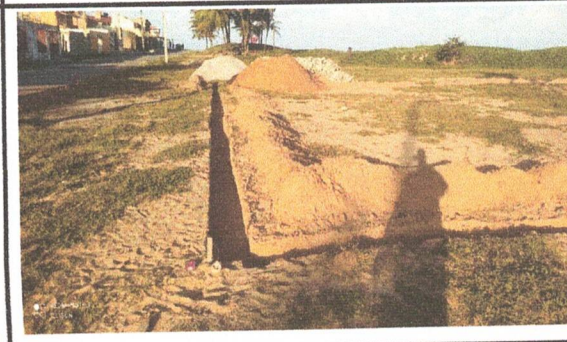
CIENTE:

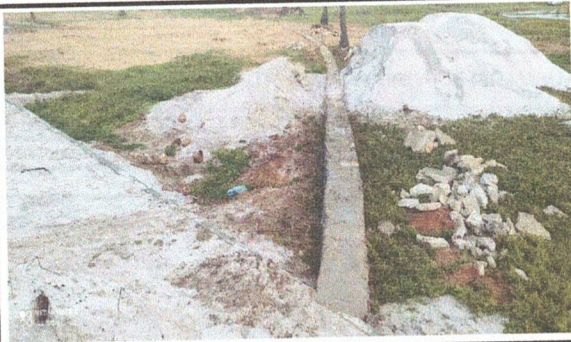
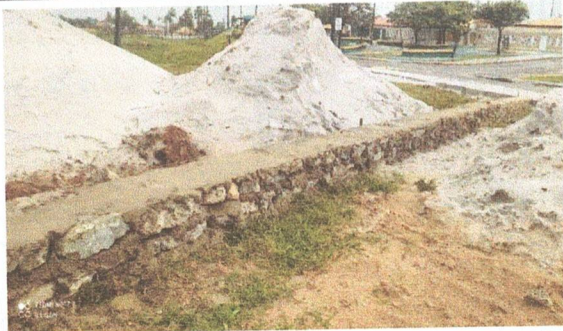
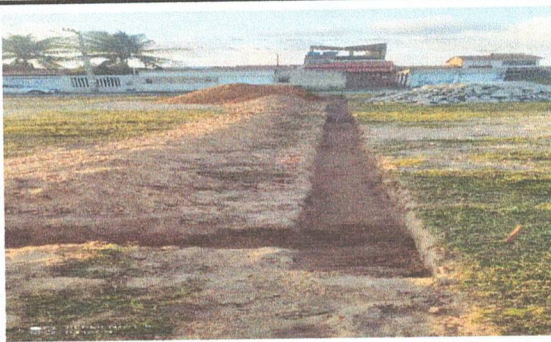
Engº Fiscal:

Firma Contratada:

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16 – Centro – Pirambu – Sergipe – CEP: 49.190-000
CNPJ. 13.095.039/0001-81


Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03		
Contratada:	J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA		
Contratante:	MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE		
REGISTRO FOTOGRÁFICO - BM 01			
REF. BM: 01	Período : 04/07/2024 à 31/07/2024		CONTRATO Nº76/2024 PMJ
			
Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m		Limpeza mecanizada do terreno	
			
Limpeza mecanizada do terreno		Limpeza mecanizada do terreno	
			
Limpeza mecanizada do terreno		Limpeza mecanizada do terreno	
			
Limpeza mecanizada do terreno		Escavação _alvenaria de pedra	

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03		 PROJECT ENGENHARIA LTDA
Contratada:	J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA		
Contratante:	MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE		
REGISTRO FOTOGRÁFICO - BM 01			
REF. BM: 01	Período : 04/07/2024 à 31/07/2024		CONTRATO N°76/2024 PMJ
			
Alvenaria de pedra		Alvenaria de pedra	
			
Alvenaria de pedra		Alvenaria de pedra	
			
Alvenaria de pedra		Alvenaria de pedra	
			
10°40'08.868526W 48°51'08.868526W Pirambu Sergipe 16 de jul. de 2024 10:15:37		10°40'08.868526W 48°51'08.868526W Pirambu Sergipe 16 de jul. de 2024 10:15:37	
Locação de serviços de pavimentação		Locação de serviços de pavimentação	

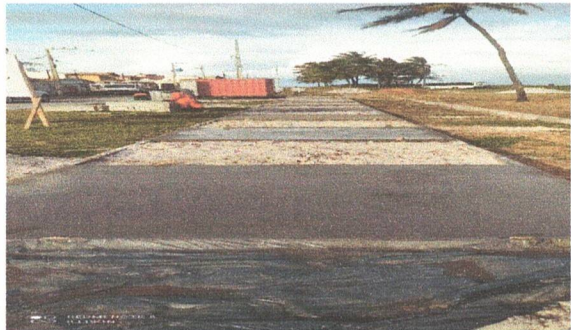

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-SE nº 271563675-2


Manoel Messias Soares Neto
 Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03		
Contratada:	J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA		
Contratante:	MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE		
REGISTRO FOTOGRÁFICO - BM 01			
REF. BM: 01	Período : 04/07/2024 à 31/07/2024		CONTRATO Nº76/2024 PMJ
			
Locação de serviços de pavimentação		Locação de serviços de pavimentação	
			
Locação de serviços de pavimentação		Aterro de caixão	
			
Aterro de caixão		Aterro de caixão	
			
Aterro de caixão		Aterro de caixão	


Alex Sandro Rodrigues dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-SE nº 271563679-2


Manoel Messias Soares Neto
 Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03		
Contratada:	J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA		
Contratante:	MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE		
REGISTRO FOTOGRÁFICO - BM 01			
REF. BM: 01	Período : 04/07/2024 à 31/07/2024		CONTRATO Nº76/2024 PMJ
			
Pavimentação em concreto		Pavimentação em concreto	
			
Pavimentação em concreto		Pavimentação em concreto	
			
Pavimentação em concreto		Pavimentação em concreto	
FISCALIZAÇÃO ASSINATURA DA EMPRESA			


Alex Sandro Rodrigues dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-SE nº 271563079-2


Manoel Messias Soares Neto
 Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU - CONTRATO Nº 76/2024

Contratante: PREFEITURA DE PIRAMBU

Contratada: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Ordem de Serviço: 04/07/2024

Periodo da medição: 04/07/2024 à 31/07/2024

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			quinta-feira, 4 de julho de 2024		
CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU - CONTRATO Nº 76/2024					
CONTRATADA : J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda					
CONTRATANTE : PREFEITURA DE PIRAMBU					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	1 dias
Prazo da Obra		180 dias		Restantes	179 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:		
Equipam.	Betoneira estacionária = 01				
	Serra manual =02				
	Carro de mão =04				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	0	Motorista / Operador	-	
	Mestre de Obras/ Encarregado	0	Topografo	-	
	Calceteiro	0	Eletricista		
	Pedreiro	0	Pintor	-	
	Armador	0	Carpinteiro	-	
	Servente	0	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Assinatura da ordem de serviços				
Anotação da Fiscalização					
	 Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:		
	 Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 27197661 - 2				

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				sexta-feira, 5 de julho de 2024	
CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU - CONTRATO Nº 76/2024					
CONTRATADA : J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda					
CONTRATANTE : PREFEITURA DE PIRAMBU					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	2 dias
Prazo da Obra		180 dias		Restantes	178 dias
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária = 01				
	Serra manual =02				
	Carro de mão =04				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro	-	Eletricista	0	
	Pedreiro	2	Pintor	-	
	Armador	-	Carpinteiro	-	
	Servente	2	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Limpeza da área				
Anotação da Fiscalização					
	Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2				
Vistos	Fiscalização:			Contratada:	
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2				

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			sábado, 6 de julho de 2024	
CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU - CONTRATO Nº 76/2024				
CONTRATADA : J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda				
CONTRATANTE : PREFEITURA DE PIRAMBU				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 3 dias
Prazo da Obra		180 dias		Restantes 177 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária = 01			
	Serra manual =02			
	Carro de mão =04			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	0
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	2	Gesseiro	-
Serviços Executados	Limpeza da área			
Anotação da Fiscalização				
	Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2			
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2			

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			domingo, 7 de julho de 2024		
CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU - CONTRATO Nº 76/2024					
CONTRATADA : J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda					
CONTRATANTE : PREFEITURA DE PIRAMBU					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 4 dias	
Prazo da Obra		180 dias		Restantes 176 dias	
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:		
Equipam.					
Pessoal	Descrição		Descrição		Quant.
	Engenheiro		Motorista / Operador		-
	Mestre de Obras/ Encarregado		Topografo		-
	Calceteiro		-	Eletricista	
	Pedreiro			Pintor	-
	Armador		-	Carpinteiro	-
	Servente			Gesseiro	-
Serviços Executados	Sem atividades				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:		Contratada:		
	 Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271197661 - 7		 Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			segunda-feira, 8 de julho de 2024		
CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU - CONTRATO Nº 76/2024					
CONTRATADA : J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda					
CONTRATANTE : PREFEITURA DE PIRAMBU					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	5 dias
Prazo da Obra		180 dias		Restantes	175 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:		
Equipam.	Betoneira estacionária = 01				
	Serra manual =02				
	Carro de mão =04				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro	-	Eletricista	0	
	Pedreiro	2	Pintor	-	
	Armador	-	Carpinteiro	-	
	Servente	2	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Locação de serviços				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:		Contratada:		

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN nº 271797661-2

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			terça-feira, 9 de julho de 2024	
CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU - CONTRATO Nº 76/2024				
CONTRATADA : J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda				
CONTRATANTE : PREFEITURA DE PIRAMBU				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 6 dias
Prazo da Obra		180 dias		Restantes 174 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária = 01			
	Serra manual =02			
	Carro de mão =04			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	0
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	2	Gesseiro	-
Serviços Executados	Locação de serviços			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	 Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2		 Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			quinta-feira, 11 de julho de 2024	
CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU - CONTRATO Nº 76/2024				
CONTRATADA : J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda				
CONTRATANTE : PREFEITURA DE PIRAMBU				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 8 dias
Prazo da Obra		180 dias		Restantes 172 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária = 01			
	Serra manual =02			
	Carro de mão =04			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	0
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	2	Gesseiro	-
Serviços Executados	Escavação de valas e alvenaria de pedra			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	 Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2		 Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563673-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			sexta-feira, 12 de julho de 2024	
CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU - CONTRATO Nº 76/2024				
CONTRATADA : J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda				
CONTRATANTE : PREFEITURA DE PIRAMBU				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 9 dias
Prazo da Obra		180 dias		Restantes 171 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária = 01			
	Serra manual =02			
	Carro de mão =04			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	0
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	2	Gesseiro	-
Serviços Executados	Escavação de valas e alvenaria de pedra			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	 Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2		 Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			sábado, 13 de julho de 2024		
CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU - CONTRATO Nº 76/2024					
CONTRATADA : J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda					
CONTRATANTE : PREFEITURA DE PIRAMBU					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 10 dias	
Prazo da Obra		180 dias		Restantes 170 dias	
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:		
Equipam.	Betoneira estacionária				
	Serra manual				
	Carro de mão				
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro			Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado			Topografo	-
	Calceteiro		-	Eletricista	
	Pedreiro			Pintor	-
	Armador		-	Carpinteiro	-
	Servente			Gesseiro	-
Serviços Executados	Não houve atividades				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:		Contratada:		
	 Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2		 Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			domingo, 14 de julho de 2024		
CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU - CONTRATO Nº 76/2024					
CONTRATADA : J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda					
CONTRATANTE : PREFEITURA DE PIRAMBU					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 11 dias	
Prazo da Obra		180 dias		Restantes 169 dias	
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:		
Equipam.	Betoneira estacionária				
	Serra manual				
	Carro de mão				
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro			Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado			Topografo	-
	Calceteiro		-	Eletricista	
	Pedreiro			Pintor	-
	Armador		-	Carpinteiro	-
	Servente			Gesseiro	-
Serviços Executados	Sem houve atividades				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:		Contratada:		
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			segunda-feira, 15 de julho de 2024	
CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU - CONTRATO Nº 76/2024				
CONTRATADA : J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda				
CONTRATANTE : PREFEITURA DE PIRAMBU				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00	Corridos	12 dias
Prazo da Obra		180 dias	Restantes	168 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária = 01			
	Serra manual =02			
	Carro de mão =04			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	2	Gesseiro	-
Serviços Executados	Alvenaria de pedra			
	Aterro de caixão			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	 Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2		 Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			terça-feira, 16 de julho de 2024	
CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU - CONTRATO Nº 76/2024				
CONTRATADA : J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda				
CONTRATANTE : PREFEITURA DE PIRAMBU				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 13 dias
Prazo da Obra		180 dias		Restantes 167 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária = 01			
	Serra manual =02			
	Carro de mão =04			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	2	Gesseiro	-
Serviços Executados	Alvenaria de pedra			
	Aterro de caixão			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	 Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2		 Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			quarta-feira, 17 de julho de 2024	
CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU - CONTRATO Nº 76/2024				
CONTRATADA : J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda				
CONTRATANTE : PREFEITURA DE PIRAMBU				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 14 dias
Prazo da Obra		180 dias		Restantes 166 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária = 01			
	Serra manual =02			
	Carro de mão =04			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	2	Gesseiro	-
Serviços Executados	Alvenaria de pedra			
	Aterro de caixão			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	 Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2		 Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			quinta-feira, 18 de julho de 2024	
CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU - CONTRATO Nº 76/2024				
CONTRATADA : J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda				
CONTRATANTE : PREFEITURA DE PIRAMBU				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 15 dias
Prazo da Obra		180 dias		Restantes 165 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária = 01			
	Serra manual =02			
	Carro de mão =04			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	2	Gesseiro	-
Serviços Executados	Alvenaria de pedra			
	Aterro de caixão			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	 Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2		 Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			sexta-feira, 19 de julho de 2024		
CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU - CONTRATO Nº 76/2024					
CONTRATADA : J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda					
CONTRATANTE : PREFEITURA DE PIRAMBU					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	16 dias
Prazo da Obra		180 dias		Restantes	164 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:		
Equipam.	Betoneira estacionária = 01				
	Serra manual =02				
	Carro de mão =04				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro	-	Eletricista		
	Pedreiro	2	Pintor	-	
	Armador	-	Carpinteiro	-	
	Servente	2	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Alvenaria de pedra				
	Aterro de caixão				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:		Contratada:		
	 Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2		 Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			sábado, 20 de julho de 2024	
CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU - CONTRATO Nº 76/2024				
CONTRATADA : J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda				
CONTRATANTE : PREFEITURA DE PIRAMBU				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 17 dias
Prazo da Obra		180 dias		Restantes 163 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária = 01			
	Serra manual =02			
	Carro de mão =04			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	2	Gesseiro	-
Serviços Executados	Alvenaria de pedra			
	Aterro de caixão			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	 Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2		 Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271553674-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			domingo, 21 de julho de 2024	
CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU - CONTRATO Nº 76/2024				
CONTRATADA : J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda				
CONTRATANTE : PREFEITURA DE PIRAMBU				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 18 dias
Prazo da Obra		180 dias		Restantes 162 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro		Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado		Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	
	Pedreiro		Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente		Gesseiro	-
Serviços Executados	Sem atividades			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	 Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2		 Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-GE nº 271500764	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			segunda-feira, 22 de julho de 2024	
CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU - CONTRATO Nº 76/2024				
CONTRATADA : J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda				
CONTRATANTE : PREFEITURA DE PIRAMBU				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 19 dias
Prazo da Obra		180 dias		Restantes 161 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária = 01			
	Serra manual =02			
	Carro de mão =04			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	2	Gesseiro	-
Serviços Executados	Alvenaria de pedra			
	Aterro de caixaõ			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	 Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2		 Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			terça-feira, 23 de julho de 2024	
CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU - CONTRATO Nº 76/2024				
CONTRATADA : J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda				
CONTRATANTE : PREFEITURA DE PIRAMBU				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 20 dias
Prazo da Obra		180 dias		Restantes 160 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária = 01			
	Serra manual =02			
	Carro de mão =04			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	2	Gesseiro	-
Serviços Executados	Alvenaria de pedra			
	Aterro de caixão			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	 Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2		 Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			quarta-feira, 24 de julho de 2024	
CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU - CONTRATO Nº 76/2024				
CONTRATADA : J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda				
CONTRATANTE : PREFEITURA DE PIRAMBU				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 21 dias
Prazo da Obra		180 dias		Restantes 159 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária = 01			
	Serra manual =02			
	Carro de mão =04			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	2	Gesseiro	-
Serviços Executados	Alvenaria de pedra			
	Aterro de caixão			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			quinta-feira, 25 de julho de 2024	
CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU - CONTRATO Nº 76/2024				
CONTRATADA : J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda				
CONTRATANTE : PREFEITURA DE PIRAMBU				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 22 dias
Prazo da Obra		180 dias		Restantes 158 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária = 01			
	Serra manual =02			
	Carro de mão =04			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	2	Gesseiro	-
Serviços Executados	Alvenaria de pedra			
	Aterro de caixaõ			
	Piso em concreto			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	 Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2		 Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			sexta-feira, 26 de julho de 2024	
CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU - CONTRATO Nº 76/2024				
CONTRATADA : J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda				
CONTRATANTE : PREFEITURA DE PIRAMBU				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 23 dias
Prazo da Obra		180 dias		Restantes 157 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária = 01			
	Serra manual =02			
	Carro de mão =04			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	2	Gesseiro	-
Serviços Executados	Alvenaria de pedra			
	Aterro de caixaõ			
	Piso em concreto			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	 Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2		 Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563678-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

sábado, 27 de julho de 2024

CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU - CONTRATO Nº 76/2024

CONTRATADA : J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda



CONTRATANTE : PREFEITURA DE PIRAMBU

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:

07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Corridos

24 dias

Prazo da Obra

180 dias

Restantes

156 dias

Manhã: Boa. / Tarde:

Condições Climáticas:

Equipam.

Betoneira estacionária = 01

Serra manual = 02

Carro de mão = 04

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Motorista / Operador

-

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Topógrafo

-

Calceteiro

-

Eletricista

-

Pedreiro

2

Pintor

-

Armador

-

Carpinteiro

-

Servente

2

Gesseiro

-

Serviços Executados

Alvenaria de pedra

Aterro de caixão

Piso em concreto

Anotação da Fiscalização

Fiscalização:

Contratada:

Vistos

Manoel Massias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				terça-feira, 30 de julho de 2024		
CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU - CONTRATO Nº 76/2024						
CONTRATADA : J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda						
CONTRATANTE : PREFEITURA DE PIRAMBU						
DADOS DO DIA E DA OBRA						
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	27 dias	
Prazo da Obra		180 dias		Restantes	153 dias	
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde:		
Equipam.	Betoneira estacionária = 01					
	Serra manual =02					
	Carro de mão =04					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		1	Motorista / Operador		-
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Topografo		-
	Calceteiro		-	Eletricista		
	Pedreiro		2	Pintor		-
	Armador		-	Carpinteiro		-
	Servente		2	Gesseiro		-
Serviços Executados	Alvenaria de pedra					
	Aterro de caixão					
	Piso em concreto					
Anotação da Fiscalização						
Vistos	Fiscalização:			Contratada:		
	 Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2			 Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				quarta-feira, 31 de julho de 2024		
CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU - CONTRATO Nº 76/2024						
CONTRATADA : J A PROJECT & ENGENHARIA Ltda						
CONTRATANTE : PREFEITURA DE PIRAMBU						
DADOS DO DIA E DA OBRA						
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	28 dias	
Prazo da Obra		180 dias		Restantes	152 dias	
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde:		
Equipam.	Betoneira estacionária = 01					
	Serra manual =02					
	Carro de mão =04					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		1	Motorista / Operador		-
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Topografo		-
	Calceteiro		-	Eletricista		0
	Pedreiro		2	Pintor		-
	Armador		-	Carpinteiro		-
	Servente		2	Gesseiro		-
Serviços Executados	Alvenaria de pedra					
	Aterro de caixão					
	Piso em concreto					
Anotação da Fiscalização						
Vistos	Fiscalização:			Contratada:		
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2			Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2		



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 476414/2024
Emissão: 12/08/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: BADCA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Registro: 2715636792

CPF: 995.***-**-68

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 29/07/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE TIRADENTES

Data de Formação: 21/07/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000003307

CNPJ: 05.325.864/0001-05

Data Início: 10/04/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 476415/2024

Emissão: 12/08/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 18A1x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 05.325.864/0001-05

Registro: 0000003307

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 10/04/2019

Faixa: 2

Objetivo Social Pleno: CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DE QUALQUER TIPO, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS OLÍMPICAS E OUTRAS CONSTRUÇÕES SIMILARES; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, GESTÃO DE ATERROS SANITÁRIOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DO RESÍDUOS PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL E ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E RODAGENS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; ATIVIDADES DE CONSULTORIA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA; OS SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTE DE TELECOMUNICAÇÕES - SRTI; ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES MOVEIS, PARA PROMOVA A TRANSMISSÃO DE VOZ, DADOS E IMAGEM; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO E DE DIAGRAMAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO DOMÉSTICO OU INDUSTRIAL E DE ÁGUAS PLUVIAIS POR MEIO DE REDES DE COLETORES, TANQUES E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, RODOVIAS, FERROVIAS E PORTOS; USINAS DE COMPOSTAGEM; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETEAMENTO, MUNICIPAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL (NÃO ESPECIALIZADA) DE PRÉDIOS DE QUALQUER TIPO: RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, FÁBRICAS, ARMAZÉNS, HOSPITAIS, PRÉDIOS PÚBLICOS E OUTROS PRÉDIOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA CORNO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, LIMPEZA DE RUAS; CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AUTO - ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NÃO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA: AS ATIVIDADES DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL SÃO: CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DE QUALQUER TIPO, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS OLÍMPICAS E OUTRAS CONSTRUÇÕES SIMILARES; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, GESTÃO DE ATERROS SANITÁRIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL E ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E URBANISMO; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E RODAGENS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA CIVIL; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES EM BAIXA TENSÃO; COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO DOMÉSTICO OU INDUSTRIAL E DE ÁGUAS PLUVIAIS POR MEIO DE REDES DE COLETORES, TANQUES E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODESIA; USINAS DE COMPOSTAGEM; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; LIMPEZA DE RUAS; CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AUTO - ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NÃO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS.

Endereço Matriz: RUA A, 75, LOT. ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO, CENTRO, JAPARATUBA, SE, 49960000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 26/05/2003

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000002659EMSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais co





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 476415/2024

Emissão: 12/08/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 18A1x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

quadro técnico.

- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Registro: 2715636792

CPF: 995.***.***-68

Data Início: 10/04/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240390999

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2715636792
 Registro: 2715636792SE

Empresa contratada: **J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA**

Registro : 0000003307-SE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE PIRAMBU ESTADO DE SERGIPE**
PRAÇA Praça dos Esportes
 Complemento:
 Cidade: **PIRAMBU**

Bairro: **CENTRO**
 UF: **SE**

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81
 Nº: 75
 CEP: 49190000

Contrato: 76/2024

Celebrado em: 07/05/2024

Valor: R\$ 1.389.046,13

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Calamidade Pública**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA Praça dos Esportes
 Complemento:
 Cidade: **PIRAMBU**
 Data de Início: 04/07/2024
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **MUNICÍPIO DE PIRAMBU ESTADO DE SERGIPE**

Previsão de término: 31/12/2024

Bairro: **CENTRO**
 UF: **SE**

Nº: 75

CEP: 49190000

Coordenadas Geográficas: -10.701820, -36.861510

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA	240,00	m3
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS	3.300,00	m2
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	3.300,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES	244,00	m2
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO	1.460,00	m3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03, CONTRATO Nº 76/2024, PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA/SE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

ABENC/SE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS DE SERGIPE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 995.239.735-68

Local

data

MUNICÍPIO DE PIRAMBU ESTADO DE SERGIPE - CNPJ: 13.095.039/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YdDCZ
 Impresso em: 19/07/2024 às 10:35:01 por: , ip: 45.161.179.118

www.crea-se.org.br
 Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br
 Fax: XXXX-XXXX



CREA-SE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia de Sergipe





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240390999

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 262,55**

Registrada em: **18/07/2024**

Valor pago: **R\$ 262,55**

Nosso Número: **8203225409**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YdDCZ
 Impresso em: 19/07/2024 às 10:35:01 por: , ip: 45.161.179.118

www.crea-se.org.br
 Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br
 Fax: XXXX-XXXX



CREA-SE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia de Sergipe





CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.020.27538/76	Nome da obra J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA	Data do cadastramento 01/08/2024 15:54
Origem do cadastramento e-CAC		
Tipo Zona Zona Urbana	ART Nº SE20240390999	RRT CIB Cadastro Imobiliário S/N
Data do início da obra 04/07/2024	CNAE 4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas	

Situação da obra

Situação Ativa	Data 04/07/2024
-------------------	--------------------

Endereço

País BRASIL	Município PIRAMBU	UF SE	CEP 49.190-000
Bairro CENTRO	Logradouro AVENIDA MARIA A OLIVEIRA	Número S/N	

Responsável

Nome J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ 05.325.864/0001-05	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 04/07/2024	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
13.095.039/0001-81	MUNICIPIO DE PIRAMBU

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Residencial multifamiliar	Alvenaria	100,00 m²

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Residencial multifamiliar	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	20,00 m²	250,00 m²	270,00 m²
Obra Nova	Edifício de Garagens	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	15,00 m²	50,00 m²	65,00 m²

Área Resultante



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Japaratuba

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão Nº
3722024

C.M.C
0533

Em cumprimento à solicitação do requerente, com as características acima e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito, que mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte.

CONTRIBUINTE

Código	Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ
3461	J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA	05.325.864/0001-05
Endereço	Complemento	
LOT RUA A LOT ARTHUR BISPO DO ROSARIO Nº 75		
Bairro	Cidade	UF
CENTRO	Japaratuba	SE

Data Emissão

11/07/2024

Data Validade

09/09/2024

IMPORTANTE

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<http://municipioonline.com.br/se/prefeitura/japaratuba>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: FDAC354A

quinta-feira, 11 de julho de 2024

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.325.864/0001-05

Razão

Social:

J A PROJECT E ENGENHARIA LTDA

Endereço: R A 75 LOT ARTHUR B DO ROS / CENTRO / JAPARATUBA /
SE / 49960-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/08/2024 a 06/09/2024 ✓

Certificação Número: 2024080806461225508499

Informação obtida em 12/08/2024 17:58:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.325.864/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:23:06 do dia 18/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/09/2024.

Código de controle da certidão: **9D53.AB7A.32F7.747F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 451271 / 2024

Identificação do Solicitante: 05.325.864/0001-05

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **05.325.864/0001-05** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **05.325.864/0001-05** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **12/08/2024 às 17:36:54**, válida até **11/09/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 12 de Agosto de 2024

Autenticação: 20240812BVAA2G



Declaração de Recolhimento do ICMS N. 451275 / 2024

Identificação do Solicitante: 05.325.864/0001-05

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **05.325.864/0001-05** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **05.325.864/0001-05** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **12/08/2024 às 17:40:13**, válida até **11/09/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 12 de Agosto de 2024

Autenticação: 20240812ATWLPS



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.325.864/0001-05

Certidão n°: 55266873/2024

Expedição: 12/08/2024, às 17:48:25

Validade: 08/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.325.864/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.
