



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4471 / 006 / 00672005-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PIRAMBU GABINETE PREFEITO
CPF/CNPJ:	13.095.039/0001-81

PAGO

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2206 / 00000007290-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	J A PROJECT E ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ:	05.325.864/0001-05
Valor:	R\$ 41.165,67
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONSTRUCAO DA NOVA E
Histórico:	

Data de débito:	09/12/2024
Data / Hora da operação:	09/12/2024 09:33:54

Código da operação:	00102665
Chave de segurança:	N4WKP6Z7R4G17SVK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4471 / 006 / 00672005-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PIRAMBU GABINETE PREFEITO
CPF/CNPJ:	13.095.039/0001-81

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2206 / 7290-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	J A PROJECT E ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ:	05.325.864/0001-05
Valor:	R\$ 41.165,67
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONSTRUCAO DA NOVA ETAPA
Histórico:	REFERENTE A CONSTRUCAO DA NOVA ETAPA DA ORLA

Data de débito:	09/12/2024
Data / Hora da autorização:	09/12/2024 09:11:29

Código da operação: 61794037

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Nº Processo
0001129

Nº Fila
1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

TERMO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 05.325.864/0001-05

Nome: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Endereço: R A

Bairro: CENTRO

E-mail: @

Compl: LOTE ARTHUR B DO ROSARIO

Cidade: Japaratuba

Telefone: (79)99003-449

UF: SE

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Conta:

EMPENHO	EMIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	FONTE
0812011	12/08/2024	1055.44905100-17063110	Global	17063110 - Transferência Especial da União

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A 1º TERMO DE APOSTILAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2024 E CONTRATO Nº 76/2024.

Documentação	
Nota Fiscal	09
Valor	R\$ 42.438,83
Emissão	28/11/2024
Horário de Entrega	06/12/2024 10:17:35

Para acompanhar o andamento do seu processo na fila pública, acesse o link abaixo:

<http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pirambu/fornecedor/filapagamento>

Cadastrado por: Santiago Santos Gois

Secretaria de Controle Interno

☒ Aprovado

☐ Reprovado

Obs. _____



MUNICÍPIO DE JAPARUTUBA

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento Tributário - Praça Padre Caio Tavares, N° 86, Centro - CEP: 49.960-000

- Telefone: (79) 3272-3216



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
28/11/2024 17:18:22

Período de Competência Município de Prestação do
11/2024 Serviço

Pirambu - SE

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte
(ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em
Pirambu

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia

J & A ENGENHARIA

CPF/CNPJ

05.325.864/0001-05

Inscrição Municipal

533

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

jcalex1@hotmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 9900-3449

Endereço

RUA A, LOT. ARTHUR BISPO DO ROSARIO, 75, Centro - CEP: 49960-000 - Japarutuba - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

CPF/CNPJ

13.095.039/0001-81

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3276-1375

E-mail

pmpirambu@hotmail.com

Endereço

Rua Givaldo Moura da Silva, 16 - Centro - CEP: 49190-000 - Pirambu - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
CNAE: 4213800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA ORLA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE.
VINCULADO AO CONTRATO N° 76/2024.

CONTRATO N° 76/2024

PERÍODO: 26/10/2024 à 25/11/2024

CNO: 90.020.27538/76

(ISS 2,00%) RETIDO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/06. Art. 18, § 5, inc.I PERTINENTE AO REGIME TRIBUTARIO (SIMPLES NACIONAL)

SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

BASE DE CALCULO PARA EFEITO DO ISS CONFORME CODIGO TRIBUTARIO MUNICIOIO DE PIRAMBU/SE:

CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PREFEITURA DE PIRAMBU/SE - MATERIAL 40%

CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PREFEITURA DE PIRAMBU/SE - MAO DE OBRA 60%

VALOR DO ISS A SER RETIDO CONFORME BASE DE CALCULO

DADOS BANCARIOS:

J A PROJECT ENG

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2206-3

CONTA CORRENTE: 7290-7

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
42.438,83	0,00	0,00	*****	4,2100
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	42.438,83	42.438,83

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 5.708,02 Federal e R\$ 2.121,94 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]

Visualizado em: 28/11/2024 17:20:31

Para validação desta NFSe acesse: <http://japarutubase.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 370 de 23 de abril de 2014.

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2

A

Prefeitura Municipal de Pirambu/SE

Praça Nossa Senhora de Lurdes, nº 16, Centro

Pirambu/SE

Assunto: ENCAMINHAMENTO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 PARA PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 76/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU.

FATURA

A EMPRESA J & A PROJECT E ENGENHARIA LTDA, a importância supra de R\$ **42.438,83** (quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos) referente ao pagamento do 5º Boletim de Medição, referente ao Contrato 76/2024, CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU.

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pirambu/SE a importância supra de R\$ **42.438,83 (quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos)** referente ao pagamento do 5º Boletim de Medição, referente ao Contrato 76/2024, CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAPA DA ORLA DE PIRAMBU. Em anexo.


Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme lei Federal Nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Banco do Brasil

Agência → : 2206-3

Conta Corrente: 7290-7

Japaratuba/SE, 29 de novembro de 2024



J A Project & Engenharia LTDA
Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Representante Legal

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03			BOLETIM DE MEDIÇÃO 05			CONTRATO Nº78/2024		
CONTRATADA: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA			CONTRATO			CONTRATO Nº78/2024		
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE			ORDEN DE SERVIÇO			Data da Medição: 29/11/2024		
			PERÍODO: 28/10/2024 à 28/11/2024					
			04/07/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/05/2024					
			07/0					

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03			BOLETIM DE MEDIÇÃO 05			CONTRATO N°78/2024								
CONTRATADA: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA			CONTRATO			PERÍODO: 28/10/2024 à 28/11/2024								
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE			ORDEM DE SERVIÇO			Data da Medição: 29/11/2024								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R\$)						
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unid.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
02.004.003	Pavimentação em concreto usinado, bomb. lançado e adensado, não armado, cor natural, desempenado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, regulariz. e compac. subleito, lama plástica, exceto juntas	m2	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	104,75	157.125,00	157.125,00	-	157.125,00	-	100,00
02.004.004	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabamento simples	m2	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	4,06	6.090,00	6.090,00	0,00	6.090,00	-	100,00
02.004.004.001	Pintura pl piso c/ aplicação de 2 demãos, tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	1.500,00	1.470,00	30,00	1.500,00	-	9,95	14.925,00	14.626,50	298,50	14.925,00	-	100,00
02.005.001	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=8,00m, d=148mm (base) e d=60mm (topo) ref.1008/B, incl base concreto	un	16,00	16,00	-	16,00	-	2.358,82	37.741,12	37.741,12	-	37.741,12	-	100,00
02.005.002	Luminária em LED modular para iluminação pública 40W, lentes em policarbonato, corpo em alumínio, pint. anti-oxidantes, grau de proteção IP67, IK03 (temp de cor 5000° K, IRC >=70%, v.uti 50.000 horas, linha Street-light da Ledstar-Lincocla ou similar	un	16,00	16,00	-	16,00	-	1.592,78	25.484,48	25.484,48	-	25.484,48	-	100,00
02.005.003	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	un	15,00	15,00	-	15,00	-	310,92	4.663,80	4.663,80	-	4.663,80	-	100,00
02.005.004	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diam = 40mm (1 1/4")	m	1.100,00	945,00	-	945,00	-	24,32	26.752,00	22.982,40	-	22.982,40	3.769,60	85,90
02.005.005	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	2,00	1,00	-	1,00	-	236,88	473,76	236,88	-	236,88	-	50,00
02.005.006	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noel	un	1,00	1,00	-	1,00	-	562,34	562,34	562,34	-	562,34	-	100,00
02.005.007	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 450/750V / 70°C	m	600,00	-	-	-	-	34,68	20.808,00	-	-	-	20.808,00	-
02.005.008	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 450/750V / 70°C	m	2.000,00	155,00	-	155,00	-	19,37	38.740,00	3.002,35	-	3.002,35	35.737,65	7,75
02.005.009	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/750V / 70°C	m	2.000,00	1.050,00	-	1.050,00	-	12,42	24.840,00	13.041,00	-	13.041,00	11.799,00	52,50
02.005.010	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europen - linha branca), 6SKA	un	5,00	-	-	-	-	631,75	3.158,75	30.028,30	7.312,70	37.341,00	-	100,00
02.006.001	PAISAGISMO Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	600,00	380,00	220,00	600,00	-	30,34	18.204,00	11.529,20	6.674,80	18.204,00	-	100,00
02.006.002	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	150,00	145,00	5,00	150,00	-	127,58	19.137,00	18.499,10	637,90	19.137,00	8.159,28	53,78
02.007.001	DIVERSOS Equipamento de grástica - Plancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e preenchido em madeira, ref. Siergipark ou similar	un	1,00	1,00	-	1,00	-	1.284,48	1.284,48	1.284,48	-	1.284,48	-	100,00
02.007.002	Equipamento de grástica - roda de oniro	un	1,00	1,00	-	1,00	-	2.108,96	2.108,96	2.108,96	-	2.108,96	-	100,00
02.007.003	Equipamento de grástica - simulador de caminhada duplo	un	1,00	1,00	-	1,00	-	5.080,84	5.080,84	5.080,84	-	5.080,84	-	100,00
02.007.004	Equipamento de grástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2". Siergipark ou similar	un	1,00	1,00	-	1,00	-	1.020,79	1.020,79	1.020,79	-	1.020,79	-	100,00
02.007.005	Marco lateral - Rev. 01	un	1,00	-	-	-	-	886,64	886,64	-	-	-	886,64	-
02.007.006	Conjunto com 05 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa azul e verde	un	6,00	-	-	-	-	1.210,44	7.262,64	139.231,98	(0,00)	139.231,98	5.672,94	96,08
03.001.001	CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS DE VOLEI Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	23,00	23,00	-	23,00	-	60,77	1.397,71	1.397,71	-	1.397,71	-	100,00
03.001.002	sem controle do grau de compactação	m3	4,00	4,00	-	4,00	-	40,51	162,04	162,04	-	162,04	-	100,00

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2

Manoel Múrias Soares Neto
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271197637-2

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

PROPOSTA DE ENGENHARIA LTDA

CONTRATADA: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

CONTRATO

07/05/2024

Período: 26/10/2024 à 26/11/2024

CONTRATO N°78/2024

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE

ORDEN DE SERVIÇO

04/07/2024

Data da Medição: 29/11/2024

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades					Valores (R\$)					% Medido		
		Unid	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unid.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período		Acumulado até o Período	Saldo a medir
03.001.003	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	10,00	10,00			-	696,67	6.966,70	6.966,70	-	6.966,70	-	100,00
03.001.004	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "U" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa	m	83,00	83,00			-	41,52	3.446,16	3.446,16	(0,00)	3.446,16	-	100,00
03.001.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, esp=9cm, com argamassa 1S - 1:2:8 (cimento/cal/sareia), junta=2cm Alumbrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwa, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m2	47,00	47,00			-	52,14	2.450,58	2.450,58	-	2.450,58	-	100,00
03.001.006	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	244,00	244,00	-	-	-	342,68	83.613,92	83.613,92	-	83.613,92	-	100,00
03.001.007		m2	188,00	188,00	-	-	-	7,77	1.460,76	1.460,76	-	1.460,76	-	100,00
03.001.008	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1S - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	188,00	188,00	-	-	-	39,77	7.476,76	7.476,76	-	7.476,76	-	100,00
03.001.009	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	188,00		-	-	188,00	18,12	3.406,56	-	-	-	3.406,56	-
03.001.010	Pintura de acabamento com fixamento aplicação de 01 demão de tinta a base de zinco e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	62,00		-	-	62,00	31,87	1.975,94	-	-	-	1.975,94	-
03.001.011	Aterro de áreas com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	150,00	150,00	-	-	-	206,45	30.967,50	30.967,50	-	30.967,50	-	100,00
03.001.012	Rede para vólei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00		-	-	1,00	290,44	290,44	-	-	-	290,44	-
03.001.013	Poste oficial para vólei em aço galvanizado d=3", c/estecedor e c/arraca	par	1,00	1,00	-	-	-	1.289,85	1.289,85	1.289,85	-	1.289,85	-	100,00
04	CONSTRUÇÃO DA AREA DE LAZER				-	-			261.460,94	224.749,09	31.682,09	256.731,18	4.729,66	98,19
04.001	CONSTRUÇÃO DA AREA DE LAZER				-	-			261.460,94	224.749,09	31.682,09	256.731,18	4.729,66	98,19
04.001.001	Localção de serviços de pavimentação	m2	1.200,00	1.200,00	-	-	-	1,67	2.004,00	2.004,00	-	2.004,00	-	100,00
04.001.002	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedreiros areia dim. 0 35x0 45x0 23m - Correção mecânica e transporte	m3	20,00	20,00	-	-	-	595,07	11.901,40	11.901,40	(0,00)	11.901,40	-	100,00
04.001.003	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	m2	30,00	30,00	-	-	-	52,48	1.574,70	1.574,70	-	1.574,70	-	100,00
04.001.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	45,00		-	-	45,00	18,12	815,40	-	-	-	815,40	-
04.001.005	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1,00), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2")	m	12,00		-	-	12,00	269,13	3.569,56	-	-	-	3.569,56	-
04.001.006	Pintura de acabamento com fixamento aplicação de 01 demão de tinta a base de zinco e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	10,00		-	-	10,00	31,87	318,70	-	-	-	318,70	-
04.001.007	Aterro de áreas com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	260,00	260,00	-	-	-	206,45	53.677,00	53.677,00	-	53.677,00	-	100,00
04.001.008	Canaleta impermeabilizadora, espessura = 5,0cm c/ concreto fck = 21mpa	m2	100,00	100,00	-	-	-	31,07	3.107,00	3.107,00	-	3.107,00	-	100,00
04.001.008.001	Pavimentação em concreto usinado, bom, lançado e adensado, não armado, cor natural, desmoldado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m2	1.200,00	1.157,00	43,00	-	-	104,75	126.700,00	121.195,75	4.504,25	126.700,00	-	100,00

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2

Manoel Medeiros Soares Neto
Engenheiro Civil, RN - nº 271797607-2

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03				BOLETIM DE MEDIÇÃO 05				CONTRATO Nº78/2024				
CONTRATADA: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				CONTRATO				PERÍODO: 26/10/2024 à 25/11/2024				
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE				ORDEN DE SERVIÇO				DATA DA MEDIÇÃO: 29/11/2024				
Item	Descrição dos Serviços	Unid	Quantidades			Valores (R\$)			% Medido			
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado		Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período
04.001.008.002	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim. 40 x 40cm	m2	24,00		24,00	-	190,63	4.575,12	-	4.575,12	-	100,00
04.001.008.003	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoamento em madeira e capoteamento 4cm	m2	100,00	24,00	76,00	100,00	158,93	15.893,00	3.814,32	12.078,68	-	100,00
04.001.008.004	Concreto simples usinado 18x21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	20,00	20,00	-	20,00	643,76	12.875,20	12.875,20	-	-	100,00
04.001.008.005	Pintura pl. piso e aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	9,95	11.940,00	5.970,00	5.970,00	-	100,00
04.002	Formeamento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h. útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação = 60x70x50cm	un	16,00	12,00	4,00	16,00	471,96	7.551,36	5.663,52	1.887,84	-	100,00
04.003	Mesa em concreto armado polido (c=1,60 f=0,80 e h=0,75mm), 2 bancos em concreto armado (c=1,40 f=0,40 e h=0,40mm), com pintura acrílica.	Un	4,00	2,00	2,00	4,00	1.483,10	5.932,40	2.966,20	2.966,20	-	100,00
05.001	PARQUE INFANTIL							33.820,59				
05.001.001	Brinquedo - Toleim Manilhas com pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Ola Alaiala Nova	un	1,00		-	-	7.156,36	7.156,36	-	-	-	-
05.001.002	Brinquedo - Trem com manilhas de concreto, pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Ola Alaiala Nova	un	1,00		-	-	5.019,40	5.019,40	-	-	-	-
05.001.003	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas	un	1,00		-	-	6.066,67	6.066,67	-	-	-	-
05.001.004	Brinquedo - Escorregadeira com manilha em concreto e piso granito cinza andorinha, pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Ola Alaiala Nova	un	1,00		-	-	6.117,25	6.117,25	-	-	-	-
05.001.005	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", serjapark ou similar	un	1,00		-	-	4.664,53	4.664,53	-	-	-	-
05.001.006	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical, Dim 1,5x41,5x42,04m, tel. Serjapark ou similar	Un	1,00		-	-	4.796,38	4.796,38	-	-	-	-
06	FRETE							7.230,59				
06.001	Frete, Área grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m²	40,35	40,35	-	40,35	2,49	100,48	100,48	(0,00)	-	100,00
06.002	Frete, Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m²	5,67	5,67	-	5,67	30,73	174,34	174,34	0,00	-	100,00
06.003	Frete, Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m²	16,72	16,72	-	16,72	25,94	433,71	433,71	0,00	-	100,00
06.004	Frete, Pedra de mão ou pedra rachão para armofundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	91,24	91,24	-	91,24	71,48	6.522,06	6.522,06	(0,00)	-	100,00
TOTAL:			91,24	91,24	-	91,24	71,48	1.389.046,13	1.204.171,82	42.438,83	89,74%	
ASSINATURA EMPRESA			PERCENTUAL			AUTENTICAÇÃO						
Assinatura de Alz Souto Rodrigues dos Santos Alz Souto Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 2715636/9-2 ASSINATURA DA EMPRESA			ATESTO QUE OS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTE BOM OS FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS POR MIM, FISCAL DO CONTRATO Nº. 78/2024, EM PERFEITA ORDEM.			Assinatura de Manoel Messias Soares Neto Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil CREA-SE nº 2715636/9-2 FISCAL DO CONTRATO						



J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA
RUA (A) 75 CONJ. ARTHUR BISPO CENTRO JAPARATUBA-SE
CNPJ : 05.325.864/0001-05

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03

ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2024

CONTRATO: 78/2024


PERÍODO DE CONTRATO: 06 meses

BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 05

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/10/2024 a 25/11/2024

DATA: 28/11/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		X	Y	Z	TOTAL	UNID
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
01.001	Equipe Dirigente	un	1,00		x	= 0,02955	un
02	CONSTRUÇÃO DA ORLA - TRECHO 003						
02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES						
02.001.006	Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	10,00			1,00	mês
02.002	CICLOVIA						
02.002.006.001	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	600,00	10,00	m x 5,00	m = 50,00	m2
02.003	ESTACIONAMENTO						
02.004	PASSEIO EM CONCRETO CINZA						
02.004.004.001	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	1.500,00	10,00	m x 3,00	m = 30,00	m2
02.005	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
02.006	PAISAGISMO						
02.006.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	600,00	10,00	m x 22,00	m = 220,00	m2
02.006.002	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	150,00	220,00	m x 0,02	m = 5,00	m3
02.007	DIVERSOS						
03	CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS DE VOLEI						
03.001	QUADRA DE VOLEI DE AREIA						
04	CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER						
04.001	CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER						
04.001.008.001	Pavimentação em concreto usinado, bombo, lançado e adensado, não armado, cor natural, despolado, fck = 21 MPa, s = 10 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m2	1.200,00	55,20	m x 2,50	m = 43,00	m2
04.001.008.002	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m2	24,00	55,20	m x 2,50	m = 24,00	m2
04.001.008.003	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	100,00	55,20	m x 2,50	m = 76,00	m2
04.001.008.005	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	1.200,00	240,00	m x 2,50	m = 600,00	m2
04.002	Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h. útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação = 60x70x50cm	un	16,00	1,00	unid x 4,00	qtde = 4,00	un
04.003	Mesa em concreto armado polido (c=1,60, l=0,80 e h=0,75mm), 2 bancos em concreto armado (c=1,40, l=0,40 e h=0,40mm), com pintura acrílica.	Un	4,00	1,00	unid x 4,00	qtde = 2,00	un
05	PARQUE INFANTIL						
05.001	SERVIÇOS						
06	FRETE						



Alex Sandro Kourugues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2


RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)



Manoel Márcio Soares Neto
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2

RESPONSÁVEL FISCAL DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)


OBRA;	CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03		
Contratada: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA			
Contratante: MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE			
REGISTRO FOTOGRÁFICO - BM 05			
REF. BM: 05	Período : 26/10/2024 à 25/11/2024		CONTRATO Nº76/2024 PMJ
			
			
			
			


 Alex Sandro Rodrigues dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-SE Nº 271563679-2


 Manoel Medeiros Soares Neto
 Engenheiro Civil ROR Nº 271737604-2

OBRA;	CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03		
Contratada: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA			
Contratante: MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE			
REGISTRO FOTOGRÁFICO - BM 05			
REF. BM: 05	Período : 26/10/2024 à 25/11/2024		CONTRATO Nº76/2024 PMJ
			
			
			
			


 Alex Sandro Rodrigues dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-SE nº 271563670-2


 Manoel Messias Soares Neto
 Engenheiro Civil - nº 271563670-2

OBRA;

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03



Contratada: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA



Contratante: MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE

REGISTRO FOTOGRÁFICO - BM 05

REF. BM: 05

Período : 26/10/2024 à 25/11/2024

CONTRATO Nº76/2024 PMJ

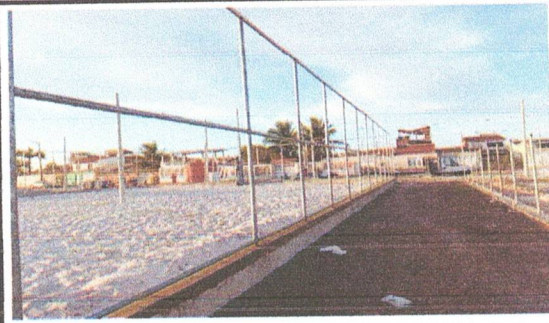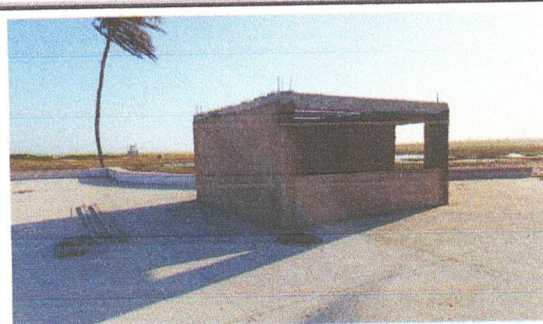

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - nº 271563679-2

FISCALIZAÇÃO

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2

ASSINATURA DA EMPRESA



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Informações da obra

Número de inscrição da obra	Nome da obra	Data do cadastramento		
90.020.27538/76	J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA	01/08/2024 15:54		
Origem do cadastramento				
e-CAC				
Tipo Zona	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Zona Urbana	Nº SE20240390999			S/N
Data do início da obra	CNAE			
04/07/2024	4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas			

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	04/07/2024

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	PIRAMBU	SE	49.190-000
Bairro	Logradouro	Número	
CENTRO	AVENIDA MARIA A OLIVEIRA	S/N	

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA	05.325.864/0001-05	Construtora
Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade	
04/07/2024		

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
13.095.039/0001-81	MUNICIPIO DE PIRAMBU

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Residencial multifamiliar	Alvenaria	100,00 m²

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Residencial multifamiliar	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	20,00 m²	250,00 m²	270,00 m²
Obra Nova	Edifício de Garagens	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	15,00 m²	50,00 m²	65,00 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra
435,00 m²



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240390999

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2715636792**

Registro: **2715636792SE**

Empresa contratada: **J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA**

Registro : **0000003307-SE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE PIRAMBU ESTADO DE SERGIPE**

CPF/CNPJ: **13.095.039/0001-81**

PRAÇA Praça dos Esportes

Nº: **75**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PIRAMBU**

UF: **SE**

CEP: **49190000**

Contrato: **76/2024**

Celebrado em: **07/05/2024**

Valor: **R\$ 1.389.046,13**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Calamidade Pública**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA Praça dos Esportes

Nº: **75**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PIRAMBU**

UF: **SE**

CEP: **49190000**

Data de Início: **04/07/2024**

Previsão de término: **31/12/2024**

Coordenadas Geográficas: **-10.701820, -36.861510**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE PIRAMBU ESTADO DE SERGIPE**

CPF/CNPJ: **13.095.039/0001-81**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA	240,00	m3
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS	3.300,00	m2
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	3.300,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES	244,00	m2
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO	1.460,00	m3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03, CONTRATO Nº 76/2024, PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA/SE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

ABENC/SE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS DE SERGIPE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 995.239.735-68

Local

data

MUNICÍPIO DE PIRAMBU ESTADO DE SERGIPE - CNPJ: 13.095.039/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YdDCZ
 Impresso em: 19/07/2024 às 10:35:01 por: , ip: 45.161.179.118

www.crea-se.org.br

Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br

Fax: XXXX-XXXX



CREA-SE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia de Sergipe





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240390999

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: R\$ 262,55

Registrada em: 18/07/2024

Valor pago: R\$ 262,55

Nosso Número: 8203225409

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YdDCZ
Impresso em: 19/07/2024 às 10:35:01 por: , ip: 45.161.179.118

www.crea-se.org.br
Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br
Fax: XXXX-XXXX



CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Sergipe





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 476415/2024

Emissão: 12/08/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 18A1x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 05.325.864/0001-05

Registro: 0000003307

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 10/04/2019

Faixa: 2

Objetivo Social Pleno: CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DE QUALQUER TIPO, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS OLÍMPICAS E OUTRAS CONSTRUÇÕES SIMILARES; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, GESTÃO DE ATERROS SANITÁRIOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DO RESÍDUOS PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL E ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E RODAGENS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; ATIVIDADES DE CONSULTORIA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA; OS SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTE DE TELECOMUNICAÇÕES - SRTI; ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES MOVEIS, PARA PROMOVA A TRANSMISSÃO DE VOZ, DADOS E IMAGEM; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO E DE DIAGRAMAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO DOMÉSTICO OU INDUSTRIAL E DE ÁGUAS PLUVIAIS POR MEIO DE REDES DE COLETORES, TANQUES E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS. RODOVIAS, FERROVIAS E PORTOS; USINAS DE COMPOSTAGEM; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL (NÃO ESPECIALIZADA) DE PRÉDIOS DE QUALQUER TIPO: RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, FÁBRICAS, ARMAZÉNS, HOSPITAIS, PRÉDIOS PÚBLICOS E OUTROS PRÉDIOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA CORNO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, LIMPEZA DE RUAS; CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AUTO - ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NÃO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA: AS ATIVIDADES DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL SÃO: CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DE QUALQUER TIPO, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS OLÍMPICAS E OUTRAS CONSTRUÇÕES SIMILARES; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, GESTÃO DE ATERROS SANITÁRIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL E ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E URBANISMO; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E RODAGENS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA CIVIL; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES EM BAIXA TENSÃO; COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO DOMÉSTICO OU INDUSTRIAL E DE ÁGUAS PLUVIAIS POR MEIO DE REDES DE COLETORES, TANQUES E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODESIA; USINAS DE COMPOSTAGEM; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; LIMPEZA DE RUAS; CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AUTO - ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NÃO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS.

Endereço Matriz: RUA A, 75, LOT. ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO, CENTRO, JAPARATUBA, SE, 49960000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 26/05/2003

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000002659EMSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais coi



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 18A1x

Impresso em: 12/08/2024 às 18:15:40 por: adapt, ip: 45.161.179.53



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 476415/2024

Emissão: 12/08/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 18A1x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

quadro técnico.

- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Registro: 2715636792

CPF: 995.***.***-68

Data Início: 10/04/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 476414/2024
Emissão: 12/08/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: BADCA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Registro: 2715636792

CPF: 995.***.***-68

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 29/07/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE TIRADENTES

Data de Formação: 21/07/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000003307

CNPJ: 05.325.864/0001-05

Data Início: 10/04/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.325.864/0001-05

Razão

J A PROJECT E ENGENHARIA LTDA

Social:

Endereço: R A 75 LOT ARTHUR B DO ROS / CENTRO / JAPARATUBA / SE / 49960-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/11/2024 a 29/12/2024

Certificação Número: 2024113002391225508489

Informação obtida em 06/12/2024 10:04:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Japaratuba

Certidão Nº
7022024

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

C.M.C
0533

Em cumprimento à solicitação do requerente, com as características acima e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, CERTIFICAMOS para fins de direito, que mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte.

CONTRIBUINTE

Código 3461	Nome ou Razão Social J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ 05.325.864/0001-05
Endereço LOT RUA A LOT ARTHUR BISPO DO ROSARIO Nº 75	Complemento	
Bairro CENTRO	Cidade Japaratuba	UF SE

Data Emissão

18/11/2024

Data Validade

17/01/2025

IMPORTANTE

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<http://municipioonline.com.br/se/prefeitura/japaratuba>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: C846FB5C

segunda-feira, 18 de novembro de 2024



Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 627341 / 2024

Identificação do Solicitante: 05.325.864/0001-05

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **05.325.864/0001-05** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **05.325.864/0001-05** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em 18/11/2024 às 22:08:20, válida até 18/12/2024[✓] deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 18 de Novembro de 2024

Autenticação: 20241118SHIDLM



Declaração de Recolhimento do ICMS N. 627343 / 2024

Identificação do Solicitante: 05.325.864/0001-05

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **05.325.864/0001-05** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **05.325.864/0001-05** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **18/11/2024 às 22:10:33**, válida até **18/12/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 18 de Novembro de 2024

Autenticação: **20241118HVXPQB**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.325.864/0001-05

Certidão n°: 55266873/2024

Expedição: 12/08/2024 às 17:48:25

Validade: 08/02/2025 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.325.864/0001-05, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.325.864/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:01:32 do dia 25/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/03/2025.

Código de controle da certidão: **2B6D.5345.668A.69C2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL RESULTADO: NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: J A Project & Engenharia LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica
Nome Fantasia: J&A Engenharia LTDA

CNPJ: 05.325.864/0001-05

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

- 1. Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.
- 2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
- 3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
- 4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
- 5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
- 6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão 2024.0212961 expedida automaticamente em 18/11/2024 e válida até 18/12/2024.

Código de Autenticidade nº 7885.4810.5596.6724.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.325.864/0001-05**

Opção pelo Simples Nacional/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS



Objeto:

**CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU -
TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024**

Contratante: MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

Contratada: J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

Ordem de Serviço: 04/07/2024

Período: 26/10/2024 à 25/11/2024

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

sábado, 26 de outubro de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024

J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho: 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 **Corridos** 118 dias

Prazo da Obra 150 dias **Restantes** 32 dias

Condições Climáticas:

Manhã: Boa. / Tarde:

Equipam.

Betoneira estacionária

Serra Manual

Policorte

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

Motorista / Operador

-

Mestre de Obras/ Encarregado

Topografo

-

Calceteiro

Eletricista

Pedreiro

Pintor

-

Armador

Carpinteiro

-

Servente

Gesseiro

-

Serviços Executados

Sem atividades

Anotação da Fiscalização

Vistos

Fiscalização:

Contratada:

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - Nº 271563679-2

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			domingo, 27 de outubro de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 119 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 31 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro		Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado		Topografo	-
	Calceteiro		Eletricista	
	Pedreiro		Pintor	-
	Armador		Carpinteiro	-
	Servente		Gesseiro	-
Serviços Executados	Sem atividades			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Manoel Assis das Soares Neto Engenheiro Civil - nº 271707001-2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

segunda-feira, 28 de outubro de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024



J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	120 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	30 dias
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde: Bom	
Equipam.	Betoneira estacionária				
	Serra Manual				
	Policorte				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro	-	Eletricista	0	
	Pedreiro	1	Pintor	-	
	Armador	-	Carpinteiro	-	
Servente	3	Gesseiro	-		
	Serviços diversos de piso, pintura de piso, elétrica				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:		Contratada:		
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil - nº 271707001-2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

terça-feira, 29 de outubro de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024

J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:

07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Corridos

121 dias

Prazo da Obra

150 dias

Restantes

29 dias

Condições Climáticas:

Manhã: Boa. / Tarde: Bom

Equipam.

Betoneira estacionária

Serra Manual

Policorte

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Motorista / Operador

-

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Topografo

-

Calceteiro

-

Eletricista

0

Pedreiro

1

Pintor

-

Armador

-

Carpinteiro

-

Servente

3

Gesseiro

-

Serviços Executados

Serviços diversos de piso, pintura de piso, elétrica

Anotação da Fiscalização

Vistos

Fiscalização:

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - nº 271757531-2

Contratada:

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563670-2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

quarta-feira, 30 de outubro de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024

J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:

07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Corridos

122 dias

Prazo da Obra

150 dias

Restantes

28 dias

Condições Climáticas:

Manhã: Boa. / Tarde: Bom

Equipam.

Betoneira estacionária

Serra Manual

Policorte

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Motorista / Operador

-

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Topografo

-

Calceteiro

-

Eletricista

0

Pedreiro

1

Pintor

-

Armador

-

Carpinteiro

-

Servente

3

Gesseiro

-

Serviços Executados

Serviços diversos de piso, pintura de piso, elétrica

Anotação da Fiscalização

Vistos

Fiscalização:

Contratada:

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797631 - 2

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

quinta-feira, 31 de outubro de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024

J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho: 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 **Corridos** 123 dias

Prazo da Obra 150 dias **Restantes** 27 dias

Condições Climáticas:

Manhã: Boa. / Tarde:

Equipam.

Betoneira estacionária

Serra Manual

Policorte

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Motorista / Operador

-

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Topografo

-

Calceteiro

-

Eletricista

0

Pedreiro

1

Pintor

-

Armador

-

Carpinteiro

-

Servente

3

Gesseiro

-

Serviços Executados

Serviços diversos de piso, pintura de piso, elétrica

Anotação da Fiscalização

Vistos

Fiscalização:

Contratada:

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil R.N. nº 271757331-2

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 27136974-2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

sexta-feira, 1 de novembro de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024



J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:

07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00

Corridos

124 dias

Prazo da Obra

150 dias

Restantes

26 dias

Condições Climáticas:

Manhã: Boa. / Tarde:

Equipam.

Betoneira estacionária

Serra Manual

Policorte

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Motorista / Operador

-

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Topografo

-

Calceteiro

-

Eletricista

0

Pedreiro

1

Pintor

-

Armador

-

Carpinteiro

-

Servente

3

Gesseiro

-

Serviços Executados

Serviços diversos de piso, pintura de piso, elétrica

Anotação da Fiscalização


Vistos

Fiscalização:

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - nº 271707001-2

Contratada:

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS		sábado, 2 de novembro de 2024		
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00	Corridos 125 dias	
Prazo da Obra		150 dias	Restantes 25 dias	
Condições Climáticas:		Manhã: Boa. / Tarde:		
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro		Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado		Topografo	-
	Calceteiro		Eletricista	
	Pedreiro		Pintor	-
	Armador		Carpinteiro	-
	Servente		Gesseiro	-
Serviços Executados	sem atividades			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	 Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil - CREA-SE nº 271797661-2		 Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			domingo, 3 de novembro de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 126 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 24 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro		Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado		Topografo	-
	Calceteiro		Eletricista	
	Pedreiro		Pintor	-
	Armador		Carpinteiro	-
	Servente		Gesseiro	-
Serviços Executados	sem atividades			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271757661 - 2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			segunda-feira, 4 de novembro de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 127 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 23 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	0
	Pedreiro	1	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	3	Gesseiro	-
Serviços Executados	Serviços diversos de piso, pintura de piso, elétrica			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil - N.º 271563679-2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			terça-feira, 5 de novembro de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 128 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 22 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	0
	Pedreiro	1	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
Servente	3	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Serviços diversos de piso, pintura de piso, elétrica			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil - nº 27171334-2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			quarta-feira, 6 de novembro de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 129 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 21 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	1
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	4	Gesseiro	-
Serviços Executados	Pintura de piso, instalação de equipamentos			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil nº 271563679-2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			quinta-feira, 7 de novembro de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 130 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 20 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	1
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	4	Gesseiro	-
Serviços Executados	Pintura de piso, instalação de equipamentos			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Manoel Mesias Soares Neto Engenheiro Civil - nº 27.707/04-2		 Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 27.156.367/2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

sexta-feira, 8 de novembro de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024



J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:	07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00	Corridos	131 dias
Prazo da Obra	150 dias	Restantes	19 dias

Condições Climáticas: Manhã: Boa. / Tarde:

Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	1
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	4	Gesseiro	-
Serviços Executados	Pintura de piso, reboco, execução de pilares			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Manoel Mendes Soares Neto Engenheiro Civil - nº 27110166-2		 Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			sábado, 9 de novembro de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 132 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 18 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro		Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado		Topografo	-
	Calceteiro		Eletricista	
	Pedreiro		Pintor	-
	Armador		Carpinteiro	-
	Servente		Gesseiro	-
Serviços Executados	Não houve atividades			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Manoel Mesquita Soares Neto Engenheiro Civil CREA-SE nº 27173/1007-2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			domingo, 10 de novembro de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 133 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 17 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	1
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	4	Gesseiro	-
Serviços Executados	Não houve atividades			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil - Nº 271563679-2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE Nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

segunda-feira, 11 de novembro de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024



J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:	07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00	Corridos	134 dias
Prazo da Obra	150 dias	Restantes	16 dias

Condições Climáticas: Manhã: Boa. / Tarde:

Equipam.	Betoneira estacionária	
	Serra Manual	
	Policorte	

Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	1
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	4	Gesseiro	-

Serviços Executados	serviços diversos de alvenaria, pisos, pintura			

Anotação da Fiscalização				

Vistos	Fiscalização:	Contratada:
	<i>Manoel Márcio Soares Neto</i> Engenheiro Civil - nº 271163679-2	<i>Alex Sandro Rodrigues dos Santos</i> Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			terça-feira, 12 de novembro de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 135 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 15 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	1
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	4	Gesseiro	-
Serviços Executados	serviços diversos de alvenaria, pisos, pintura			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Manoel Medeiros Soares Neto Engenheiro Civil - nº 271703001-2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			quarta-feira, 13 de novembro de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 136 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 14 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	0
	Pedreiro	1	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	3	Gesseiro	-
Serviços Executados	Serviços diversos de piso, pintura de piso, elétrica			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Manoel Mesquita Soares Neto Engenheiro Civil - nº 27170301-2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

quinta-feira, 14 de novembro de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024



J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho: 07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 **Corridos** 137 dias

Prazo da Obra 150 dias **Restantes** 13 dias

Condições Climáticas:

Manhã: Boa. / Tarde:

Equipam.

Betoneira estacionária

Serra Manual

Policorte

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Motorista / Operador

-

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Topografo

-

Calceteiro

-

Eletricista

0

Pedreiro

1

Pintor

-

Armador

-

Carpinteiro

-

Servente

3

Gesseiro

-

Serviços Executados

Serviços diversos de piso, pintura de piso, elétrica

Anotação da Fiscalização

Vistos

Fiscalização:

Contratada:

Manoel Mesias Soares Neto
Engenheiro Civil - n° 271563679-2

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE n° 271563679-2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				sexta-feira, 15 de novembro de 2024		
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024						
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA						
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE						
DADOS DO DIA E DA OBRA						
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	138 dias	
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	12 dias	
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde:		
Equipam.						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Motorista / Operador		-
	Mestre de Obras/ Encarregado			Topografo		-
	Calceteiro			Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		-
	Armador			Carpinteiro		-
	Servente			Gesseiro		-
Serviços Executados	Sem atinidades - Feriado					
Anotação da Fiscalização						
Vistos	Fiscalização:			Contratada:		
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil - nº 27.173.103-2			Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563674-2		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

sábado, 16 de novembro de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024



J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:	07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00	Corridos	139 dias
Prazo da Obra	150 dias	Restantes	11 dias

Condições Climáticas:

Manhã: Boa. / Tarde:

Equipam.

Betoneira estacionária
Serra Manual
Policorte

Pessoal

Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
Calceteiro	-	Eletricista	1
Pedreiro	2	Pintor	-
Armador	-	Carpinteiro	-
Servente	4	Gesseiro	-

Serviços Executados

serviços diversos (pinntura, grama, reboco)

Anotação da Fiscalização

Vistos

Fiscalização:

Contratada:

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - 2711563679-2

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 2711563679-2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				domingo, 17 de novembro de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024					
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA					
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	140 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	10 dias
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária				
	Serra Manual				
	Policorte				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro	-	Eletricista	1	
	Pedreiro	2	Pintor	-	
	Armador	-	Carpinteiro	-	
	Servente	4	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Instalações elétricas				
	Piso pintura, terra vegetal e grama				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:			Contratada:	
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil - nº 271563679-2			Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			segunda-feira, 18 de novembro de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 141 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 9 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	4	Gesseiro	-
Serviços Executados	serviços diversos (pinntura, grama, reboco)			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Manoel Máximas Soares Neto Engenheiro Civil nº 271707001-2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			terça-feira, 19 de novembro de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 142 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 8 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	4	Gesseiro	-
Serviços Executados	serviços diversos (pinntura, grama, reboco)			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
Manoel Medeiros Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271170501-2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				quarta-feira, 20 de novembro de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024					
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA					
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	143 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	7 dias
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária				
	Serra Manual				
	Policorte				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Motorista / Operador	-	
	Mestre de Obras/ Encarregado		Topografo	-	
	Calceteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor	-	
	Armador		Carpinteiro	-	
	Servente		Gesseiro	-	
Serviços Executados	Feriado, não houve atividade				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:		Contratada:		
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil - nº 271563679-2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			quinta-feira, 21 de novembro de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 144 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 6 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
	Calceteiro	-	Eletricista	
	Pedreiro	2	Pintor	-
	Armador	-	Carpinteiro	-
	Servente	4	Gesseiro	-
Serviços Executados	Serviços diversos (grama, quiosques, pisos, pintura)			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil - Nº 271563679-2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2		

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS				sexta-feira, 22 de novembro de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024					
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA					
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE					
DADOS DO DIA E DA OBRA					
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos	145 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes	5 dias
Condições Climáticas:				Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária				
	Serra Manual				
	Policorte				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Motorista / Operador	-	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-	
	Calceteiro	-	Eletricista		
	Pedreiro	2	Pintor	-	
	Armador	-	Carpinteiro	-	
	Servente	4	Gesseiro	-	
Serviços Executados	Serviços diversos (grama, quiosques, pisos, pintura)				
Anotação da Fiscalização					
Vistos	Fiscalização:		Contratada:		
		 Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2			

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271707001 - 2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS			sábado, 23 de novembro de 2024	
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024				
J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA				
MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE				
DADOS DO DIA E DA OBRA				
Horário de Trabalho:		07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00		Corridos 146 dias
Prazo da Obra		150 dias		Restantes 4 dias
Condições Climáticas:			Manhã: Boa. / Tarde:	
Equipam.	Betoneira estacionária			
	Serra Manual			
	Policorte			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro		Motorista / Operador	-
	Mestre de Obras/ Encarregado		Topografo	-
	Calceteiro		Eletricista	
	Pedreiro		Pintor	-
	Armador		Carpinteiro	-
	Servente		Gesseiro	-
Serviços Executados	sem atividades			
Anotação da Fiscalização				
Vistos	Fiscalização:		Contratada:	
	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN nº 271747001-2		Alex Sandro Rodrigues dos Santos Engenheiro Civil CREA-SE nº 271563679-2	

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

domingo, 24 de novembro de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024



J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:	07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00	Corridos	147 dias
Prazo da Obra	150 dias	Restantes	3 dias

Condições Climáticas:

Manhã: Boa. / Tarde:

Equipam.

Betoneira estacionária

Serra Manual

Policorte

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

Mestre de Obras/ Encarregado

Calceteiro

Pedreiro

Armador

Servente

Motorista / Operador

Topografo

Eletricista

Pintor

Carpinteiro

Gesseiro

Serviços Executados

sem atividades

Anotação da Fiscalização

Vistos

Fiscalização:

Contratada:

Marcos Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - Nº 271737551-2

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2

LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

segunda-feira, 25 de novembro de 2024

CONSTRUÇÃO DA ORLA DE PIRAMBU - TRECHO 03 - CONTRATO Nº 76/2024



J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE

DADOS DO DIA E DA OBRA

Horário de Trabalho:	07:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00	Corridos	148 dias
Prazo da Obra	150 dias	Restantes	2 dias

Condições Climáticas: Manhã: Boa. / Tarde: Bom

Equipam.

Betoneira estacionária
Serra Manual
Policorte

Pessoal

Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Engenheiro	1	Motorista / Operador	-
Mestre de Obras/ Encarregado	1	Topografo	-
Calceteiro	-	Eletricista	1
Pedreiro	2	Pintor	-
Armador	-	Carpinteiro	-
Servente	4	Gesseiro	-

Serviços Executados

Serviços diversos (Pisos, elétrica, quiosques, alvenaria de pedra, laje)

Anotação da Fiscalização

Vistos

Fiscalização:

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil nº 271731601-2

Contratada:

Alex Sandro Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271563679-2
