

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.41
2206302206 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PF MN PIRAMBU FDO ESP PEA
AGENCIA: 2206-3 CONTA: 136.072-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PF MN PIRAMBU FDO ESP PEA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1045-6 - SIQUEIRA CAMPOS
CONTA: 3.843-4

FAVORECIDO: RS ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 49.569.666/0001-54
VALOR: R\$ 37.770,14
DEBITO EM: 05/09/2024
=====

DOCUMENTO: 090506
AUTENTICACAO SISBB: 6.D12.55D.49E.E4F.8B0

Transação efetuada com sucesso por: JB826408 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO.

PAGO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2206-3
Conta corrente 136072-8 PF MN PIRAMBU FDO ESP PEA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1045 SIQUEIRA CAMPOS
Conta corrente (com DV) 38434
CNPJ 49.569.666/0001-54
Nome favorecido RS ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.506
Valor 37.770,14
Destinação 0
Data transferência 05/09/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6D1255D49EE4F8B0

Assinada por	JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA	05/09/2024 16:30:38
	JB826408 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO	05/09/2024 16:35:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB826408 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO.



TED

G3380516230682091
05/09/2024 16:30:38

Debitado

Agência 2206-3
Conta corrente 136072-8 PF MN PIRAMBU FDO ESP PEA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1045 SIQUEIRA CAMPOS
Conta corrente (com DV) 38434
Conta Pagamento 0000
CNPJ 49.569.666/0001-54
Nome favorecido RS ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 37.770,14
Data transferência 05/09/2024

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 352232719.
Usuário: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
Termo de Entrega de Documentos



TERMO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 49.569.666/0001-54

Nome: RS ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA TERCENIO SAMPAIO

Bairro: GRAGERU

E-mail: rafaella.tec.eng@gmail.com

Compl:

Cidade: Aracaju

Telefone: (79)99360-542

UF: SE

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Conta:

EMPENHO

0702001

EMIÇÃO

02/07/2024

CLASSIFICAÇÃO

1040.44905100-17200000

TIPO

Global

FONTE

Transferências da União
Referentes às participações na exploração
de Petróleo e Gás Natural destinadas ao
FEP - Lei 9.479/1997

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 106/2024.

Documentação

Nota Fiscal 34
Valor R\$ 38.938,29
Emissão 04/09/2024
Horário de Entrega 05/09/2024 10:40:51

Para acompanhar o andamento do seu processo na fila pública, acesse o link abaixo:

<http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pirambu/fornecedor/filapagamento>

Assinado por: Santiago Santos Gois

Secretaria de Controle Interno

☒ Aprovado

☐ Reprovado

Obs. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 -
Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

04/09/2024 19:59:50

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte
(ME EPP)

Período de Competência

09/2024

Município de Prestação do
Serviço

Pirambu - SE

Exigibilidade do ISS

Exigível em
Pirambu

Nota: 2024000

00000034

Código Verificação

EC7P-DLJV



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

RS ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia

RS ENGENHARIA

CPF/CNPJ

49.569.666/0001-54

Inscrição Municipal

1419742

Inscrição Estadual

isento

Simples Nacional

Sim

Email

RAFAELA.TEC.ENG@GMAIL.COM

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 99936-0542

Endereço

Rua Terêncio Sampaio, 532, Grageru - CEP: 49025-700 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

CPF/CNPJ

13.095.039/0001-81

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3276-1693

E-mail

rsengenharia50@gmail.com

Endereço

PRAÇA NOSSA SENHORA DE LURDES, 16 - Centro - CEP: 49190-000 - Pirambu - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4213800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02/2024 DA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE, CONFORME CONCORRÊNCIA 01/2024 E CONTRATO 106/2024

DADOS BANCARIOS PARA LIQUIDAÇÃO DESTA NOTA FISCAL

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1045

CORRENTE: 3843-4

Alais dos Santos
Secretaria Municipal de Obras
Matrícula Nº 33332835 | 2021

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - Nº 071797661 - 2

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

38.938,29

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

38.938,29

Alíquota (%)

3,0000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

1.168,15

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

37.770,14

Valor Total da Nota (R\$)

38.938,29

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 5.237,20 Federal e R\$ 1.946,91 Municipal. Fonte: IBPT [19CB11]

Visualizado em: 04/09/2024 19:59:50

Para validação desta NFSe acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
REF: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE

OFICIO - ENCAMINHAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

Senhor fiscal,

Venho por meio deste encaminhar o 2º Boletim de medição do período de 06/08/2024 a 04/09/2024 referente a Concorrência Nº 01/2024, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU e a RS ENGENHARIA LTDA, que tem como objetivo a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE no valor de **R\$ 38.938,29 (trinta e oito mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos).**

BANCO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA 1045
OP 003
CONTA Nº 00003843-4

Desde já agradecemos a habitual atenção e nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento, ao tempo em que renovamos nossos votos da mais alta estima e consideração

Reiteramos nossos votos de elevada estima e distinguida consideração.

Aracaju, 04/09/2024.

Atenciosamente,

Rafaela Souza Santos
RS Engenharia LTDA
CNPJ:49.569.666/0001-54
Engª Civil / Sócia Administradora
CREA-SE RN:270763515-4



À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
REF: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE

RECIBO - BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

Prezado,

Informo que RECEBI o valor de **R\$ 38.938,29 (trinta e oito mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos)** referente ao 2º Boletim de medição do período de 06/08/2024 a 04/09/2024 - Concorrência Nº 01/2024, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU e a RS ENGENHARIA LTDA, que tem como objetivo a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE, na conta: BANCO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA 1045 OP 003 CONTA Nº 00003843-4.

Aracaju, 04/09/2024.

Atenciosamente,

Rafaela Souza Santos
RS Engenharia LTDA
CNPJ:49.569.666/0001-54
Engª Civil / Sócia Administradora
CREA-SE RN:270763515-4

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02				CONCORRÊNCIA Nº 01/2024				RS ENGENHARIA LTDA - EPP			
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE				Período: 06/08/2024 a 04/09/2024				ART OBRA / SERVIÇO Nº SE20240390010							
Praça Nossa Senhora de Lurdes, nº 16 – Centro de Pirambu – Sergipe – CEP: 49.190-000				CNPJ : 13.095.039/0001-81											
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54								DATA DA MEDIÇÃO: 04/09/2024							
ITEM	UNd	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE			Saldo a medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$			Executado (%)				
			Contratada	Acumulada até o Período	Do Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período		Acumulado até o Período	Saldo a Medir		
REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE															
01		SERVIÇOS PRELIMINARES													
01.001	un	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	1,00	1,00		1,00	R\$ 665,39	R\$ 665,39	R\$ 665,39	R\$ 665,39	R\$ -	R\$ 665,39	R\$ -	100%	
01.002	m2	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	532,00	532,00		532,00	R\$ 22,05	R\$ 11.730,60	R\$ 11.730,60	R\$ 11.730,60	R\$ -	R\$ 11.730,60	R\$ -	100%	
01.003	m3	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m semi revestimento	30,00	30,00		30,00	R\$ 19,84	R\$ 595,20	R\$ 595,20	R\$ 595,20	R\$ -	R\$ 595,20	R\$ -	100%	
01.004	m3	Coleta e carga manuais de entulho	1,00	1,00		1,00	R\$ 14,46	R\$ 14,46	R\$ 14,46	R\$ 14,46	R\$ -	R\$ 14,46	R\$ -	100%	
01.005	un	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros	2,00	-	2,00	2,00	R\$ 568,98	R\$ 1.137,96	R\$ -	R\$ 1.137,96	R\$ -	R\$ 1.137,96	R\$ -	100%	
01.006	m	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 85 cm	35,00	-	35,00	35,00	R\$ 143,88	R\$ 5.035,80	R\$ -	R\$ 5.035,80	R\$ -	R\$ 5.035,80	R\$ -	100%	
02		BANHEIRO MASCULINO												44%	
02.001	m2	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:6 (cimento/cal/areia), juntas=1cm - Rev.09	116,90	-	116,90	116,90	R\$ 43,13	R\$ 5.041,90	R\$ -	R\$ 5.041,90	R\$ -	R\$ 5.041,90	R\$ -	100%	
02.002	m	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "U" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	30,00	-	30,00	30,00	R\$ 30,72	R\$ 921,60	R\$ -	R\$ 921,60	R\$ -	R\$ 921,60	R\$ -	100%	
02.003	m3	Concreto Amado fck=21, DMPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	0,50	-	0,50	0,50	R\$ 2.288,97	R\$ 1.149,49	R\$ -	R\$ 1.149,49	R\$ -	R\$ 1.149,49	R\$ -	100%	
02.004	m2	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebolec, espessura 1,5 cm	233,80	-	233,80	233,80	R\$ 25,25	R\$ 5.903,45	R\$ -	R\$ 5.903,45	R\$ -	R\$ 5.903,45	R\$ -	100%	
02.005	m2	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisão 08/2015	233,80	-	233,80	233,80	R\$ 5,92	R\$ 1.384,10	R\$ -	R\$ 1.384,10	R\$ -	R\$ 1.384,10	R\$ -	100%	
02.006	m2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	116,90	-	-	-	R\$ 15,10	R\$ 1.765,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.765,19	R\$ -	0%	
02.007	m2	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores - cores convencionais - Rev 03	116,90	-	-	-	R\$ 13,38	R\$ 1.564,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.564,12	R\$ -	0%	
02.008	m2	Porta ou janela em alumínio, cor NP/IB-tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou rodanas e fechadura	13,23	-	-	-	R\$ 300,83	R\$ 3.979,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.979,98	R\$ -	0%	
02.009	un	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	2,00	-	2,00	2,00	R\$ 503,80	R\$ 1.007,60	R\$ -	R\$ 1.007,60	R\$ -	R\$ 1.007,60	R\$ -	100%	
02.010	un	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	1,00	-	-	-	R\$ 415,11	R\$ 415,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 415,11	R\$ -	0%	

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil N.º 27179001-7

Rafaela Souza Santos
Engenheira Civil
Cris RN: 2707635154

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02					CONCORRÊNCIA Nº 01/2024					RS ENGENHARIA LTDA - EPP				
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE										ART OBRA / SERVIÇO Nº SE20240390010														
Praça Nossa Senhora de Lurdes, nº 16 – Centro de Pirambu – Sergipe – CEP: 49.190-000										Período: 06/08/2024 a 04/09/2024					DATA DA MEDIÇÃO: 04/09/2024									
CNPJ : 13.095.039/0001-81										QUANTIDADE					VALORES R\$					Executado (%)				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					Und	Contratada	Acumulada a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unitário R\$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Executado (%)						
02.011	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc					un	3,00	-	-	-	3,00	R\$ 74,16	R\$ 222,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 222,48	0%						
02.012	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo					un	3,00	-	-	-	3,00	R\$ 70,52	R\$ 211,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 211,56	0%						
02.013	Porta lualha inox para papel toalha em rolo					un	2,00	-	-	-	2,00	R\$ 136,93	R\$ 273,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 273,86	0%						
02.014	Lavalatório buça (Deka-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plástica ou similares					un	2,00	-	-	-	2,00	R\$ 232,55	R\$ 465,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 465,10	0%						
02.015	Forro de pvc, em régulas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforos ou similar, instalado - Rev 06_10/2021					m2	30,00	-	-	-	30,00	R\$ 64,12	R\$ 1.923,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.923,60	0%						
02.016	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Elane ou similar, aplicado com argamassa industrializada acilii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço					m2	146,90	-	-	-	146,90	R\$ 62,27	R\$ 9.147,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.147,46	0%						
03	BANHEIRO FEMININO												R\$ 25.745,56	R\$ -	R\$ 10.133,07	R\$ 10.133,07	R\$ 15.612,49	39%						
03.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09					m2	73,00	-	73,00	73,00	-	R\$ 43,13	R\$ 3.148,49	R\$ -	R\$ 3.148,49	R\$ 3.148,49	R\$ -	100%						
03.002	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa					m	25,00	-	25,00	25,00	-	R\$ 30,72	R\$ 768,00	R\$ -	R\$ 768,00	R\$ 768,00	R\$ -	100%						
03.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)					m3	0,50	-	0,50	0,50	-	R\$ 2.298,97	R\$ 1.149,49	R\$ -	R\$ 1.149,49	R\$ 1.149,49	R\$ -	100%						
03.004	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm					m2	146,40	-	146,40	146,40	-	R\$ 25,25	R\$ 3.696,60	R\$ -	R\$ 3.696,60	R\$ 3.696,60	R\$ -	100%						
03.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015					m2	146,40	-	146,40	146,40	-	R\$ 5,92	R\$ 866,69	R\$ -	R\$ 866,69	R\$ 866,69	R\$ -	100%						
03.006	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01					m2	73,20	-	-	-	73,20	R\$ 15,10	R\$ 1.105,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.105,32	0%						
03.007	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03					m2	73,20	-	-	-	73,20	R\$ 13,38	R\$ 979,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 979,42	0%						
03.008	Porta ou janela em alumínio, cor NPB/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura					m2	13,23	-	-	-	13,23	R\$ 300,83	R\$ 3.979,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.979,98	0%						
03.009	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar					un	2,00	-	1,00	1,00	1,00	R\$ 503,80	R\$ 1.007,60	R\$ -	R\$ 503,80	R\$ 503,80	R\$ 503,80	50%						
03.010	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev					un	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 415,11	R\$ 415,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 415,11	0%						
03.011	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc					un	3,00	-	-	-	3,00	R\$ 74,16	R\$ 222,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 222,48	0%						

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - nº 271797661 - 2

Rafaela Sales Santos
Engenheira Civil
Crea RJ: 2707635154

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE
Praça Nossa Senhora de Lurdes, nº 16 – Centro de Pirambu – Sergipe – CEP: 49.190-000
CNPJ: 13.095.039/0001-81
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02
CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
ART OBRA / SERVIÇO Nº SE20240390010
DATA DA MEDIÇÃO: 04/09/2024

RS ENGENHARIA LTDA - EPP

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und	QUANTIDADE				Saldo a medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Executado (%)
			Contratada	Acumulada a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	
06	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								R\$ 3.763,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.763,22	0%
06.001	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	29,00	-		-	29,00	R\$ 37,81	R\$ 1.096,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.096,49	0%
06.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	4,00	-		-	4,00	R\$ 95,86	R\$ 383,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 383,44	0%
06.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	3,00	-		-	3,00	R\$ 71,96	R\$ 215,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 215,88	0%
06.004	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	6,00	-		-	6,00	R\$ 125,26	R\$ 751,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 751,56	0%
06.005	Revisão de ponto de água tipo 1	un	29,00	-		-	29,00	R\$ 22,28	R\$ 646,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 646,12	0%
06.006	Fossa séptica pré-moldada, tipo cms, capacidade 20 pessoas (V=14-10 litros)	un	1,00	-		-	1,00	R\$ 669,73	R\$ 669,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 669,73	0%
07	REVISÃO COBERTURA								R\$ 16.801,36	R\$ 16.801,36	R\$ -	R\$ 16.801,36	100%
07.001	Retelhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, inclusive parafuso, exclusive telha - Rev 01	m2	532,00	532,00		532,00	-	R\$ 11,48	R\$ 6.107,36	R\$ 6.107,36	R\$ -	R\$ 6.107,36	100%
07.002	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, inclusive içamento. af_07/2019	m2	200,00	200,00		200,00	-	R\$ 53,47	R\$ 10.694,00	R\$ 10.694,00	R\$ -	R\$ 10.694,00	100%
08	BOXES DE COMERCIALIZAÇÃO								R\$ 31.905,93	R\$ 4.492,98	R\$ 7.223,32	R\$ 11.716,30	37%
08.001	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	259,60	259,60		259,60	-	R\$ 15,04	R\$ 3.904,38	R\$ 3.904,38	R\$ -	R\$ 3.904,38	100%
08.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada acil, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	259,60	-	116,00	116,00	143,60	R\$ 62,27	R\$ 16.165,29	R\$ -	R\$ 7.223,32	R\$ 7.223,32	45%
08.003	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	54,00	-		-	54,00	R\$ 208,29	R\$ 11.247,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.247,66	0%
08.004	Remoção de lavatório	un	54,00	54,00		54,00	-	R\$ 10,90	R\$ 588,60	R\$ 588,60	R\$ -	R\$ 588,60	100%
09	PORTÕES PRINCIPAIS								R\$ 22.630,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.630,97	0%
09.001	Portão em chapa de ferro n.º 18 (1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01	m2	36,40	-		-	36,40	R\$ 621,73	R\$ 22.630,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.630,97	0%

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 27179661-2

Rafaela Souza Santos
Engenheira Civil
Crea RN: 272635154

RS ENGENHARIA LTDA - EPP														
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02				CONCORRÊNCIA Nº 01/2024				ART OBRA / SERVIÇO Nº SE20240390010						
Período: 06/08/2024 a 04/09/2024				DATA DA MEDIÇÃO: 04/09/2024										
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und	QUANTIDADE			Saldo a medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$			Executado (%)			
			Contratada	Acumulad a Anterior	Do Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período		Acumulado até o Período	Saldo a Medir	
10	PINTURA MERCADO													
10.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	984,08	-		-	984,08	R\$ 15,10	R\$ 14.859,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.264,22	0%
10.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	984,08	-		-	984,08	R\$ 16,67	R\$ 16.404,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.404,61	0%
11	CALÇADA													
11.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_09/2022	m2	132,98	-		-	132,98	R\$ 61,39	R\$ 8.163,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.163,64	0%
11.002	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	132,98	-		-	132,98	R\$ 6,79	R\$ 902,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 902,93	0%
11.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	66,49	-		-	66,49	R\$ 48,31	R\$ 3.212,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.212,13	0%
11.004	Pintura de meio fio (caliação)	m	66,49	-		-	66,49	R\$ 4,72	R\$ 313,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 313,83	0%
11.005	Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2"	m	9,48	-		-	9,48	R\$ 86,91	R\$ 823,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 823,91	0%
11.006	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldado.	un	2,00	-		-	2,00	R\$ 1.110,90	R\$ 2.221,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.221,80	0%
12	SERVIÇOS FINAIS													
12.001	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 - EXECUÇÃO NA OBRA, inclusive placas.	un	1,00	-		-	1,00	R\$ 5.862,50	R\$ 5.862,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.862,50	0%
TOTAL DA MEDIÇÃO			TOTAL DA MEDIÇÃO R\$ 38.938,29 (trinta e oito mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos).											
PORCENTAGENS DA MEDIÇÃO			100% 13% 15% 29% 71%											
APROVADO PARA PAGAMENTO														
RS ENGENHARIA LTDA - EPP														
ATTESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM														
FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.														
DATA:														
DATA:														
RAFAELA SOUZA SANTOS														
Engenheiro Civil - CREA/SE nº 270763515-4														


Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - CREA/SE nº 27197661-2
Cruzeiro: 27197661-2

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE				MEMORIAL DE CÁLCULO - BM 02				CONCORRÊNCIA N° 01/2024				RS ENGENHARIA LTDA - EPP	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE				Período:06/08/2024 a 04/09/2024				DATA DA MEDIÇÃO: 04/09/2024					
Praça Nossa Senhora de Lurdes, n° 16 – Centro de Pirambu – Sergipe – CEP: 49.190-000													
CNPJ : 13.095.039/0001-81													
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54													
MEMORIAL DE CÁLCULO													
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und	QUANT	LARGURA	COMPR	ALTURA	LOCAL	PERIMET	ÁREA	VOLUME	TOTAL		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE													
01	SERVIÇOS PRELIMINARES												
01.005	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros	un	2,00					Serviço Executado 100% conforme projeto			2,00		
01.006	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 85 cm	m	35,00					Serviço Executado 100% conforme projeto			35,00		
02	BANHEIRO MASCULINO												
02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	116,90					Serviço Executado 100% conforme projeto			116,90		
02.002	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	30,00					Serviço Executado 100% conforme projeto			30,00		
02.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado	m3	0,50					Serviço Executado 100% conforme projeto			0,50		
02.004	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	233,80					Serviço Executado 100% conforme projeto			233,80		
02.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	233,80					Serviço Executado 100% conforme projeto			233,80		
02.009	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	2,00					Serviço Executado 100% conforme projeto			2,00		
03	BANHEIRO FEMININO												
03.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	73,00					Serviço Executado 100% conforme projeto			73,00		
03.002	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	25,00					Serviço Executado 100% conforme projeto			25,00		
03.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado	m3	0,50					Serviço Executado 100% conforme projeto			0,50		
03.004	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	146,40					Serviço Executado 100% conforme projeto			146,40		
03.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	146,40					Serviço Executado 100% conforme projeto			146,40		
03.009	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	2,00					Serviço Executado 50% conforme projeto			1,00		

Rafaela Soares Neto
Engenheira Civil
Cruze RN: 2.707635154





Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271791661-2

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE				MEMORIAL DE CÁLCULO - BM 02				CONCORRÊNCIA Nº 01/2024				RS ENGENHARIA LTDA - EPP	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE				Período: 06/08/2024 a 04/09/2024				DATA DA MEDIÇÃO: 04/09/2024					
Praça Nossa Senhora de Lurdes, nº 16 – Centro de Pirambu – Sergipe – CEP: 49.190-000 CNPJ : 13.095.039/0001-81													
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54													
MEMORIAL DE CÁLCULO													
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und	QUANT	LARGURA	COMPR	ALTURA	LOCAL	PERIMET	ÁREA	VOLUME	TOTAL		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE													
08	BOXES DE COMERCIALIZAÇÃO												
08.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco branco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada aciii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	259,60									Serviço Executado 45% conforme projeto	
											116,00		

MANOEL NESSIAS SOARES NETO
Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2





RAFAELA SOUZA SANTOS
Engenheira Civil - CREA/SE nº 270763515-4

RAFAELA SOUZA SANTOS
Engenheira Civil
Crea RN. 2707635154

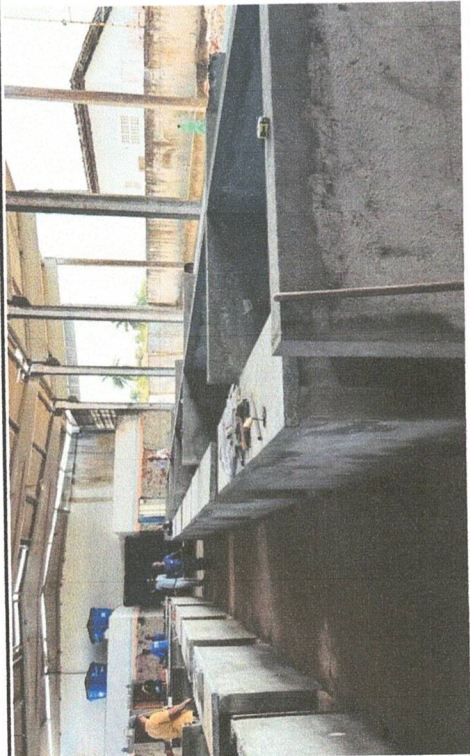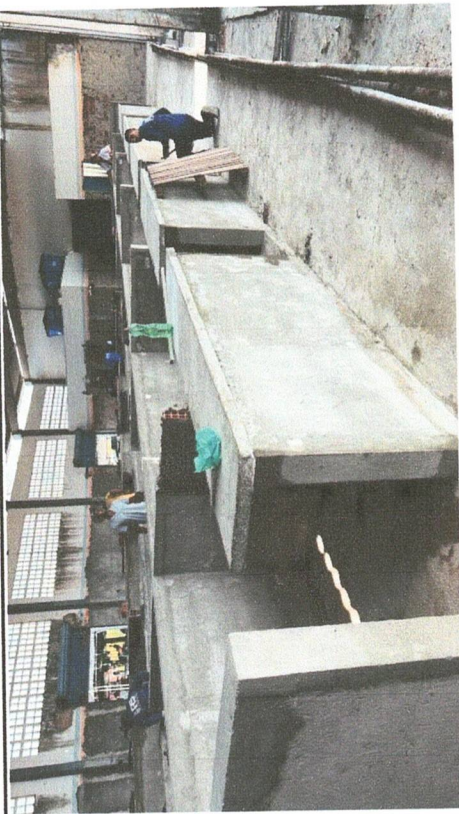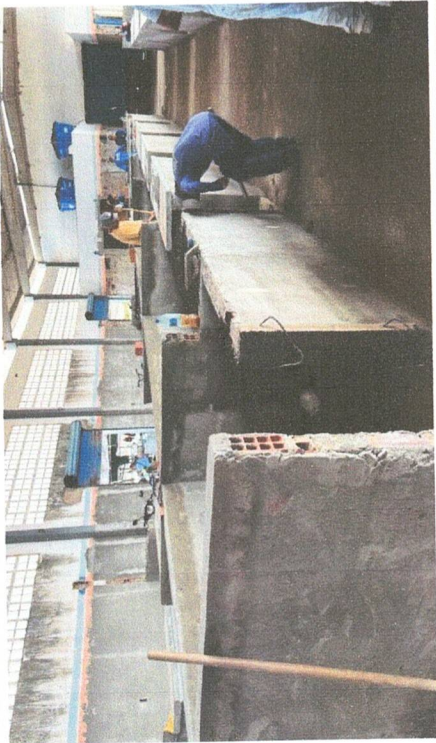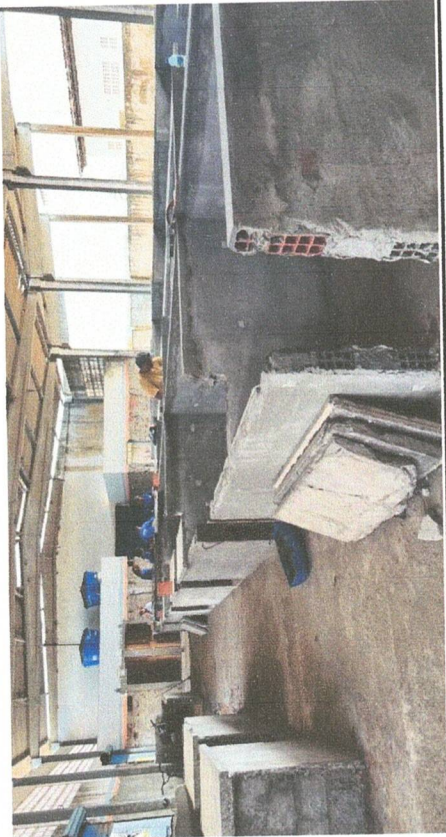OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE		CONCORRÊNCIA N° 01/2024	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE		Período: 06/08/2024 a 04/09/2024	
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP			
			
			



Rafaela Cruz Santos
 Engenheira Civil
 CRIB Nº. 2707635154

Manoel Messias Soares Neto
 Engenheiro Civil
 CRIB Nº. 27119661-2

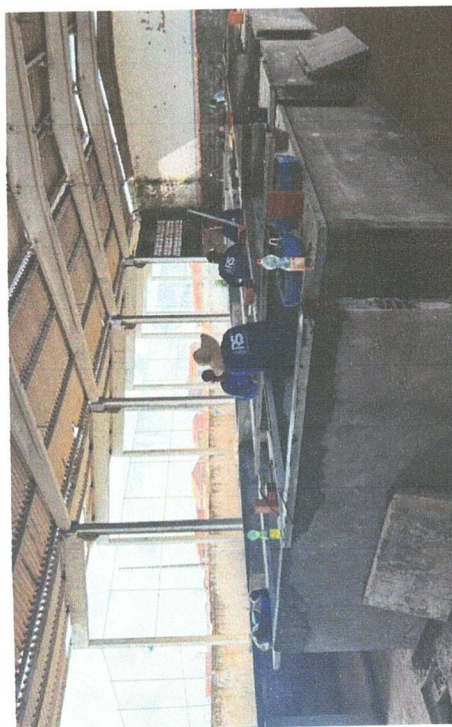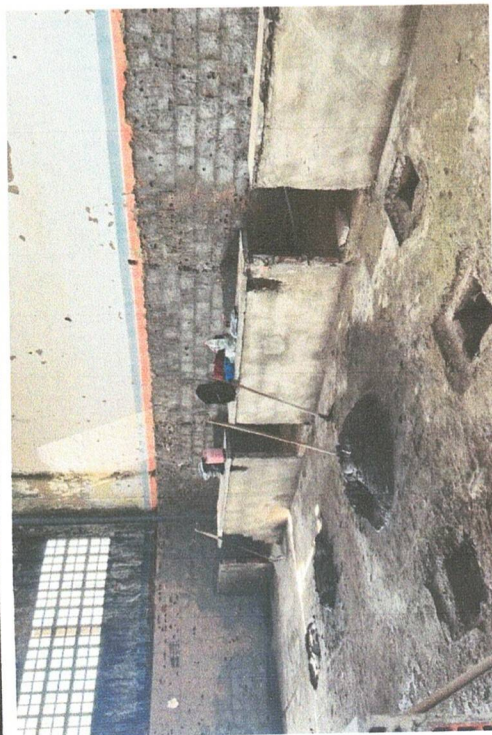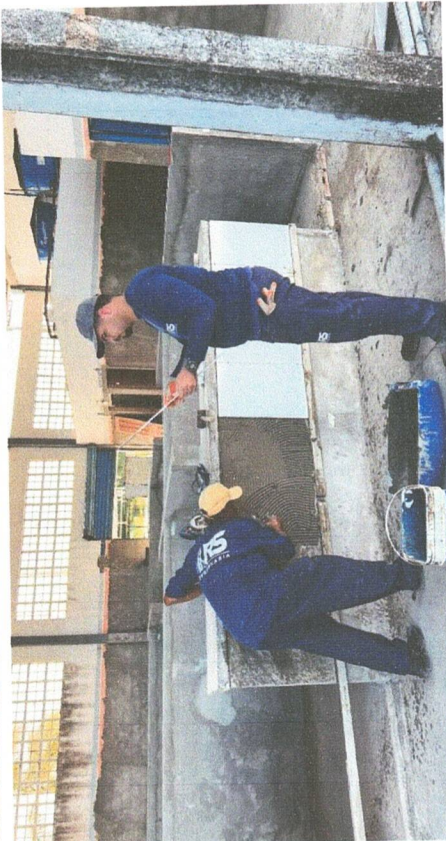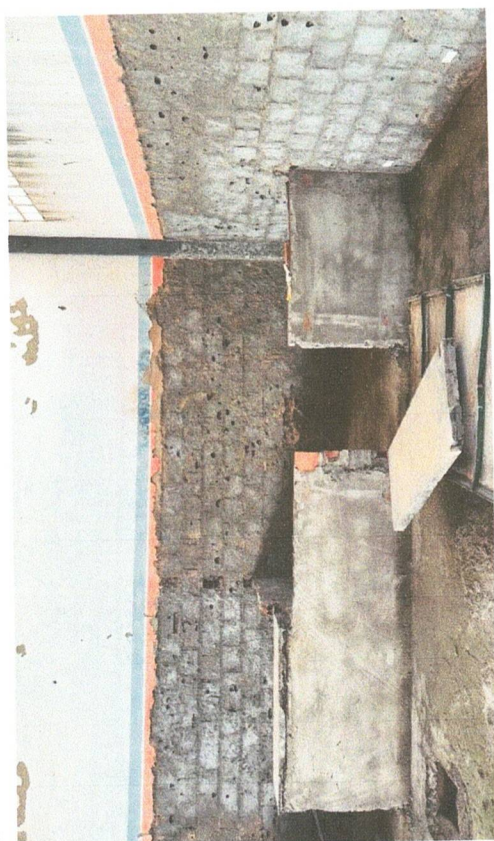

Rafaela Soares Santos
Engenheira Civil
Crea: RN. 2727635154

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - N. 271797661-2

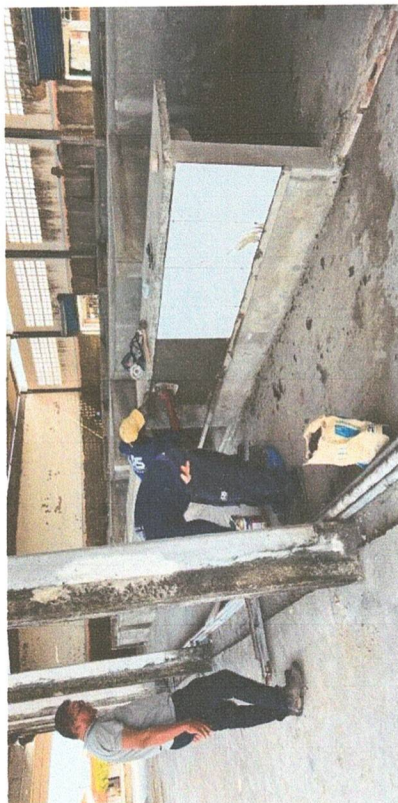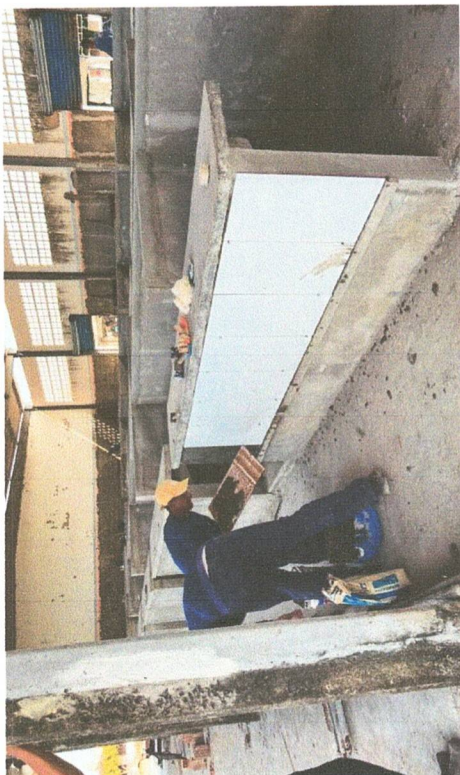

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil R.N. nº 271797661-2

Rafaela Souza Santos
Engenheira Civil
C.R.E. R.N. 2707635154

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 34
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 06/08/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Instalação de Caixa d'água	
Execução de calha	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	 Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 35
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 07/08/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Instalação de Caixa d'água	
Execução de calha	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN: nº 271797661-2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 36
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 08/08/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Instalação de Caixa d'água	
Execução de calha	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafael Souza Santos Engenheiro Civil Crea RN. 2717635154	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 37
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 09/08/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Instalação de Caixa d'água	
Execução de calha	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Cruz Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 38
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 10/08/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
Final de Semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Santos Engenheira Civil Crea RN. 2707685154	Manoel Márcio Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 39
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 11/08/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
Final de Semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil C.R.E. Nº. 2707635154	 Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 40
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 12/08/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de Estrutura dos Banheiros	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Santos Engenheira Civil Crea RN. 2707635154	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 41
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 13/08/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de alvenaria de bloco cerâmico dos banheiros	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Santos Engenheira Civil C.R.E. Nº. 2707635154	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 42
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 14/08/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de alvenaria de bloco cerâmico dos banheiros	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela S. Santos Engenheira Civil C.R.E. RN. 2707635154	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 43
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 15/08/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de alvenaria de bloco cerâmico dos banheiros	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil C.R.E. RN. 2707635154	 Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 44
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 16/08/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de alvenaria de bloco cerâmico dos banheiros	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Soares Santos Engenheira Civil Crea RN. 271797661-2	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 45
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 17/08/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
Final de Semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela S. Santos Engenheira Civil CREA RN. 2707635/54	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 46
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 18/08/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
Final de Semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil C.R.E. RN. 2717635-154	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil - RN - nº 271797661-2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 47
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 19/08/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de alvenaria de bloco cerâmico dos banheiros	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Silva Santos Engenheira Civil Cruz RN. 2707635154	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271707661-2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 48
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 20/08/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de chapisco e reboco dos banheiros	
Execução de Revestimento cerâmico dos box	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN. 2707635154	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 49
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 21/08/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de chapisco e reboco dos banheiros	
Execução de Revestimento cerâmico dos box	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil C.R.E. Nº. 2707635154	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 50
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 22/08/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de chapisco e reboco dos banheiros	
Execução de Revestimento cerâmico dos box	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela S. Santos Engenheira Civil C.R.G. Nº. 2707635154	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 51
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 23/08/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de chapisco e reboco dos banheiros	
Execução de Revestimento cerâmico dos box	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Santos Engenheira Civil C.R.E. Nº. 2707685154	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil - RN - nº 271707661-2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 52
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 24/08/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
Final de Semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Soares Santos Engenheira Civil CREB RN. 2707635154	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 53
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 25/08/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
Final de Semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Santos Engenheira Civil CREC RN. 2707835154	Manoel Medeiros Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 54
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 26/08/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de chapisco e reboco dos banheiros	
Execução de Revestimento cerâmico dos box	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela S. Santos Engenheira Civil CREC RN. 2707635154	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN. nº 271797661-2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 55
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 27/08/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de chapisco e reboco dos banheiros	
Execução de Revestimento cerâmico dos box	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela S. Santos Engenheira Civil C.R.E. Nº. 2717635154	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 56
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 28/08/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de chapisco e reboco dos banheiros	
Execução de Revestimento cerâmico dos box	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela S. Santos Engenheira Civil CRB RN. 271797661-2	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 57
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 29/08/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de chapisco e reboco dos banheiros	
Execução de Revestimento cerâmico dos box	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Silva Santos Engenheira Civil Crec. RN. 2707635154	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 58
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 30/08/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de chapisco e reboco dos banheiros	
Execução de Revestimento cerâmico dos box	
Instalação de vaso sanitário	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Santos Engenheira Civil C.R.E. Nº. 2717635154	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN nº 271797661 - 2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 59
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 31/08/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
Final de Semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Soares Engenheira Civil CREA RN. 2707635154	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN. nº 271797661-2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 60
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 01/09/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
Final de Semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Santos Engenheira Civil C.R.E. RN. 2707635154	

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 61
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 02/09/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de chapisco e reboco dos banheiros	
Execução de Revestimento cerâmico dos box	
Instalação de vaso sanitário	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela S. Santos Engenheira Civil CREA RN. 2707635154	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 62
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 03/09/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de chapisco e reboco dos banheiros	
Execução de Revestimento cerâmico dos box	
Instalação de vaso sanitário	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Soares Santos Engenheira Civil CREA RN. 2707635154	Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 63
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 04/09/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de chapisco e reboco dos banheiros	
Execução de Revestimento cerâmico dos box	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Cruze RN: 2707635154	



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

ORDEM DE SERVIÇO

VIGÊNCIA:
02/07/2024

CONTRATO: N°_01/2024

**OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DO
MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO DE
PIRAMBU, SERGIPE**

PRAZO DO CONTRATO: 12 meses

PRAZO DA OBRA: 03 meses

DATA DO CONTRATO: 02 de Julho de 2024


**RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA**

CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA

Tendo em vista o instrumento contratual acima descrito, celebrado com esta Prefeitura, fica Vossa Senhoria cientificado de que o prazo para início dos serviços objeto do contrato começará a partir de 04/07/2024.

Outrossim, informamos que foi designado pela Prefeitura Municipal de Pirambu, o engenheiro Manoel Messias Soares Neto, para fiscalização dos serviços.

Pirambu, 03 de Julho de 2024



Prefeitura de Pirambu
Guilherme Jullius Zacarias de Melo
PREFEITO

CIENTE:

Eng° Fiscal:

Firma Contratada:



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.020.31810/79	Nome da obra REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE	Data do cadastramento 06/08/2024 05:19
Origem do cadastramento e-CAC		
Tipo Zona Zona Urbana	ART SE20240390010	RRT CIB Cadastro Imobiliário 0001
Data do início da obra 04/07/2024	CNAE 4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	

Situação da obra

Situação Ativa	Data 04/07/2024
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município PIRAMBU	UF SE	CEP 49.190-000
Bairro CENTRO	Logradouro RODOVIA REINALDO MOURA	Número S/N	

Responsável

Nome RS ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ 49.569.666/0001-54	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 04/07/2024	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
13.095.039/0001-81	MUNICIPIO DE PIRAMBU

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Galpão industrial	Alvenaria	610,00 m²
Reforma	Galpão industrial	Alvenaria	610,00 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra 610,00 m²



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240390010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

RAFAELA SOUZA SANTOS

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **2707635154**

Registro: **2707635154SE**

Empresa contratada: **RS ENGENHARIA LTDA**

Registro : **0000203823-SE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU**

RUA GIVALDO MOURA DA SILVA

Complemento:

Cidade: **Pirambu**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

CPF/CNPJ: **13.095.039/0001-81**

Nº: **85**

CEP: **49190000**

Contrato: **CONCORRÊNCIA Nº 01/2024** Celebrado em: **02/07/2024**

Valor: **R\$ 256.900,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Órgão Público**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA Rodovia Reinaldo Moura

Complemento: **Mercado municipal**

Cidade: **Pirambu**

Data de Início: **04/07/2024**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU**

Bairro: **Centro**

UF: **SE**

Nº: **S/N**

CEP: **49190000**

Coordenadas Geográficas: **-10.633969, -36.803492**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **13.095.039/0001-81**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA	189,90	m2
52 - Execução de reforma > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	610,98	m2
52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	36,00	un
52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	35,00	un
52 - Execução de reforma > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO	66,49	m
52 - Execução de reforma > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #TOS_11.6.4 - DE QUADRO DE MEDIÇÃO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO DE PIRAMBU ? SERGIPE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8DwyY
 Impresso em: 15/07/2024 às 08:18:27 por: , ip: 191.52.249.11

www.crea-se.org.br
 Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br
 Fax: XXXX-XXXX





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240390010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Documento assinado digitalmente

INICIAL

gov.br

RAFAELA SOUZA SANTOS
Data: 15/07/2024 08:23:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RAFAELA SOUZA SANTOS - CPF: 036.670.875-94

Local de data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU - CNPJ: 13.095.039/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 262,55 Registrada em: 12/07/2024 Valor pago: R\$ 262,55 Nosso Número: 8203222429

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8DwyY
Impresso em: 15/07/2024 às 08:18:27 por: , ip: 191.52.249.11

www.crea-se.org.br
Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br
Fax: XXXX-XXXX

 **CREA-SE**
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Sergipe





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240392577

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

MANOEL MESSIAS SOARES NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2717976612

Registro: 2717976612SE

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pirambu**

RUA RUA GIVALDO MOURA DA SILVA

Complemento:

Cidade: **PIRAMBU**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

CPF/CNPJ: **13.095.039/0001-81**

Nº: **16**

CEP: **49190000**

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 0,00**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA Reinaldo Moura

Complemento: **Mercado Municipal**

Cidade: **PIRAMBU**

Data de Início: **10/06/2024**

Previsão de término: **22/11/2024**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

Nº: **s/n**

CEP: **49190000**

Coordenadas Geográficas: **-10.739175, -36.858147**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Pirambu**

CPF/CNPJ: **13.095.039/0001-81**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	612,00	m2
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	612,00	m2
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	612,00	m2
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	36,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	35,00	un
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO	66,49	m
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #TOS_11.6.4 - DE QUADRO DE MEDIÇÃO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART referente a fiscalização da reforma do Mercado Municipal de Pirambu-SE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w6dwA
 Impresso em: 31/07/2024 às 11:53:10 por: , ip: 138.255.229.72

www.crea-se.org.br
 Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br
 Fax: XXXX-XXXX

CREA-SE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia de Sergipe





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240392577


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
 Local data


MANOEL MESSIAS SOARES NETO - CPF: 049.126.295-70

Prefeitura Municipal de Pirambu - CNPJ: 13.095.039/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 99,64** Registrada em: **30/07/2024** Valor pago: **R\$ 99,64** Nosso Número: **8203229560**


 Manoel Messias Soares Neto
 Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w6dwA
 Impresso em: 31/07/2024 às 11:53:10 por: , ip: 138.255.229.72





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.569.666/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/02/2023
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
RS ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
RS ENGENHARIA

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
74.10-2-02 - Design de interiores
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R TERENCIO SAMPAIO

NÚMERO
532

COMPLEMENTO

CEP
49.025-700

BAIRRO/DISTRITO
GRAGERU

MUNICÍPIO
ARACAJU

UF
SE

ENDEREÇO ELETRÔNICO
RAFAELA.TEC.ENG@GMAIL.COM

TELEFONE
(79) 9936-0542

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
13/02/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 31/07/2024 às 20:55:27 (data e hora de Brasília).

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **49.569.666/0001-54**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **RS ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 13/02/2023**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar **Gerar PDF**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 49.569.666/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.


Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:54:31 do dia 02/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/03/2025. ✓

Código de controle da certidão: **6A1A.3023.F63D.A3FB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 06 de Agosto de 2024
Nº. 202400513010

CNPJ: 49.569.666/0001-54

Contribuinte: RS ENGENHARIA LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 04/11/2024 ✓

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: HD.0073.0091.JB.082C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 489104 / 2024

Identificação do Solicitante: 49.569.666/0001-54

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **49.569.666/0001-54** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **49.569.666/0001-54** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria N° 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em 03/09/2024 às 09:21:39, válida até 03/10/2024 deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 3 de Setembro de 2024

Autenticação: 20240903GJFDHG



Declaração de Recolhimento do ICMS N. 489109 / 2024

Identificação do Solicitante: 49.569.666/0001-54

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **49.569.666/0001-54** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **49.569.666/0001-54** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria N°.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão. ✓

A presente declaração de recolhimento, emitida em **03/09/2024 às 09:22:59**, válida até **03/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 3 de Setembro de 2024

Autenticação: 20240903ANZMDG

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.569.666/0001-54
Razão Social: RS ENGENHARIA LTDA
Endereço: R TERENCEIO SAMPAIO 532 / GRAGERU / ARACAJU / SE / 49025-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/08/2024 a 19/09/2024 ✓

Certificação Número: 2024082118516021737127

Informação obtida em 03/09/2024 09:25:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.569.666/0001-54

Certidão nº: 60359452/2024

Expedição: 03/09/2024, às 09:30:39

Validade: 02/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.569.666/0001-54**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL

RESULTADO: NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: RS ENGENHARIA LTDA

Tipo de Pessoa: Jurídica

CNPJ: 49.569.666/0001-54

Nome Fantasia: RS ENGENHARIA

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

1. **Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0162658** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **03/09/2024** e válida até **03/10/2024**. ✓

Código de Autenticidade nº **4657.1384.8177.3078**.

20/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408200914b288d725716
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/08/2024 às 06:14:21
Valor Original: R\$ 271,35 **Valor Atualizado:** R\$ 271,35

Origem

Nome: RS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 49569666000154
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 34535215469

Chave de segurança: YV2V4F1WP37UFHYC

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CPF/CNPJ do Empregador 49.569.666		Nome/Razão Social do Empregador RS ENGENHARIA LTDA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124072920198931-0	Tag 49569666 07/2024 MENSAL	
Observações		Pagar este documento até 20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)	
		Valor a recolher 271,35	

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	2	271,35	0,00	0,00	0,00	271,35
Total Geral:		271,35	0,00	0,00	0,00	271,35

Data de geração da Guia: 29/07/2024 às 15:46:46 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



03/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408200911098167a7165
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/08/2024 às 06:12:10
Valor Original: R\$ 1.043,04 **Valor Atualizado:** R\$ 1.043,04

Origem

Nome: RS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 49569666000154
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RECEITA FEDERAL
CNPJ: 00394460005887
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73

Código da operação: 34535161659

Chave de segurança: YV2V4F1WP37UFHYC

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 49.569.666/0001-54	Razão Social RS ENGENHARIA LTDA	Número do Documento 07.16.24211.0819086-1	Pagar este documento até 20/08/2024
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024		Valor Total do Documento 1.043,04
Observações Nº Recibo Declaração: 50000250575288			

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	262,91		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024			
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	678,38		
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024			
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	101,75		
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024			
Totais		1.043,04		

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000010 0	43040385242 8	33071624211 8	08190861984 3

CNPJ: 49.569.666/0001-54
Número: 07.16.24211.0819086-1
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 1.043,04

Pague com o PIX



20/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408202127dd067c919db
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/08/2024 às 18:28:17
Valor Original: R\$ 16.536,97 **Valor Atualizado:** R\$ 16.536,97

Origem

Nome: RS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 49569666000154
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RECEITA FEDERAL
CNPJ: 00394460005887
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 85d7f86c-4533-4a5e-b3bf-3395c0dab8b1

Código da operação: 34571480308
Chave de segurança: YV2V4F1WP37UFHYC

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
49.569.666/0001-54

Razão Social
RS ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.20.24218.6127481-0

Pagar este documento até
20/08/2024

Observações

Valor Total do Documento
16.536,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 07/2024	4.905,97			4.905,97
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 07/2024	5.291,83			5.291,83
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 07/2024	5.209,14			5.209,14
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 07/2024	1.130,03			1.130,03
Totais		16.536,97			16.536,97

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

05/08/2024 12:23:21

85870000165 7 36970328242 1 33072024218 6 61274810782 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85870000165 7 36970328242 1 33072024218 6 61274810782 9



CNPJ: 49.569.666/0001-54
Número: 07.20.24218.6127481-0
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 16.536,97

Pague com o PIX



1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 49.569.666	Nome Empresarial: RS ENGENHARIA LTDA
Data de Abertura: 13/02/2023	Regime de Apuração: Competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 49569666202407001

Período de Apuração (PA): 07/2024

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	308.051,22	0,00	308.051,22
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	787.268,19	0,00	787.268,19
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	996.739,58	0,00	996.739,58
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	119.183,83	0,00	119.183,83
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00	05/2023	10.302,00
06/2023	10.302,00	07/2023	76.468,39	08/2023	10.302,00	09/2023	7.200,00
10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	4.609,44	01/2024	4.609,44
02/2024	4.609,44	03/2024	132.674,52	04/2024	170.528,06	05/2024	152.632,18
06/2024	223.634,72						
2.2.2) Mercado Externo							
02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00	05/2023	0,00
06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00	09/2023	0,00
10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00	01/2024	0,00
02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00	05/2024	0,00
06/2024	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 49.569.666/0001-54	
Município: ARACAJU	UF: SE

Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
--	---

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)								
Receita Bruta Informada: R\$ 308.051,22								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
4.905,97	5.291,83	5.209,14	1.130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,97
Parcela 1: R\$ 308.051,22								
Município: PIRAMBU - SE								
Lançamento de ofício: ISS.								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 308.051,22								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
4.905,97	5.291,83	5.209,14	1.130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,97
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
4.905,97	5.291,83	5.209,14	1.130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,97

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
4.905,97	5.291,83	5.209,14	1.130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,97
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
4.905,97	5.291,83	5.209,14	1.130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,97

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 49569666202407001

Número: 07202421861274810			Data de Vencimento: 20/08/2024			Data limite para acolhimento: 20/08/2024		
IRPJ	4.905,97	CSLL	5.291,83	COFINS	5.209,14	PIS/PASEP	1.130,03	
INSS/CPF	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	16.536,97	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	16.536,97	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		4.905,97			União			

CSLL	5.291,83	União
COFINS	5.209,14	União
PIS	1.130,03	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		
