



Emissão de comprovantes

G3322915058165141
29/05/2024 15:09:26

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:07:36
220602206 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME PIRAMBU-SE - FEB
AGENCIA: 2206-3 CONTA: 15.359-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2024
NR. DOCUMENTO	558.081.000.022.757
VALOR TOTAL	35.910,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIRIUS E C LTDA
AGENCIA: 8081-0 CONTA: 22.757-9
NR. DOCUMENTO 552.206.000.015.359
=====

NR.AUTENTICACAO	B.8A8.8BE.375.D6E.038
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH648496 FABRICIO MUNIZ DOS SANTOS.

PAGO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SME PIRAMBU-SE - FEB
Agência	2206-3
Conta corrente	15359-1

Creditado

Nome	SIRIUS E C LTDA
Agência	8081-0
Conta corrente	22757-9
Valor	35.910,73
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH648495 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO	29/05/2024 15:06:02
	JH648496 FABRICIO MUNIZ DOS SANTOS	29/05/2024 15:07:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH648496 FABRICIO MUNIZ DOS SANTOS.



Entre contas correntes

G3372914587818171
29/05/2024 15:06:02

Debitado

Nome	SME PIRAMBU-SE - FEB
Agência	2206-3
Conta corrente	15359-1

Creditado

Nome	SIRIUS E C LTDA
Agência	8081-0
Conta corrente	22757-9
Valor	35.910,73
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 330953039.

Usuário: JH648495 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO.



Nº Processo
0000429

Nº Fila
2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

TERMO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 50.907.330/0001-33

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS

Bairro: INACIO BARBOSA

E-mail: sectda@gmail.com

Compl: SALA B

Cidade: Aracaju

UF: SE

Telefone: (79)88526-9620

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Conta:

EMPENHO	EMIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	FONTE
0503004	03/05/2024	1011.44905100-15420000	Global	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 55/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO NA UNIDADE DE ENSINO LEONOR BARRETO FRANCO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2024 E CONTRATO 2024/55.

Documentação	
Nota Fiscal	05
Valor	R\$ 39.945,19
Emissão	21/05/2024
Horário de Entrega	22/05/2024 10:36:00

Para acompanhar o andamento do seu processo na fila pública, acesse o link abaixo:

<http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pirambu/fornecedor/filapagamento>

Cadastrado por: Santiago Santos Gois

Secretaria de Controle Interno

☒ Aprovado

☐ Reprovado

Obs. _____



Nº Processo
0000429

Nº Fila
7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

TERMO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 50.907.330/0001-33		
Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		
Endereço: RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS	Compl: SALA B	
Bairro: INACIO BARBOSA	Cidade: Aracaju	UF: SE
E-mail: secltda@gmail.com	Telefone: (79)88526-9620	RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:	Agência:	Conta:
--------	----------	--------

EMPENHO	EMIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	FONTE
0503004	03/05/2024	1011.44905100-15420000	Global	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 55/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO NA UNIDADE DE ENSINO LEONOR BARRETO FRANCO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2024.

Documentação

Nota Fiscal	05
Valor	R\$ 39.945,19
Emissão	21/05/2024
Horário de Entrega	22/05/2024 10:36:00

Para acompanhar o andamento do seu processo na fila pública, acesse o link abaixo:

www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pirambu/fornecedor/filapagamento

Cadastrado por: Santiago Santos Gois

Secretaria de Controle Interno

- ☒ Aprovado
☐ Reprovado

Obs. ANEXAR ITENS QUE
FALTAM DO CHECKLIST ANEXO - OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

21/05/2024 15:52:04

Período de Competência

05/2024

Município de Prestação do

Serviço

Pirambu - SE

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte
(ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em
Pirambu

Nota: 2024000

00000005

Código Verificação

6Q9X-CXUA



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Nome Fantasia

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES

CPF/CNPJ

50.907.330/0001-33

Inscrição Municipal

1440598

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

SECLTDA@GMAIL.COM

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 98852-6962

Endereço

Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, SALA B, Inácio Barbosa - CEP: 49040-830 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MUNICIPIO DE PIRAMBU

CPF/CNPJ

13.095.039/0001-81

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3276-1693

E-mail

sec.obraseurbanismo@gmail.com

Endereço

PC NOSSA SRA DE LOURDES, 16 - CENTRO - CEP: 49190-000 - Pirambu - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4213800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Nº02/2024, referente aos serviços de Execução dos Serviços de Reforma da Escola 1ª de Ensino Fundamental Franco no município de Pirambu, Estado de Sergipe. Conforme Contrato nº 55/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
DECLARO QUE

- ☒ Os serviços foram prestados
☐ Os produtos foram entregues
☐ A obra foi executada

Data: 29/05/2024
Engenheiro Civil
CREA-SE 271797661-2

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

39.945,19

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

39.945,19

Alíquota (%)

2,5000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

998,63

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

38.946,56

Valor Total da Nota (R\$)

39.945,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 5.372,63 Federal e R\$ 1.997,26 Municipal. Fonte: IBPT [244637]

Visualizado em: 21/05/2024 15:52:04

Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

RECEBIDO
Em 22/05/2024
Spt



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

ORDEM DE SERVIÇO

**VIGÊNCIA:
13/03/2024**

CONTRATO: N° _55/2024

OBJETO DO CONTRATO: Contrato de empreitada por preço global para
**REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO LOCALIZADA NA SEDE
DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU, SERGIPE "**

PRAZO DO CONTRATO: 12 meses

DATA DO CONTRATO: 13 de Março de 2024

RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


CONTRATADA: SIRIUS ENGENHARIA E

CONSTRUÇÕES LTDA

Tendo em vista o instrumento contratual acima descrito, celebrado com esta Prefeitura, fica Vossa Senhoria cientificado de que o prazo para início dos serviços objeto do contrato começará a partir de 18/03/2024.

Outrossim, informamos que foi designado pela Prefeitura Municipal de Pirambu, o engenheiro Manoel Messias Soares Neto, para fiscalização dos serviços.

Pirambu, 18 de Março de 2024




**Prefeitura de Pirambu
Guilherme Jullius Zacarias de Melo
PREFEITO**

CIENTE:

 Documento assinado digitalmente
MANOEL MESSIAS SOARES NETO
Data: 18/03/2024 11:31:03-0300
verifique em <https://validar.io.gov.br>

Engº Fiscal: _____

Firma Contratada: _____



FATURA DO BOLETIM 02/2024

CONTRATO Nº 55/2024

**SIRIUS ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕES**

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA
DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU,
ESTADO DE SERGIPE.**

RECEBIDO
Em 22/05/24

Recebido
22/05/24
Alais dos Santos
Secretaria Municipal de Obras
Matrícula Nº 3333885-1001

Aracaju - SE. 21 de maio de 2024

À
Prefeitura Municipal de Pirambu – SE.

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16, Centro.

Pirambu - Estado de Sergipe.

Prezado Senhor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, nossa **Fatura de serviços nº 02/2024**, referente a **Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco no município de Pirambu, Estado de Sergipe**. Conforme **Contrato nº 55/2024** ao mesmo tempo em que solicitamos de Vossa Senhoria se digne homologar.

BANCO: BANCO DO BRASIL
AG.: 8081-0
CONTA CORRENTE: 22757-9

Atenciosamente,



SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Ana Maria Santos
Sócia Administradora

FATURA Nº. 02/2024

CONTRATO Nº 55/2024 – PREFEITURA DE PIRAMBU-SE.

OBRA: Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco Localizada na Sede do município de Pirambu, Estado de Sergipe.

01 – VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 39.945,19
Importa a presente fatura em (Trinta e nove mil novecentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos).


SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Ana Maria Santos
Sócia Administradora

ARACAJU (SE) 21 de maio de 2024

R E C I B O

R\$ 39.945,19

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pirambu – SE a importância de **R\$39.945,19 (Trinta e nove mil novecentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos)**, referente à **Fatura de Serviços Nº. 02/2024**, correspondente a **Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco Localizada na Sede do município de Pirambu, Estado de Sergipe.** Conforme contrato nº 55/2024.

Aracaju SE. de de


SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Ana Maria Santos
Sócia Administradora


SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.

Local : PIRAMBU/SE.

CONTRATO	PERÍODO:	BOLETIM Nº
55/2024	09/04/2024 a 22/04/2024	BM 02



ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$				Medido	%
				ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO		
01	REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO												
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES												
01.01.001	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00	1,00		1,00	862,55	862,55	-	862,55	862,55	100,0%	
01.01.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	11,80	11,80		11,80	28,36	334,65	-	334,65	334,65	100,0%	
01.01.003	Pintura de meio fio (caliação)	m	144,90			0,00	4,61	-	-	-	667,99	0,0%	
01.01.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af. 08/2022	m2	112,35		112,35	112,35	73,68	-	8.277,95	8.277,95	8.277,95	100,0%	
01.01.005	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	144,90		144,90	144,90	40,98	-	5.938,00	5.938,00	5.938,00	100,0%	
TOTAL DO ITEM 01.01							1.197,20	14.215,95	15.413,15	16.081,14	16.081,14	95,8%	
01.02	ELEVAÇÕES												
01.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,52			0,00	56,45	-	-	-	255,15	0,0%	
01.02.002	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	6,00		1,92	1,92	552,6	-	1.060,99	1.060,99	3.315,60	32,0%	
01.02.003	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	m2	11,00			0,00	121,86	-	-	-	1.340,46	0,0%	
01.02.004	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	67,80		46,80	46,80	48,87	-	2.287,12	2.287,12	3.313,39	69,0%	
01.02.005	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	6,00		5,23	5,23	2.515,61	-	13.156,64	13.156,64	15.093,66	87,2%	
01.02.006	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	135,60		135,00	135,00	7,41	-	1.000,35	1.000,35	1.004,80	99,6%	
01.02.007	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5cm - Revisado 08/2015	m2	135,60		135,00	135,00	35,02	-	4.727,70	4.727,70	4.748,71	99,6%	
01.02.008	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m2	1233,60			0,00	15,27	-	-	-	18.837,07	0,0%	

BOLETIM DE MEDIÇÃO										CONTRATO		PERÍODO:		BOLETIM Nº		SIRIUS	
OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.										55/2024		09/04/2024 a 22/04/2024		BM 02		CONSTRUÇÕES	
Local : PIRAMBU/SE.																	
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$			%						
				ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL		CONTRATO					
01.02.009	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	1233,60			0,00	17,09	-	-	-	21.082,22	0,0%					
01.02.010	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01	m	22,60			0,00	37,76	-	-	-	853,38	0,0%					
01.02.011	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal	m3	213,36			0,00	4,65	-	-	-	992,12	0,0%					
01.02.012	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	213,36			0,00	29,41	-	-	-	6.274,92	0,0%					
01.02.013	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e encerramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	120,86			0,00	60,59	-	-	-	7.322,91	0,0%					
01.02.014	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2	92,50			0,00	57,37	-	-	-	5.306,73	0,0%					
01.02.015	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	101,86			0,00	120,18	-	-	-	12.241,53	0,0%					
01.02.016	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02	m2	101,86			0,00	57,85	-	-	-	5.892,60	0,0%					
TOTAL DO ITEM 01.02								-	22.232,80	22.232,80	107.875,25	20,6%					
01.03	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS																
01.03.001	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	5,00			0,00	40,65	-	-	-	203,25	0,0%					
01.03.002	Revisão de ponto de água tipo 1	un	7,00			0,00	30,19	-	-	-	211,33	0,0%					
01.03.003	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 02	m	28,00			0,00	47,05	-	-	-	1.317,40	0,0%					
01.03.004	Tubo pvc rígido clanel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	50,00			0,00	21,83	-	-	-	1.091,50	0,0%					
TOTAL DO ITEM 01.03								-	-	-	2.823,48	0,0%					
01.04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																
01.04.001	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	20,00			0,00	28,11	-	-	-	562,20	0,0%					
01.04.002	Revisão de ponto de tomada simples com reposição de fios e fiação	pt	20,00			0,00	116,34	-	-	-	2.326,80	0,0%					
01.04.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroauto p/encolado embutido Ø 3/4"	un	6,00			0,00	318,49	-	-	-	1.910,94	0,0%					

Resp. Técnico - CREA 27088145/2
Ana Maria Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE 27197651-2

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR
BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.

Local : PIRAMBU/SE.

CONTRATO

PERÍODO:
09/04/2024
a
22/04/2024

BOLETIM Nº

BM 02



ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$				Medido	%
				ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO		
01.04.004	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletrodo de pvc rígido Ø 3/4"	un	6,00			0,00	286,42	-	-	-	1.718,52	0,0%	
01.04.005	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletrodo de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	5,00			0,00	299,56	-	-	-	1.497,80	0,0%	
01.04.006	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	20,00			0,00	104,00	-	-	-	2.080,00	0,0%	
01.04.007	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	2,00			0,00	62,90	-	-	-	125,80	0,0%	
01.04.008	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	3,00			0,00	67,41	-	-	-	202,23	0,0%	
01.04.009	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3,00			0,00	294,18	-	-	-	882,54	0,0%	
01.04.010	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c	m	300,00			0,00	7,43	-	-	-	2.229,00	0,0%	
01.04.011	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c	m	300,00			0,00	9,13	-	-	-	2.739,00	0,0%	
	TOTAL DO ITEM 01.04							-	-	-	16.274,83		
01.05	MURO												
01.05.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m2	131,05	120,00	11,05	131,05	316,42	37.970,40	3.496,44	41.466,84	41.466,84	100,0%	
01.05.002	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (seção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios	m²	65,60			0,00	421,88	-	-	-	27.675,33	0,0%	
	TOTAL DO ITEM 01.05							37.970,40	3.496,44	41.466,84	69.142,17		
01.06	ESQUADRIAS												
01.06.001	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af. 12/2019	un	11,00			0,00	1.044,90	-	-	-	11.493,90	0,0%	
01.06.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		46,20			0,00	22,34	-	-	-	1.032,11	0,0%	
01.06.003	Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas		9,20			0,00	368,59	-	-	-	3.391,03	0,0%	
01.06.004	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo pantográfico Andromeda Sandus Resp. Técnico - CREA 27088/14571 fechadura		12,80			0,00	384,20	-	-	-	4.917,76	0,0%	

7

7

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA : EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICIPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.

Local : PIRAMBU/SE.

CONTRATO
55/2024


PERÍODO:
09/04/2024
a
22/04/2024

BOLETIM Nº
BM 02

SIRIUS
CONSTRUÇÕES

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$				Medido %
				ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	
TOTAL DO ITEM 01.06												
01.07	LOUÇAS E METAIS											
	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	4,00			0,00	813,70	-	-	-	20.834,80	0,0%
01.07.001	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	1,00			0,00	551,57	-	-	-	551,57	0,0%
01.07.002	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm. assentada	un	2,00			0,00	2.656,52	-	-	-	5.313,04	0,0%
01.07.003	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	2,00			0,00	1.155,70	-	-	-	2.311,40 ; 11.430,81	0,0%
TOTAL DO ITEM 01.07												
01.08	DIVERSOS											
01.08.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00			0,00	2.420,29	-	-	-	2.420,29	0,0%
TOTAL DO ITEM 01.08												
								39.167,60	39.945,19	79.112,79	246.882,77	32,04%

Atesto que os serviços acima foram executados.
Pirambu-Sergipe, __/__/2024

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Ana Maria Santos
Resp. Técnico - CREA 2708814672
SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

ANOTAÇÕES:


SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
EMPRESA CNPJ
09.584.562/0001-22

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2024

OBRA:: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LOCALIZAÇÃO	UNID	QUANT
01	REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022 Cálculo: $67,00 \times 1,70 = 113,90 \text{ m}^2$	m2	112,35
01.01.005	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 Cálculo: 94,0 m	m	144,90
01.02	ELEVAÇÕES		
01.02.002	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte Cálculo: $0,70 \times 0,30 \times 0,40 \times 10 \text{ unid} = 0,84 \text{ m}^3$ $9,00 \times 0,30 \times 0,40 = 1,08 \text{ m}^3$ Total=1,92 m³	m3	1,92
01.02.004	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 Cálculo: $27,00 \times 0,90 = 24,30 \text{ m}^2$ $9,00 \times 2,50 = 22,50 \text{ m}^2$ Total=46,80m²	m2	46,80
01.02.005	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) Cálculo: $0,20 \times 0,30 \times 3,00 \times 10 \text{ unid} = 1,80 \text{ m}^3$ $27,00 \times 0,15 \times 0,25 = 1,00 \text{ m}^3$ $29,00 \times 0,15 \times 0,25 = 1,09 \text{ m}^3$ $0,30 \times 0,30 \times 2,95 = 0,27 \text{ m}^3$ $0,30 \times 0,30 \times 3,35 = 0,32 \text{ m}^3$ $0,25 \times 0,20 \times 4,34 = 0,22 \text{ m}^3$ $0,25 \times 0,20 \times 3,50 = 0,18 \text{ m}^3$ $0,20 \times 0,20 \times 2,68 = 0,11 \text{ m}^3$ $0,20 \times 0,20 \times 3,02 = 0,13 \text{ m}^3$ $3,50 \times 0,15 \times 0,20 = 0,11 \text{ m}^3$ Total=5,23 m³	m3	5,23
01.02.006	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 Cálculo: $27,00 \times 2,50 \times 2 = 135,00 \text{ m}^2$	m2	135,60
01.02.007	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm Cálculo: $27,00 \times 2,50 \times 2 = 135,00 \text{ m}^2$	m2	135,60
01.02	MURO		
01.02.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar. Cálculo: $4,42 \times 2,50 = 11,05 \text{ m}^2$	m²	11,05

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Ana Maria Santos
Resp. Técnico - CREA 2708814672

Manoel Messias dos Reis Neto
Engenheiro Civil
CREA-SE 271797661-2

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DA
ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

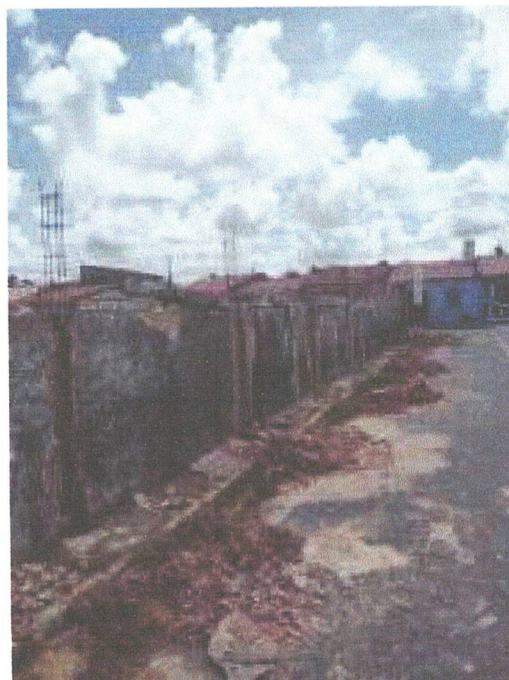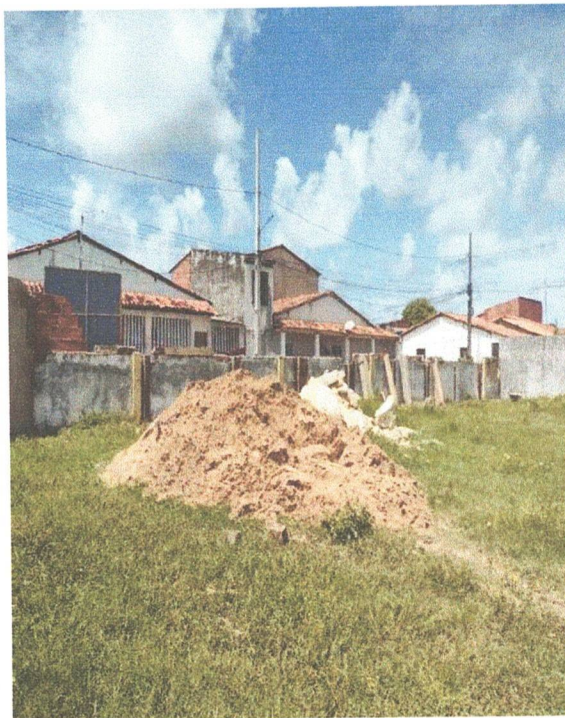


Manoel Manoel Soares Neto
Engenheiro Civil
CREA-SE 271797651-2

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ana Maria Santos
Téc. Técnico - CREA 2708814672

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DA
ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

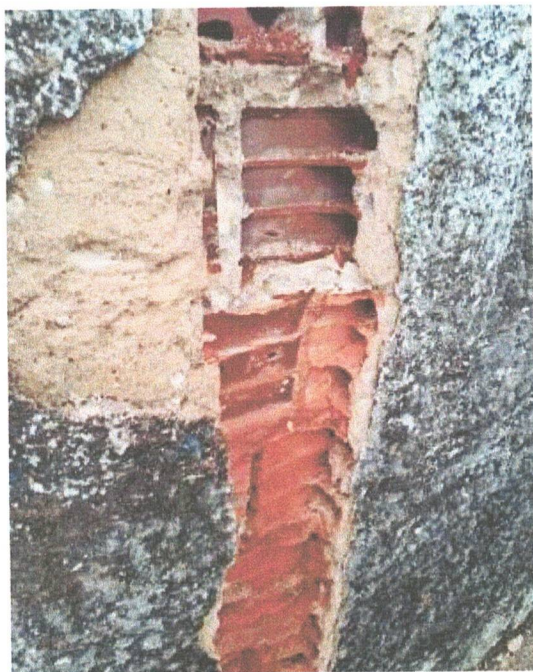


Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil
CREA-SE 271/97661-2

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com


SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ana Maria Santos
CREA 2708814672

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DA
ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

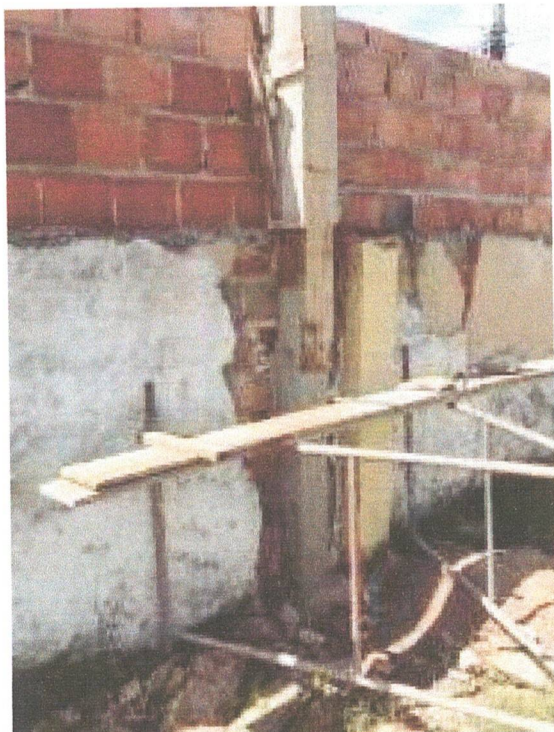

Handwritten signature
Manoel de Oliveira Martins
Engenheiro Civil
CREA-SE 271797663


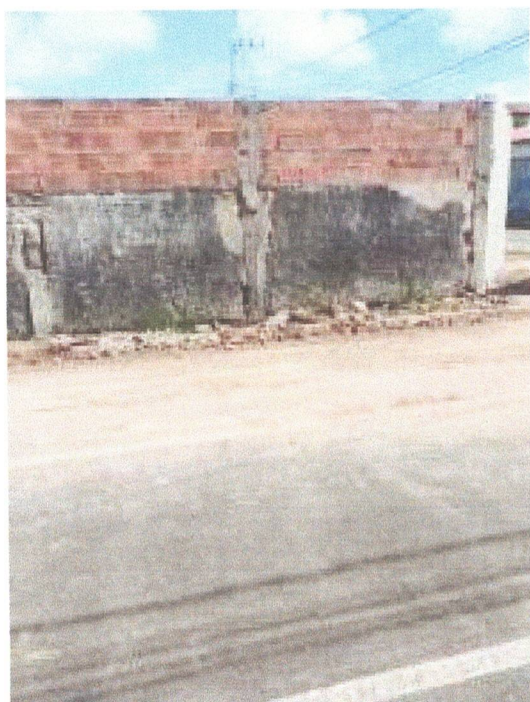


SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Handwritten signature
Ana Maria Santos
Técnico - CREA 270881467

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DA
ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

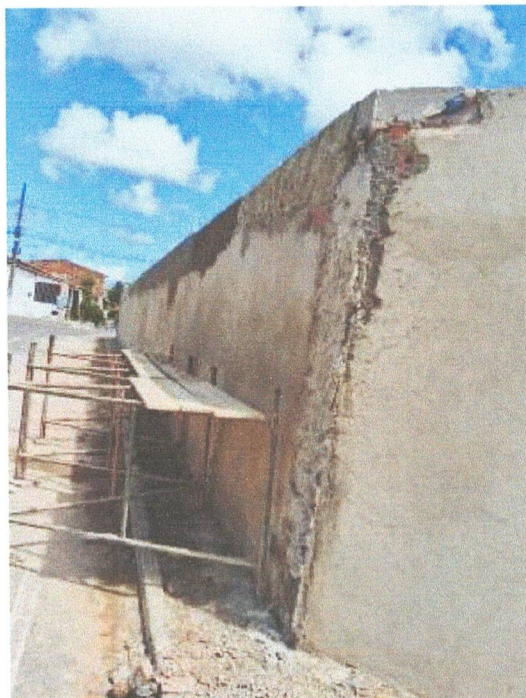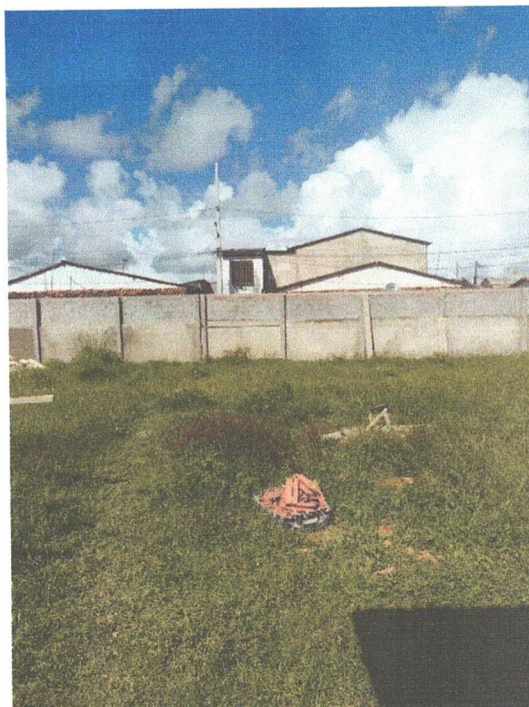

Manoel Máximo Serar Neto
Engenheiro Civil
CREA-SE 271797661-2

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ana Maria Santos
Coord. Técnico - CREA 2708814672

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DA
ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**



Manoel de Oliveira Martins
Engenheiro Civil
CREA-SE 27175761-2




SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com


SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

Ana Maria Santos
Eng. Técnico - CREA 270881-2

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DA
ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

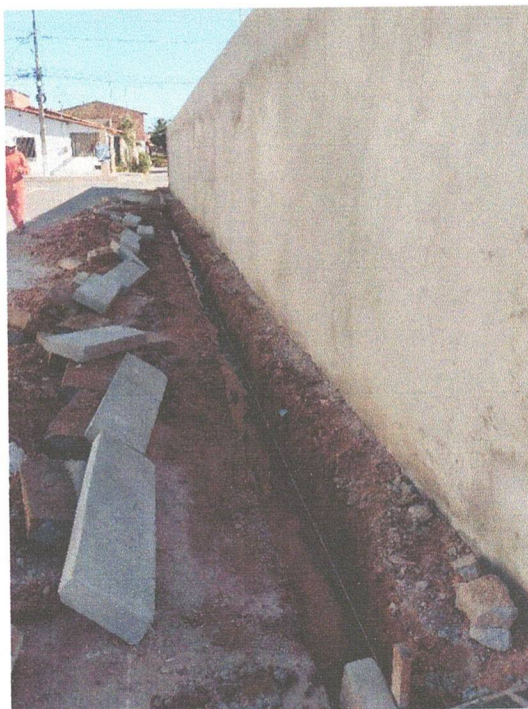

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil
CREA-SE 271787661-2

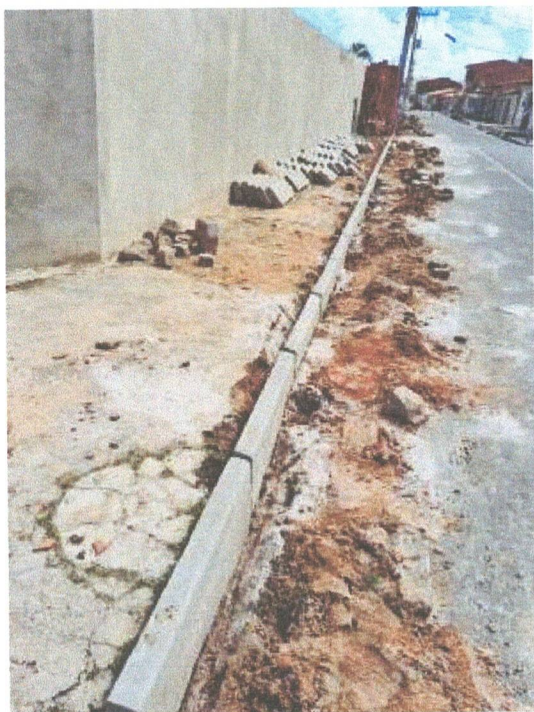


SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com


SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Ana Maria Santos
Res. Técnico - CREA 2708814672

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DA
ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

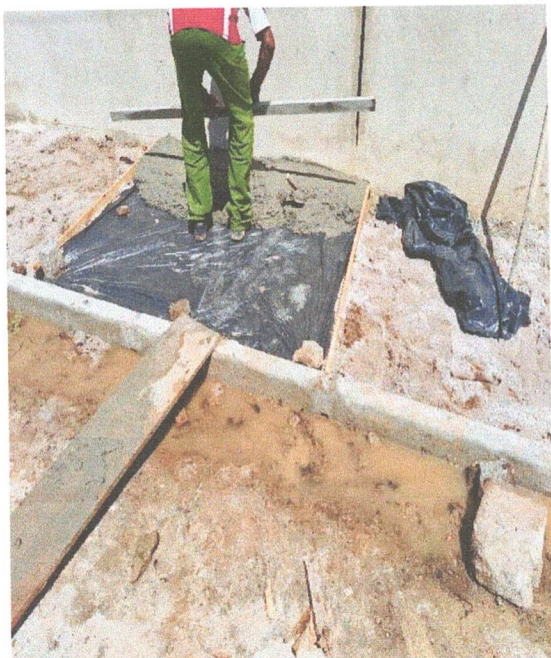

[Handwritten signature]
Engenheiro Civil
CREA-SE 271797631

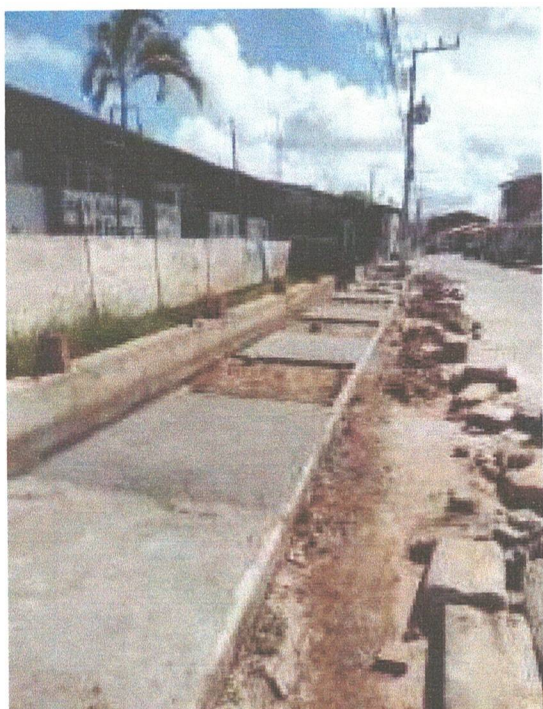

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33





Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio B... SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962

EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

[Handwritten signature]
Ana Maria Santos
Resp. Técnico - CREA 2708814672

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DA
ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

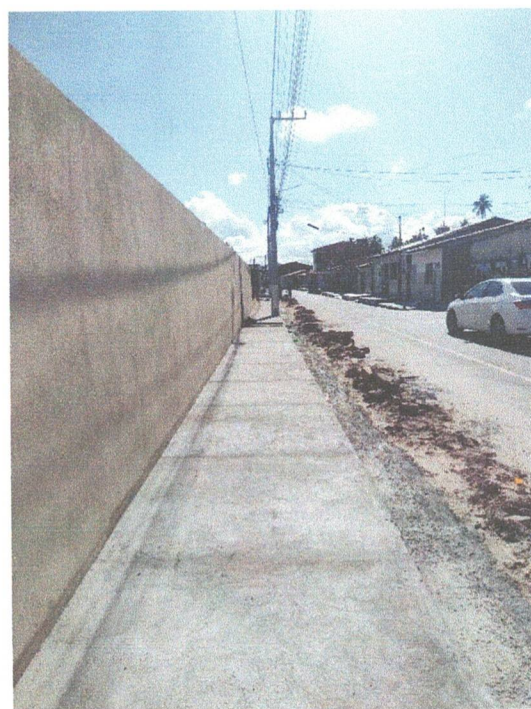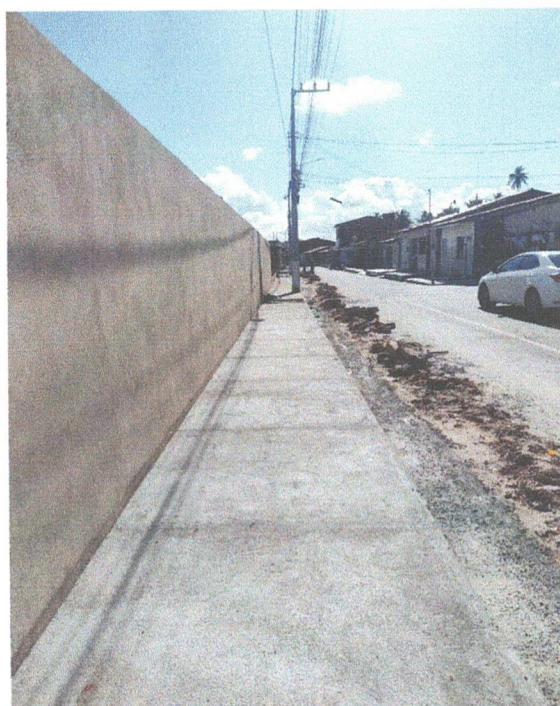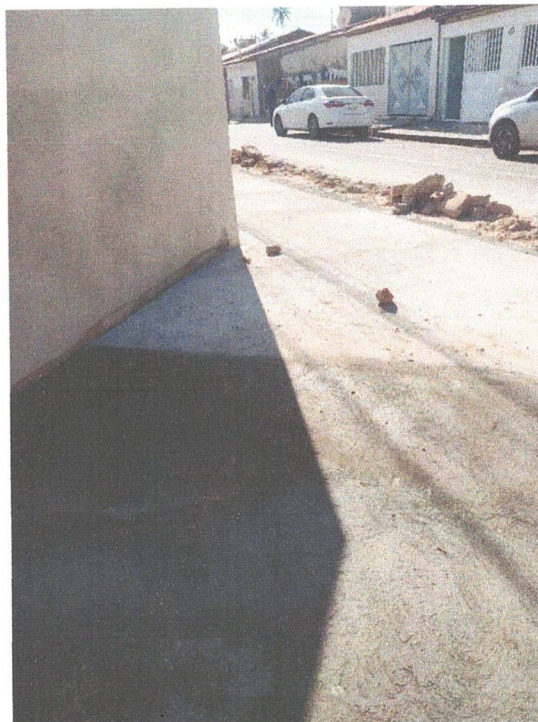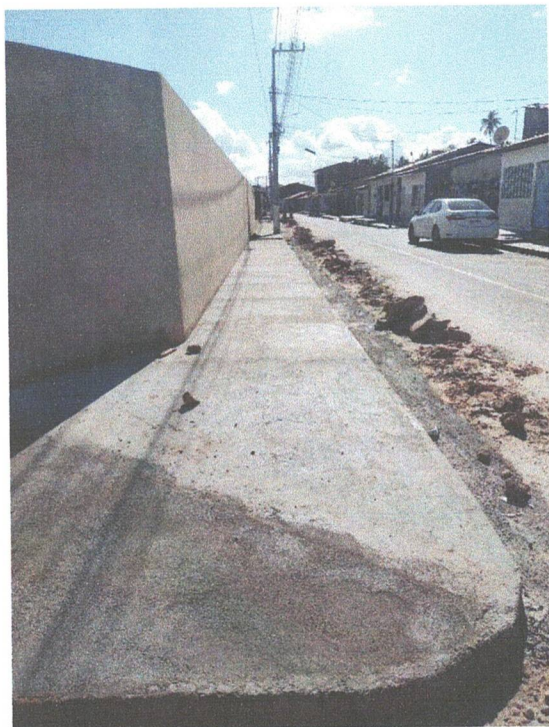

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ana Maria San
Resp. Técnico – CREA 270



DIARIO DE OBRA

OBJETO:SERVIÇOS DE REFORNA DA ESCOLA LEONOR BARRETO
FRANCO - PIRAMBU-SERGIPE

CONTRATO Nº: 55/2024

SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES

DATA : 09/04/2024

Continua a execução do muro da fachada da escola e da demolição de alvenaria de bloco como também a retirada dos gradis de ferro. Tempo bom.

DATA : 10/04/2024

Continua a execução dos serviços do dia anterior. Tempo bom.

DATA : 11/04/2024

Conclusão da retirada dos gradis de ferro e da execução, muro e mureta da fachada da escola. Início das demolições do muro existente na lateral da escola para a execução do reforço de sua estrutura e aumento da altura para 2,50 m. Tempo bom.

DATA : 12/04/2024

Continua o reforço estrutural do muro lateral da escola. Tempo bom.

DATA : 15/04/2024

Continua a execução dos serviços do dia anterior. Como também e retirada dos meio fio existente na fachada da escola. Tempo bom.

DATA : 16/04/2024

Conclusão do reforço estrutural do muro existente e da retirada de meio fio e do reboco existente no muro. Iniciou a execução do serviço de reboco de parede do muro da lateral da escola e a execução da colocação dos novos meio fio pré-moldada de

DATA : 17/04/2024

Continua a execução dos serviços do dia anterior. Tempo bom.

Manoel Manoel Soares Neto
Engenheiro Civil
CREA-SE 271797652-2

DATA : 18/04/2024

Conclusão da colocação dos meio fio pré-moldado e Iniciou da execução da calçada em concreto moldado in loco desempolado na fachada da escola Tempo nublado.

DATA : 19/04/2024

Continua a execução da calçada em concreto moldado in loco desempolado na fachada da escola e da colocação do meio fio em concreto desempolado. Tempo bom.

DATA : 22/04/2024

Conclusão do revestimento do muro da lateral da escola e iniciou da execução da ferragem das sapatas do prédio da área de lazer. Tempo bom.

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Engenheiro civil:

Ana Maria Santos
Resp. Técnico CREA 2708814672

Fiscal da obra:



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 470378/2024

Emissão: 11/02/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 5b2d7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: ANA MARIA SANTOS

Registro: 2708814672

CPF: 312.***-**-20

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 03/10/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Restrições: PORTOS E VIAS NAVEGAVEIS, POCOS, AEROPORTOS E FERROVIAS.

Instituição de Ensino: ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA PIO DECIMO

Data de Formação: 07/08/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000207977

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Data Início: 28/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Registro: 0000207977

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 50.000,00

Data do Capital: 01/06/2023

Faixa: 1

Objetivo Social Pleno: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA: AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, E DIVISÓRIAS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS.

Endereço Matriz: RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS, 229, SALA B, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU, SE, 49040830

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 26/06/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000020842DDSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANA MARIA SANTOS

Registro: 2708814672

CPF: 312.***.***-20

Data Início: 28/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE

Registro: 2702649815

CPF: 103.***.***-91





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 471918/2024

Emissão: 07/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 20159

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Data Início: 06/09/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGOS 7º e 25 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Marcos Antônio Soares Neto
Engenheiro Civil
CREA-SE 271797661-2





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANA MARIA SANTOS

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 2708814672

Registro: 0000001279SE

Empresa contratada: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro : 0000207977-SE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU -SERGIPE

PRAÇA NOSSA SENHORA DE LURDES

Complemento:

Cidade: PIRAMBU

Bairro: CENTRO

UF: SE

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

Nº: 16

CEP: 49190000

Contrato: 55/2024

Valor: R\$ 246.882,77

Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 13/03/2024

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA GEMIRO DOS SANTOS

Complemento:

Cidade: PIRAMBU

Data de Início: 18/03/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU -SERGIPE

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: SE

CEP: 49190000

Previsão de término: 15/06/2024

Coordenadas Geográficas: -10.633969, -36.803492

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

4. Atividade Técnica

16 - Execução

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #TOS_1.1.6 - DE MURO

Quantidade

Unidade

101,86

m2

131,05

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRAMBU
SERGIPE CONFORME CONTRATO n.º 55/2024

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.º 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao CREA-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SERGIPE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data

ANA MARIA SANTOS - CPF: 312.095.995-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU -SERGIPE - CNPJ:
13.095.039/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 262,55

Registrada em: 01/04/2024

Valor pago: R\$ 262,55

Nosso Número: 8203074143

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 99ZA3
Impresso em: 07/04/2024 às 18:15:10 por: , ip: 189.70.218.124



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.907.330/0001-33
Razão Social: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: R MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS 229 SALA B / INACIO BARBOSA / ARACAJU / SE / 49040-830

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/05/2024 a 13/06/2024 ✓

Certificação Número: 2024051519536105315408

Informação obtida em 21/05/2024 00:57:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 05 de Março de 2024
Nº. 202400484225

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Contribuinte: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 03/06/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: CH.0027.0018.BI.079C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 50.907.330/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 00:42:08 do dia 21/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/11/2024. ✓

Código de controle da certidão: **CF72.90D1.80DB.E10E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 237600/2024

Inscrição Estadual: 27.197.535-0
Razão Social: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 50.907.330/0001-33
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Endereço: RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS SALA B 229
INACIO BARBOSA - ARACAJU CEP: 49040830

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está regular com os recolhimentos do ICMS, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade da empresa aqui qualificada, após a emissão deste documento.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790, de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **21/05/2024 10:11:16**, é válida até **20/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 21 de Maio de 2024

Autenticação:20240521O3M3Q1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 237589 / 2024

Inscrição Estadual: 271975350

Razão Social: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 50907330000133

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Endereço: RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS SALA B 229 , INACIO BARBOSA
- ARACAJU CEP: 49040830

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressaltando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **21/05/2024**, válida até **20/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240521O3M0PL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Certidão n°: 4503342/2024

Expedição: 19/01/2024, às 05:34:52

Validade: 17/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **50.907.330/0001-33**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 50.907.330/0001-33

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/06/2023

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra		Nome da obra		Data do cadastramento
90.018.68401/71		SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		04/04/2024 17:36
Origem do cadastramento e-CAC				
Tipo Zona	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Zona Urbana	SE20240373270			55/2024
Data do início da obra		CNAE		
18/03/2024		4399103 Obras de alvenaria		

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	18/03/2024

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	PIRAMBU	SE	49.190-000
Bairro	Logradouro	Número	
CENTRO	RUA GEMIRO DOS SANTOS	S/N	

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	50.907.330/0001-33	Construtora
Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade	
18/03/2024		

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
13.095.039/0001-81	MUNICIPIO DE PIRAMBU

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Comercial salas e lojas	Alvenaria	131,05 m²

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Reforma	Comercial salas e lojas	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	131,05 m²	0,00 m²	131,05 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra
131,05 m²



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL

RESULTADO: NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Tipo de Pessoa: Jurídica

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Nome Fantasia: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

1. Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0073112** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **10/05/2024** e válida até **09/06/2024**.

Código de Autenticidade nº **6808.7851.7470.9117**.

CPF/CNPJ do Empregador
50.907.330

Nome/Razão Social do Empregador
SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124051509018884-3

Tag
50907330 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher
263,76

Observações

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	2	263,76	0,00	0,00	0,00	263,76
Total Geral:		263,76	0,00	0,00	0,00	263,76

Data de geração da Guia: 15/05/2024 às 00:34:39 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Comprovante de transferência

Segunda-feira, 20 de Maio de 2024 às 19:12:38

R\$ 263,76

MERCADO PAGO

• De

Ana Maria Santos

CPF ***.095.995-**

Mercado Pago

Agência 0001

Número da conta 21275143858

Conta de pagamento

• Para

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF 00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0647

Número da conta 99990005370003603055

Conta corrente

ID da transação Pix

E1057352120240520221254XbAVhuJGC

Código de verificação

78533183891



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240374873

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

MANOEL MESSIAS SOARES NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2717976612

Registro: 2717976612SE

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pirambu**

RUA RUA GIVALDO MOURA DA SILVA

Complemento:

Cidade: **PIRAMBU**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

CPF/CNPJ: **13.095.039/0001-81**

Nº: **16**

CEP: **49190000**

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 4.000,00**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PIRAMBU

Complemento:

Cidade: **PIRAMBU**

Data de Início: **18/03/2024**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Pirambu**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

Nº: **s/n**

CEP: **49190000**

Previsão de término: **17/06/2024**

Coordenadas Geográficas: **-10.738536, -36.856371**

Código: **49190-000**

CPF/CNPJ: **13.095.039/0001-81**

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
 EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #TOS_1.1.6 - DE MURO

Quantidade

101,86

131,05

Unidade

m2

m2

5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

ART referente ao serviço de fiscalização, da Reforma da Escola Leonor Barreto Franco, na Sede do Município de Pirambu-SE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MANOEL MESSIAS SOARES NETO - CPF: 049.126.295-70

Local

data

Prefeitura Municipal de Pirambu - CNPJ: 13.095.039/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 99,64**

Registrada em: **18/04/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **8203107269**



Documento assinado digitalmente
MANOEL MESSIAS SOARES NETO
 Data: 22/05/2024 10:28:28-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WZ32b
 Impresso em: 22/05/2024 às 10:28:49 por: , ip: 192.168.100.1

www.crea-se.org.br
 Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br
 Fax: XXXX-XXXX



CREA-SE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia de Sergipe

