



Emissão de comprovantes

G3351814514873791
18/09/2024 14:56:40

18/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:07
220602206 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME PIRAMBU-SE - FEB
AGENCIA: 2206-3 CONTA: 15.359-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2024
NR. DOCUMENTO	558.081.000.022.757
VALOR TOTAL	47.473,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIRIUS E C LTDA	
AGENCIA: 8081-0 CONTA: 22.757-9	
NR. DOCUMENTO	552.206.000.015.359
=====	
NR.AUTENTICACAO	5.214.A2C.CA1.621.9D9

PAGO



G335181451487379009
18/09/2024 14:56:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME PIRAMBU-SE - FEB
Agência 2206-3
Conta corrente 15359-1

Creditado

Nome SIRIUS E C LTDA
Agência 8081-0
Conta corrente 22757-9
Valor 47.473,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH648496 FABRICIO MUNIZ DOS SANTOS	18/09/2024 14:52:05
	JH648495 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO	18/09/2024 14:56:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH648495 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO.



Entre contas correntes

G3351814444632641
18/09/2024 14:52:05

Debitado

Nome	SME PIRAMBU-SE - FEB
Agência	2206-3
Conta corrente	15359-1

Creditado

Nome	SIRIUS E C LTDA
Agência	8081-0
Conta corrente	22757-9
Valor	47.473,58
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 354995661.

Usuário: JH648496 FABRICIO MUNIZ DOS SANTOS.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

SETEMBRO/2024

Nota de Liquidação: 0918007

Fonte: 15420000 - Transferências do FUNDEB -
Complementação da União - VAAT

Data: 18/09/2024

FORNECEDOR

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA CNPJ/CPF: 50.907.330/0001-33
Endereço: RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS, 229 Compl: SALA B
Bairro: INACIO BARBOSA Cidade: Aracaju UF: SE
E-mail: secltda@gmail.com Telefone: (79)88526-9620 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
SubFunção: 365 Educação Infantil
Programa: 0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
Ação: 1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações
SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo
Fonte: 15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Marcador: 15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Centro Custo:

EMPENHO

EMIÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR

SALDO ATUAL

0503004

03/05/2024

68.941,61

53.102,44

15.839,17

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 55/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO NA UNIDADE DE ENSINO LEONOR BARRETO FRANCO, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2024 E CONTRATO 2024/55.

HISTÓRICO DA LIQUIDACÃO

NOTA FISCAL 0014/2024 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 55/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO NA UNIDADE DE ENSINO LEONOR BARRETO FRANCO, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2024 E CONTRATO 2024/55.

Documento

Nota Fiscal (14 / Série: A / UF: SE / Emissão: 15/09/2024)

Valor

53.102,44

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito

123210601 - Obras em Andamento

Conta Crédito

213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar

Valor

53.102,44

Retenção

21881010201-Inss

21881010403-Imposto de Renda - Outros rendimentos

21881010801-Iss

Valor

3.504,76

796,54

1.327,56

CINQUENTA E TRÊS MIL E CENTO E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Retido: 5.628,86

Total Liquido: 47.473,58



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
Termo de Entrega de Documentos



TERMO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 50.907.330/0001-33

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Endereço: RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS

Bairro: INACIO BARBOSA

E-mail: secltda@gmail.com

Compl: SALA B

Cidade: Aracaju

Telefone: (79)88526-9620

UF: SE

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Conta:

EMPENHO	EMIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	FONTE
0503004	03/05/2024	1011.44905100-15420000	Global	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 55/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO NA UNIDADE DE ENSINO LEONOR BARRETO FRANCO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2024 E CONTRATO 2024/55.

Documentação

Nota Fiscal 14
Valor R\$ 53.102,44
Emissão 15/09/2024
Horário de Entrega 18/09/2024 13:05:09

Para acompanhar o andamento do seu processo na fila pública, acesse o link abaixo:

<http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pirambu/fornecedor/filapagamento>

Cadastrado por: Santiago Santos Gois

☒ Aprovado
☐ Reprovado
Obs. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Nota: 2024000

00000014

Código Verificação

2WT5-PDF2



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

15/09/2024 18:48:03

Período de Competência

09/2024

Município de Prestação do

Serviço

Pirambu - SE

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte
(ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em
Pirambu

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES

Email

SECLTDA@GMAIL.COM

CPF/CNPJ

50.907.330/0001-33

Inscrição Municipal

1440598

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 98852-6962

Endereço

Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, SALA B, Inácio Barbosa - CEP: 49040-830 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PIRAMBU

CPF/CNPJ

13.095.039/0001-81

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3276-1693

E-mail

sec.obraseurbanismo@gmail.com

Endereço

AV CESAR VALDEMIR BOMFIM ROCHA, 16 - Centro - CEP: 49190-000 - Pirambu - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Fatura de Serviços n.º 07/2024, referente aos serviços de Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco no município de Pirambu, Estado de Sergipe. Conforme Contrato n.º 55/2024

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

3.504,76

IR (R\$)

796,54

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

53.102,44

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

53.102,44

Alíquota (%)

2,5000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

1.327,56

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

47.473,58

Valor Total da Nota (R\$)

53.102,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 7.142,28 Federal e R\$ 2.655,12 Municipal. Fonte: IBPT [19CB11]

Visualizado em: 15/09/2024 18:48:03

Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2

FATURA Nº. 07/2024

CONTRATO Nº 55/2024 – PREFEITURA DE PIRAMBU-SE.

OBRA: Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco Localizada na Sede do município de Pirambu, Estado de Sergipe.

01 – VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 53.102,44
Importa a presente fatura em (Cinquenta e três mil cento e dois reais e quarenta e quatro centavos).

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Ana Maria Santos
Sócia Administradora

ARACAJU (SE) 13 de setembro de 2024

R E C I B O

R\$ 53.102,44

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pirambu – SE a importância de **R\$53.102,44(cinquenta e três mil cento e dois reais e quarenta e quatro centavos)**, referente à Fatura de Serviços Nº. 07/2024, correspondente a Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco Localizada na Sede do município de Pirambu, Estado de Sergipe. Conforme contrato nº 55/2024.

Aracaju SE. de de

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Ana Maria Santos
Sócia Administradora

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

FATURA DO BOLETIM 07/2024

CONTRATO Nº 55/2024

**SIRIUS ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕES**

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA
DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU,
ESTADO DE SERGIPE.**

Aracaju - SE. 13 de setembro de 2024

À
Prefeitura Municipal de Pirambu – SE.

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16, Centro.

Pirambu - Estado de Sergipe.

Prezado Senhor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, nossa **Fatura de serviços nº 07/2024**, referente a **Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco no município de Pirambu, Estado de Sergipe**. Conforme **Contrato nº 55/2024** ao mesmo tempo em que solicitamos de Vossa Senhoria se digne homologar.

BANCO: BANCO DO BRASIL
AG.: 8081-0
CONTA CORRENTE: 22757-9

Atenciosamente,



SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Ana Maria Santos
Sócia Administradora

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO										CONTRATO		PERÍODO:		BOLETIM Nº		SIRIUS ENGENHARIA	
OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.										55/2024		01/06/2024 a 10/07/2024		BM 07			
Local : PIRAMBU/SE.																	
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$			% Medido						
				ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL							
01	REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO																
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES																
	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00	1,00		1,00	862,55	862,55	-	862,55	862,55	100,0%					
01.01.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	11,80	11,80		11,80	28,36	334,65	-	334,65	334,65	100,0%					
01.01.002	Pintura de meio fio (calçada)	m	144,90				4,61	-	-	-	667,99	0,0%					
01.01.003	Execução de passelo (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022	m2	112,35	112,35		112,35	73,68	8.277,95	-	8.277,95	8.277,95	100,0%					
01.01.004	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	144,90	144,90		144,90	40,98	5.938,00	-	5.938,00	5.938,00	100,0%					
01.01.005	TOTAL DO ITEM 01.01							15.413,15	-	15.413,15	16.081,14	95,8%					
01.02	ELEVAÇÕES																
01.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,52	4,52		4,52	56,45	255,15	-	255,15	255,15	100,0%					
01.02.002	Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	6,00	6,00		6,00	552,6	3.315,60	-	3.315,60	3.315,60	100,0%					
01.02.003	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	m2	11,00	11,00		11,00	121,86	1.340,46	-	1.340,46	1.340,46	100,0%					
01.02.004	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	67,80	67,80		67,80	48,87	3.313,39	-	3.313,39	3.313,39	100,0%					
01.02.005	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	6,00	6,00		6,00	2.515,61	15.093,66	-	15.093,66	15.093,66	100,0%					
01.02.006	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	135,60	135,60		135,60	7,41	1.004,80	-	1.004,80	1.004,80	100,0%					
01.02.007	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia) - Revisado 08/2015	m2	135,60	135,60		135,60	35,02	4.748,71	-	4.748,71	4.748,71	100,0%					
01.02.008	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores de escolha - Revisado 08/2015	m2	1233,60	1158,40		1.158,40	15,27	17.688,77	-	17.688,77	18.837,07	93,9%					

Manoel Messias Soares Neto

Página 1 de 4

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN nº 27197661-2

ATA Nº 001/2024
resp. Técnico - CREA 27088145/2

BOLETIM DE MEDIÇÃO													
OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.													
Local : PIRAMBU/SE.													
CONTRATO			PERÍODO:		BOLETIM Nº		SIRIUS ENGENHARIA						
55/2024			01/06/2024 a 10/07/2024		BM 07								
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$			%		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL		CONTRATO	Medido
01.02.009	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	1233,60	1.160,00		1.160,00	17,09	19.824,40	-	21.082,22	94,0%		
01.02.010	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01	m	22,60	22,60		22,60	37,76	853,38	-	853,38	100,0%		
01.02.011	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal	m3	213,36	213,360		213,36	4,65	992,12	-	992,12	100,0%		
01.02.012	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	213,36	213,36		213,36	29,41	6.274,92	-	6.274,92	100,0%		
01.02.013	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e encerramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	120,86			120,86	60,59	-	7.322,91	7.322,91	100,0%		
01.02.014	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2	92,50			92,50	57,37	-	5.306,73	5.306,73	100,0%		
01.02.015	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	101,86	101,86		101,86	120,18	12.241,53	-	12.241,53	100,0%		
01.02.016	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02	m2	101,86	101,86		101,86	57,85	5.892,60	-	5.892,60	100,0%		
TOTAL DO ITEM 01.02								92.839,49	12.629,64	105.469,13	97,8%		
INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS													
01.03.001	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	5,00	5,00		5,00	40,65	203,25	-	203,25	100,0%		
01.03.002	Revisão de ponto de água tipo 1	un	7,00	7,00		7,00	30,19	211,33	-	211,33	100,0%		
01.03.003	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEl, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 02	m	28,00	28,00		28,00	47,05	1.317,40	-	1.317,40	100,0%		
01.03.004	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	50,00	50,00		50,00	21,83	1.091,50	-	1.091,50	100,0%		
TOTAL DO ITEM 01.03								2.823,48	-	2.823,48	100,0%		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
01.04.001	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	20,00	20,00		20,00	28,11	562,20	-	562,20	100,0%		
01.04.002	Revisão de ponto de tomada simples com 2 polos e 1 tomada e da fiação	pt	20,00	20,00		20,00	116,34	2.326,80	-	2.326,80	100,0%		
01.04.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto 20mm e embutido Ø 3/4"	un	6,00	6,00		6,00	318,49	-	1.910,94	1.910,94	100,0%		
TOTAL DO ITEM 01.04								562,20	1.910,94	2.473,14	100,0%		

Manoel Mesias Soares Neto

Ana Maria Soares

Rec. Técnico - CREA 2708814572

Página 2 de 4

Resp. Técnico: **Manoel Messias Soares Neto**
 CREA 27/088145/7Z
 Selo Profissional: 
 Página 2 de 4

BOLETIM DE MEDIÇÃO												
OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.												
Local : PIRAMBU/SE.												
CONTRATO			PERÍODO:		BOLETIM Nº		SIRIUS ENGENHARIA					
55/2024			01/06/2024 a 10/07/2024		BM 07							
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$			Medido	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL		
01.04.004	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	un	6,00		6,00	6,00	286,42	-	1.718,52	1.718,52	100,0%	
01.04.005	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	5,00		5,00	5,00	299,56	-	1.497,80	1.497,80	100,0%	
01.04.006	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	20,00		20,00	20,00	104,00	-	2.080,00	2.080,00	100,0%	
01.04.007	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	2,00		2,00	2,00	62,90	-	125,80	125,80	100,0%	
01.04.008	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	3,00		3,00	3,00	67,41	-	202,23	202,23	100,0%	
01.04.009	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3,00		1,00	1,00	294,18	-	294,18	882,54	33,3%	
01.04.010	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	300,00		300,00	300,00	7,43	-	2.229,00	2.229,00	100,0%	
01.04.011	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	300,00		300,00	300,00	9,13	-	2.739,00	2.739,00	100,0%	
	TOTAL DO ITEM 01.04							2.889,00	12.797,47	15.686,47	16.274,83	
01.05	MURO											
	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m2	131,05	131,05		131,05	316,42	41.466,84	-	41.466,84	100,0%	
01.05.001	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (seção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios	m²	65,60		65,60	65,60	421,88	-	27.675,33	27.675,33	100,0%	
01.05.002	TOTAL DO ITEM 01.05							41.466,84	27.675,33	69.142,17	69.142,17	
01.06	ESQUADRIAS											
	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação, af 12/2019	un	11,00	11,00		11,00	1.044,90	11.493,90	-	11.493,90	100,0%	
01.06.001	Pintura de acabamento com aplicação e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira	m2	46,20				22,34	-	-	-	1.032,11	0,0%
01.06.002	Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm	m2	9,20	9,20		9,20	368,59	3.391,03	-	3.391,03	3.391,03	100,0%
01.06.003												

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003

Portão em tubo de aço galvanizado, 1,50x4,00x3,00m, 12mm

01.06.003</

Manoel Messias Soares Neto
 27/10/2024

Resp. Técnico - CREA 27088146/2

BOLETIM DE MEDIÇÃO										SIRIUS ENGENHARIA	
OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.										CONTRATO	BOLETIM Nº
Local : PIRAMBU/SE.										55/2024	BM 07
										PERÍODO:	
										01/06/2024	10/07/2024
										a	
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$			% Medido
				ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	
01.06.004	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo pantográfica, inclusive fechadura	m2	12,80			0,00	384,20	-	-	-	0,0%
TOTAL DO ITEM 01.06											
01.07	LOUÇAS E METAIS										
	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	4,00			0,00	813,70	-	-	-	0,0%
01.07.001	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	1,00			0,00	551,57	-	-	-	0,0%
01.07.002	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2,00			2,00	2.656,52	5.313,04	-	5.313,04	100,0%
01.07.003	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	2,00			2,00	1.155,70	2.311,40	-	2.311,40	100,0%
01.07.004								7.624,44	-	7.624,44	66,7%
TOTAL DO ITEM 01.07											
01.08	DIVERSOS										
01.08.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00			0,00	2.420,29	-	-	-	0,0%
TOTAL DO ITEM 01.08											
								177.941,16	53.102,44	231.043,60	93,58%
ANOTAÇÕES:											
Atesto que os serviços acima foram executados. Pirambu-Sergipe, __/__/2024											
SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA											
Ana Maria Santos Resp. Técnico - CREA 2708814572											
SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA											
Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil - CREA 27119564-2											

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.907.330/0001-33
Razão Social: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: R MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS 229 SALA B / INACIO BARBOSA
/ ARACAJU / SE / 49040-830

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/09/2024 a 05/10/2024

Certificação Número: 2024090621466105315445

Informação obtida em 14/09/2024 15:37:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 26 de Agosto de 2024
Nº. 202400516762

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Contribuinte: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 24/11/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: JH.0097.0037.DH.083C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: **50.907.330/0001-33**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 00:42:08 do dia 21/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/11/2024.

Código de controle da certidão: **CF72.90D1.80DB.E10E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 513430 / 2024

Inscrição Estadual: 27.197.535-0
Razão Social: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 50.907.330/0001-33
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Endereço: RUA - MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS - SALAB - 229
INACIO BARBOSA - ARACAJU - CEP:49040830

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **14/09/2024 às 15:56:09, válida até 14/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 14 de Setembro de 2024

Autenticação: 20240914ADTNYI



Declaração de Recolhimento do ICMS N. 513434 / 2024

Identificação do Solicitante: 50.907.330/0001-33

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **50.907.330/0001-33** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **50.907.330/0001-33** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **14/09/2024 às 16:10:47, válida até 14/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 14 de Setembro de 2024

Autenticação: 20240914AUJJLZ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Certidão n°: 39819294/2024

Expedição: 07/06/2024, às 07:14:18

Validade: 04/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 50.907.330/0001-33, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 470378/2024

Emissão: 11/02/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 5b2d7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: ANA MARIA SANTOS

Registro: 2708814672

CPF: 312.***-**-20

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 03/10/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Restrições: PORTOS E VIAS NAVEGAVEIS, POCOS, AEROPORTOS E FERROVIAS.

Instituição de Ensino: ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA PIO DECIMO

Data de Formação: 07/08/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000207977

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Data Início: 28/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANA MARIA SANTOS

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 2708814672

Registro: 0000001279SE

Empresa contratada: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000207977-SE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU -SERGIPE

PRAÇA NOSSA SENHORA DE LURDES

Complemento:

Cidade: PIRAMBU

Bairro: CENTRO

UF: SE

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

Nº: 16

CEP: 49190000

Contrato: 55/2024

Valor: R\$ 246.882,77

Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 13/03/2024

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA GEMIRO DOS SANTOS

Complemento:

Cidade: PIRAMBU

Data de Início: 18/03/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU -SERGIPE

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: SE

CEP: 49190000

Previsão de término: 15/06/2024

Coordenadas Geográficas: -10.633969, -36.803492

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

4. Atividade Técnica

16 - Execução

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #TOS_1.1.6 - DE MURO

Quantidade

Unidade

101,86

m2

131,05

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRAMBU
SERGIPE CONFORME CONTRATO n.º 55/2024

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.º 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado a Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar


7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SERGIPE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, de _____ de _____
Local data


ANA MARIA SANTOS - CPF: 312.095.995-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU -SERGIPE - CNPJ:
13.095.039/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 262,55

Registrada em: 01/04/2024

Valor pago: R\$ 262,55

Nosso Número: 8203074143

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publicar/>, com a chave: 99ZA3
Impresso em: 07/04/2024 às 18:15:10 por: , ip: 189.70.218.124





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 471918/2024

Emissão: 07/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 20159

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Data Início: 06/09/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGOS 7º e 25 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 471918/2024

Emissão: 07/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 20159

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Registro: 0000207977

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 50.000,00

Data do Capital: 01/06/2023

Faixa: 1

Objetivo Social Pleno: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA: AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, E DIVISÓRIAS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS.

Endereço Matriz: RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS, 229, SALA B, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU, SE, 49040830

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 26/06/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000020842DDSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANA MARIA SANTOS

Registro: 2708814672

CPF: 312.***.***-20

Data Início: 28/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Profissional: RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE

Registro: 2702649815

CPF: 103.***.***-91





CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Informações da obra

Número de inscrição da obra	Nome da obra	Data do cadastramento		
90.018.68401/71	SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	04/04/2024 17:36		
Origem do cadastramento e-CAC				
Tipo Zona	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Zona Urbana	SE20240373270			55/2024
Data do início da obra	CNAE			
18/03/2024	4399103 Obras de alvenaria			

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	18/03/2024

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	PIRAMBU	SE	49.190-000
Bairro	Logradouro	Número	
CENTRO	RUA GEMIRO DOS SANTOS	S/N	

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	50.907.330/0001-33	Construtora
Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade	
18/03/2024		

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
13.095.039/0001-81	MUNICIPIO DE PIRAMBU

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Comercial salas e lojas	Alvenaria	131,05 m²

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Reforma	Comercial salas e lojas	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	131,05 m²	0,00 m²	131,05 m²

Área Resultante



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

ORDEM DE SERVIÇO

**VIGÊNCIA:
13/03/2024**

CONTRATO: N°_55/2024

OBJETO DO CONTRATO: Contrato de empreitada por preço global para
**REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO LOCALIZADA NA SEDE
DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU, SERGIPE "**

PRAZO DO CONTRATO: 12 meses

DATA DO CONTRATO: 13 de Março de 2024

RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


CONTRATADA: SIRIUS ENGENHARIA E

CONSTRUÇÕES LTDA

Tendo em vista o instrumento contratual acima descrito, celebrado com esta Prefeitura, fica Vossa Senhoria cientificado de que o prazo para início dos serviços objeto do contrato começará a partir de 18/03/2024.

Outrossim, informamos que foi designado pela Prefeitura Municipal de Pirambu, o engenheiro Manoel Messias Soares Neto, para fiscalização dos serviços.

Pirambu, 18 de Março de 2024



Prefeitura de Pirambu
Guilherme Jullius Zacarias de Melo
PREFEITO


CIENTE:



Documento assinado digitalmente
MANOEL MESSIAS SOARES NETO
Data: 18/03/2024 11:31:03-0300
verifique em <https://validar.id.gov.br>

Engº Fiscal: _____

Firma Contratada: _____



OBRA:: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LOCALIZAÇÃO	UNID	QUANT
01	REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO		
01.02	ELEVAÇÕES		
01.02.013	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e encerramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado Cálculo: $16,36 \times 7,39 = 120,86 \text{ m}^2$ Total = 120,86 m²	m2	120,86
01.02.014	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada Cálculo: $8,90 \times 3,90 = 34,70 \text{ m}^2$ $16,50 \times 3,50 = 57,80 \text{ m}^2$ Total = 92,50 m²	m2	92,50
01.04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
01.04.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" Cálculo: Total = 6,00 unid	un	6,00
01.04.004	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" Cálculo: Total = 6,00 unid	un	6,00
01.04.005	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento Cálculo: Total = 5,00 unid	pt	5,00
01.04.006	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01 Cálculo: Total = 20,00 unid	un	20,00
01.04.007	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) Cálculo: Total = 2,00 unid	un	2,00
01.04.008	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B Cálculo: Total = 3,00 unid	un	3,00
01.04.009	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores Cálculo: Total = 1,00 unid	un	1,00
01.04.010	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm² (fio 12) - 450/750v / 70°C Cálculo: Total = 300,00 m	m	300,00
01.04.011	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm² (fio 10) - 450/750v / 70°C Cálculo: Total = 300,00 m	m	300,00
01.05	ESQUADRIAS		
01.05.002	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (seção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios Cálculo: $32,32 \times 2,03 = 65,60 \text{ m}^2$ Total = 65,60 m²	m²	65,60

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Ana Maria Santos
Resp. Técnico - CREA 2708814672

Manoel Massias Soares Neto
Engenheiro CREA RN - nº 271797661-2

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DA
ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

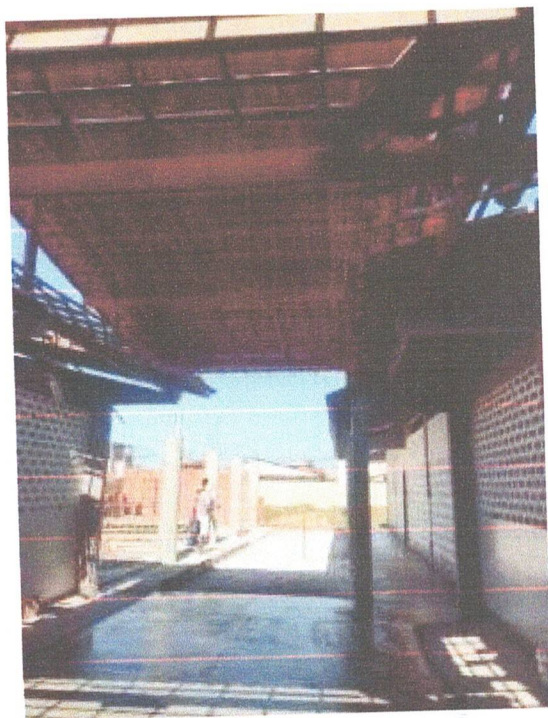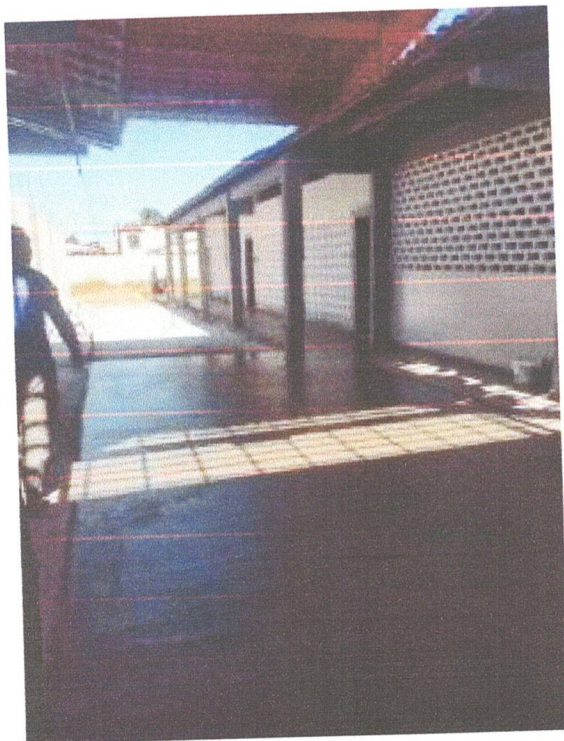

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33

Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa

Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962

EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Ana Maria Santos
Resp. Técnico - CREA 2708814672

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN. nº 271797661-2

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DA
ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**







SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ana Maria Santos
Resp. Técnico – CREA 2708814672

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - nº 271797661 - 2

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DA
ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

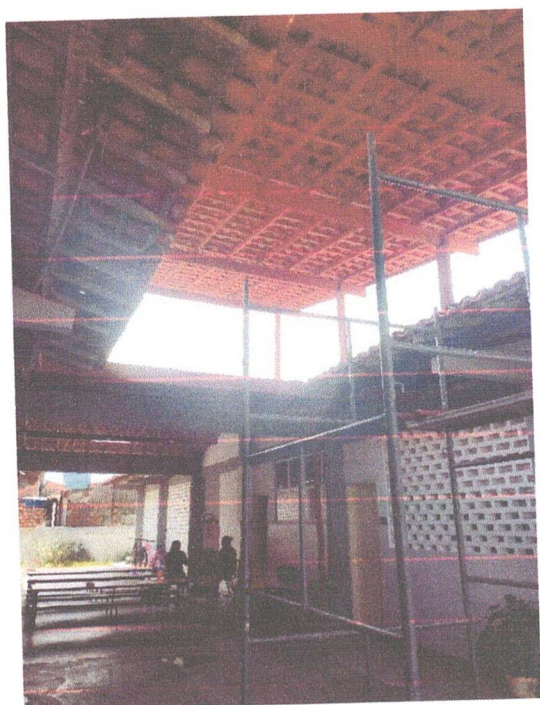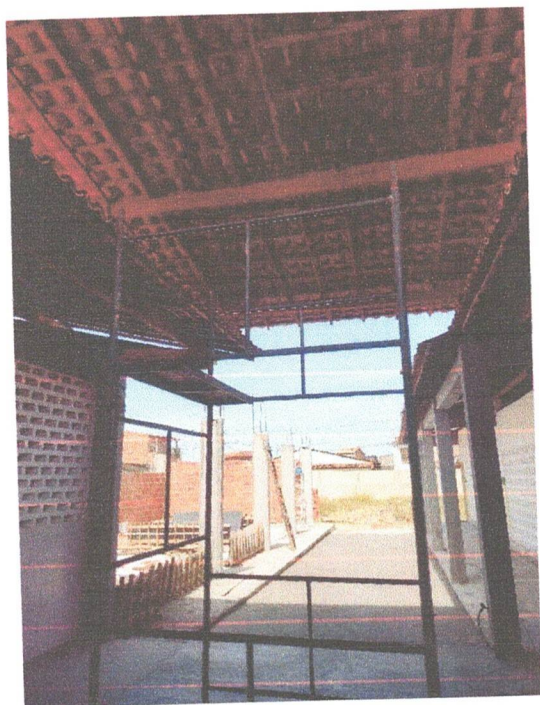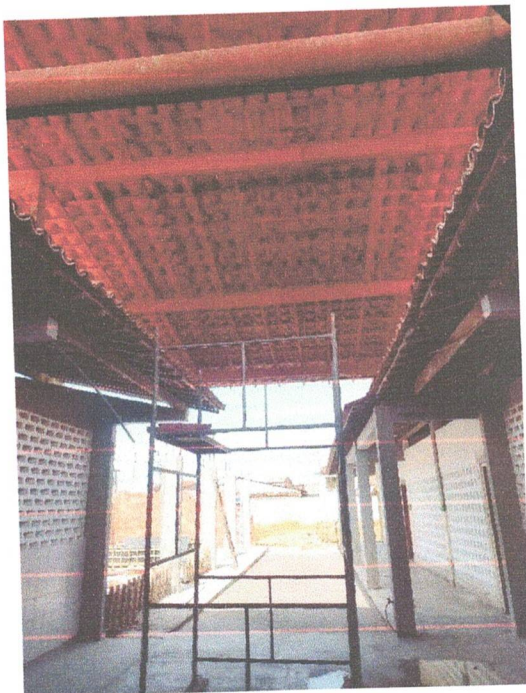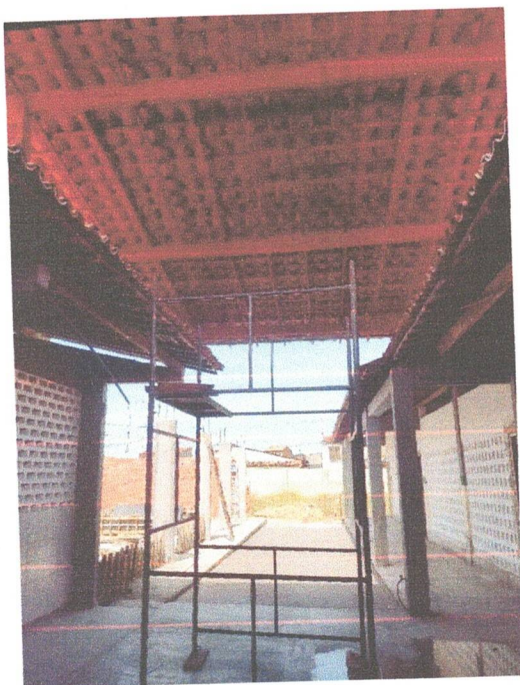

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33

Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa

Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962



EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ana Maria Santos
Resp. Técnico - CRA 2708814672

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661 - 2

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DA
ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

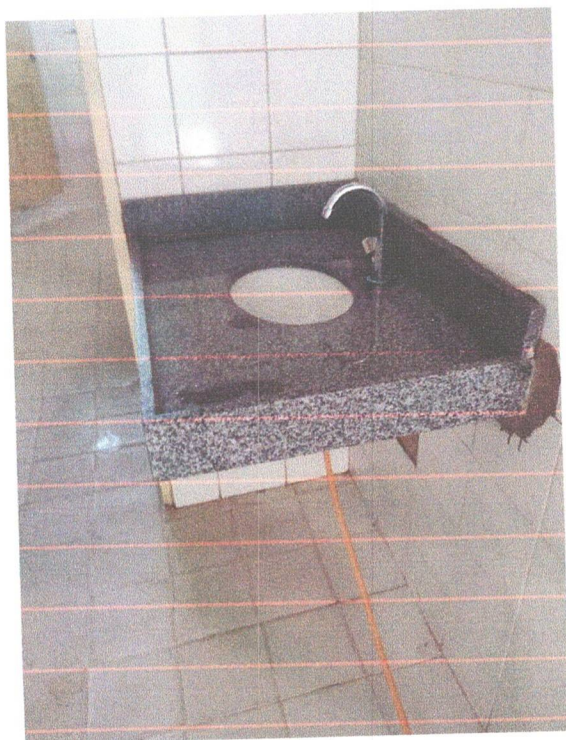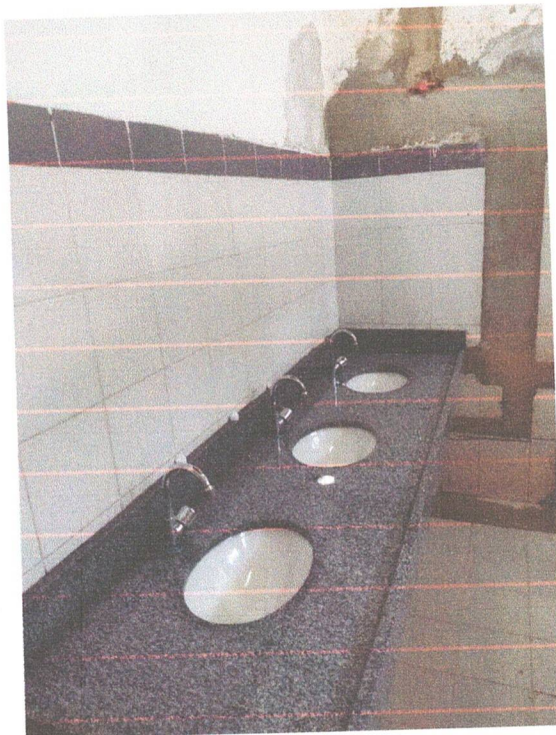

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33

Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa

Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962





EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ana Maria Santos
Resp. Técnico - CREA 2708814672

Manoel Massias Soares Neto
Engenheiro Civil - RN - nº 271797661-7

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DA
ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

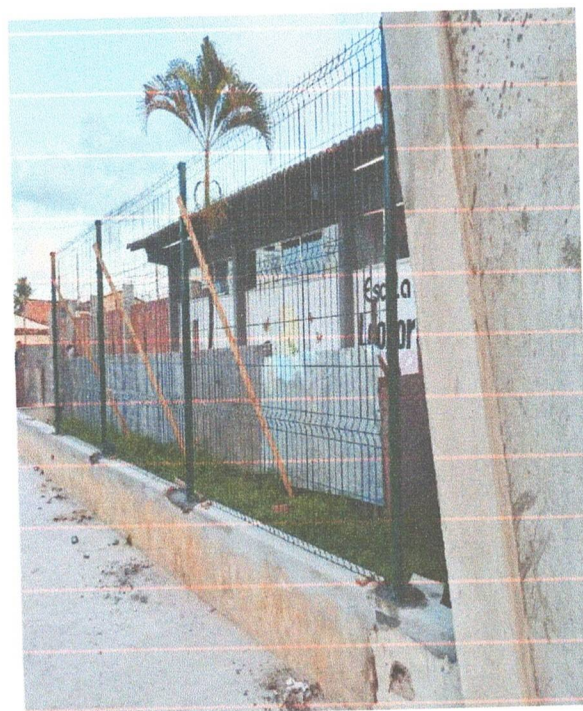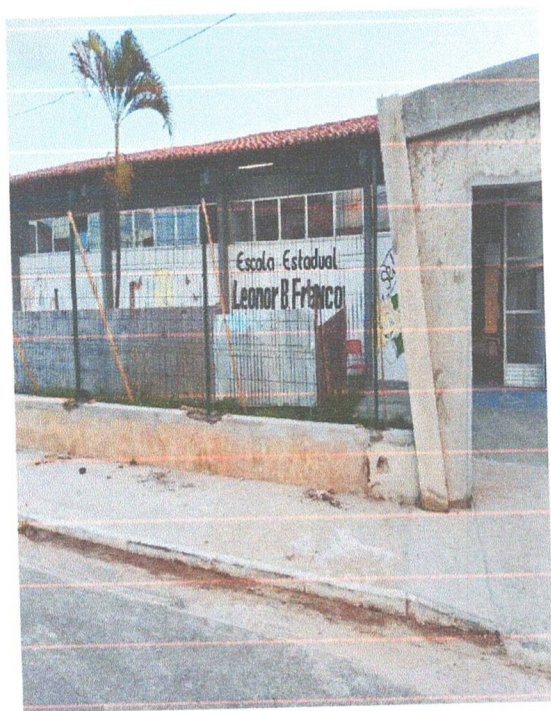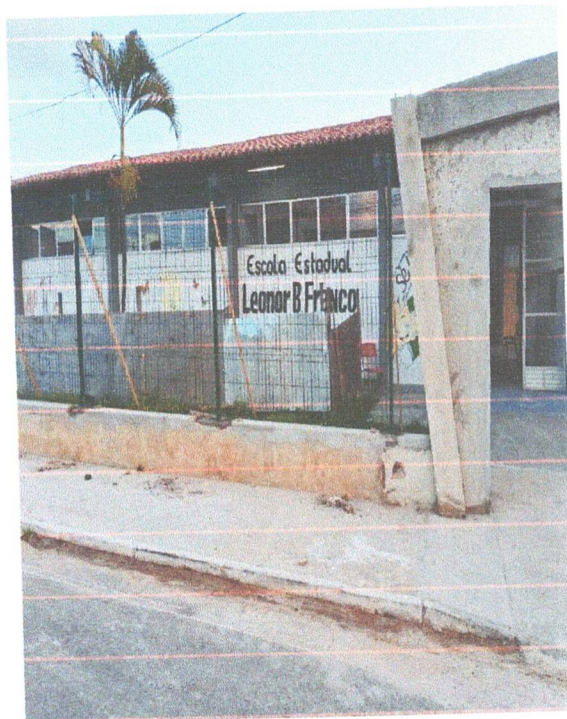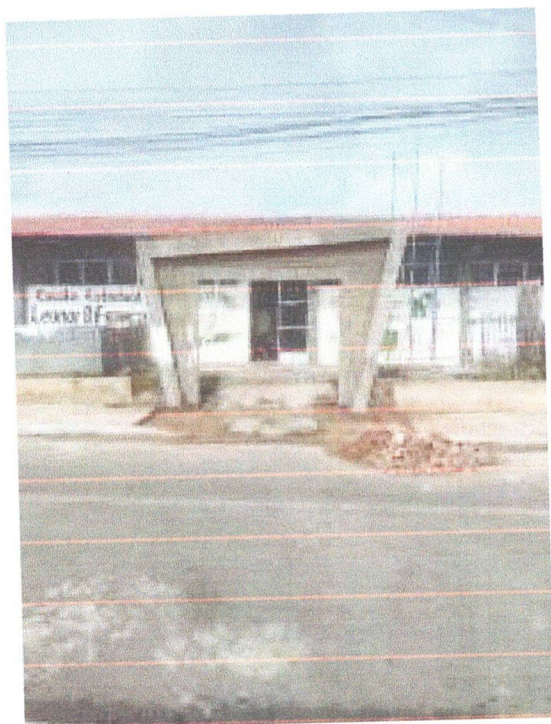

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33

Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa

Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962

EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ana Maria Santos
Resp. Técnico - CREA 2708814672

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2



DIARIO DE OBRA

OBJETO:SERVIÇOS DE REFORNA DA ESCOLA LEONOR BARRETO
FRANCO - PIRAMBU-SERGIPE

CONTRATO Nº: 55/2024

SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES

DATA 03/06/2024

Foi inicio o serviço de execução do piso de alta resistência com o lançamento das fitas. Tempo bom.

DATA 04/06/2024

Continua os serviços do dia anterior. Tempo bom.

DATA 05/06/2024

Continua os serviços do piso de alta resistência. Tempo bom.

DATA 06/06/2024

Continua os serviços do piso de alta resistência. Tempo bom.

DATA 07/06/2024

Continua os serviços do piso de alta resistência. Tempo bom.

DATA 10/06/2024

Continua os serviços do piso de alta resistência. Tempo bom.

DATA 11/06/2024

Continua os serviços do piso de alta resistência. Tempo bom.

DATA 12/06/2024

Hoje foi concluído a primeira parte da execução do piso de alta resistência ficando pendente o polimento. Tempo bom.

DATA 13/06/2024

Iniciamos a execução das novas instalações elétricas e revisão na existente. Tempo bom.

DATA 14/06/2024

Segue a execução dos serviços do dia anterior. Tempo bom.

DATA 17/06/2024

Segue a execução dos serviços do dia anterior. Tempo bom.

DATA 18/06/2024

Segue a execução dos serviços do dia anterior. Tempo bom.

DATA 19/06/2024

Segue a execução dos serviços do dia anterior. Tempo bom.

DATA 20/06/2024

Hoje as instalações elétricas foram paralisadas para a continuidade do piso de alta resistência com o polimento. Tempo bom

DATA 21/06/2024

A execução do polimento do piso de alta resistência foi concluído. Tempo bom

Engenheiro civil:

Ana Maria Santos
Resp. Técnico - CREA 2708814672

Fiscal da obra:

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - n.º 271797661-2



DIARIO DE OBRA

OBJETO:SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO
FRANCO - PIRAMBU-SERGIPE

CONTRATO Nº: 55/2024

SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES

DATA 25/06/2024

Reiniciamos a execução das instalações elétricas e também começamos o chumbamento dos pilares do gradil da fachada. Tempo bom

DATA 26/06/2024

Seguimos a execução dos serviços do dia anterior. Tempo Bom

DATA 27/06/2024

A execução das instalações elétricas foram concluídas e segue a execução da colocação dos gradis metálicos. Tempo bom

Tempo

DATA 28/06/2024

Segue a execução dos serviços do dia anterior. Tempo bom

DATA 01/07/2024

Segue a execução dos gradis metálicos na fachada da escola. Tempo bom

DATA 02/07/2024

Segue a execução dos gradis metálicos na fachada da escola. Tempo bom

DATA 03/07/2024

Segue a execução dos gradis metálicos na fachada da escola. Tempo bom

DATA 04/07/2024

Hoje foi concluída a execução dos gradis metálicos. Tempo bom

DATA 05/07/2024

Iniciamos a colocação do piso em grama sintética nas áreas externa da escola. Tempo bom

DATA 09/07/2024

Segue a execução dos serviços do dia anterior. Tempo bom

DATA 10/07/2024

Segue a execução dos serviços do dia anterior. Tempo bom

Engenheiro civil:

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ana Maria Santos
Resp. Técnico - CREA 2708814672

Fiscal da obra:

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2

Data da consulta: 02/09/2024 05:12:23

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **50.907.330/0001-33**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/06/2023**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

CNPJ/CPF	50.907.330/0001-33
Nome	SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
Período de apuração	06/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	27602406507 / eSocial 83692492 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 622,21	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.552,41	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.174,62	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANA MARIA SANTOS
CPF	312.095.995-20
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	29/08/2024 15:52:21
Nº do recibo de entrega	0000050000259328674
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	50.907.330/0001-33



Nome/Razão Social do Empregador
SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Identificador
0124072920175665-0

Tag
50907330 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até

29/07/2024

Observações

Valor a recolher

Composição da Documentação

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	3	373,00	0,00	0,00	20,57	393,57
Total Geral:		373,00	0,00	0,00	20,57	393,57

Data de geração da Guia: 29/07/2024 às 15:04:51 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

Pix Cópia e Cola:

0002010101289600148v.gov.bcb.br/256ptx-qrcode.en?tx.qr=de7api/v2/cash/7a3b36e2d7f07c0e1454c40013c9652660000010393650200151315A-FCU00M17A-P00N04A05B8ap:1:147070503***62E1761D

Payload Location:

plz.qrcode.caixa.gov.br/cpl/v2/cobu/Ya0b385eb47b40c03a4456d403c928

Comprovante de transferência

29 JUL 2024 - 18:08:54

Valor
R\$ 393,57

Tipo de transferência
Pix

Destino

Nome
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ
00360305000104

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta
Conta corrente

Origem

Nome
Ap Maria Santos

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Agência
0001

Conta
41101019-5

CPF
...095.995...

Informações adicionais

Identificador
18ba6c383bdd42518b1446d1468405cf

Vencimento
29/07/2024

Expiração
29/07/2024 23:59:59

Valor original
R\$ 393,57

Nome do devedor
SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ do devedor
50907330000133

IDENTIFICADOR GFD
0124072920175665-0

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.238.120/0001-58

ID da transação: E18236120202407292108s11d080f922

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida
Fonduria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).

TAG
50907330 06/2024 MENSAL

Nome do recebedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do recebedor
00360305000104

Logradouro do recebedor
SBS QUADRA 4 LT 3/4

Cidade do recebedor
Brasilia

UF do recebedor
DF

CEP do recebedor
70092900

MINISTÉRIO DA ECONOMIA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	50.907.330/0001-33
Nome	SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	26489949146 / eSocial 77857404/ Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 593,96	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 787,42	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.381,39	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome	ANA MARIA SANTOS
CPF	312.095.995-20
Telefone	-
Recibo de Entrega da DCTFWeb	
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	06/08/2024 17:40:19
Nº do recibo de entrega	000005000024429295
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	50.907.330/0001-33

CPF/CNPJ do Empregador 50.907.330		Nome/Razão Social do Empregador SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124080622099757-6	Tag 50907330 07/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 271,35

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	2	271,35	0,00	0,00	0,00	271,35
Total Geral:		271,35	0,00	0,00	0,00	271,35

Data de geração da Guia: 06/08/2024 às 16:46:26 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.58
8081008081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SIRIUS E C LTDA
AGENCIA: 8081-0 CONTA: 22.757-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240807212028545566900
CNPJ DO PAGADOR: 50.907.330/0001-33
VALOR: R\$271,35
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/08/2024 - 18:20:46
COD PRODUTO: 01a152a71b104b5aaac072378973d7c5
DEVEDOR: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-33

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/08/2024 - 18:20:47

=====

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: 0.163.A9F.1DB.8CC.C2D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
