

18/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:07
220602206 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME PIRAMBU-SE - FEB
AGENCIA: 2206-3 CONTA: 15.359-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2024
NR. DOCUMENTO	558.081.000.022.757
VALOR TOTAL	16.830,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIRIUS E C LTDA
AGENCIA: 8081-0 CONTA: 22.757-9
NR. DOCUMENTO 552.206.000.015.359
=====

NR. AUTENTICACAO	9.F91.CE9.4FF.351.268
------------------	-----------------------

PAGU

Transação efetuada com sucesso por: JH648495 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME PIRAMBU-SE - FEB
Agência 2206-3
Conta corrente 15359-1

Creditado

Nome SIRIUS E C LTDA
Agência 8081-0
Conta corrente 22757-9
Valor 16.830,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH648496 FABRICIO MUNIZ DOS SANTOS	18/09/2024 14:52:52
	JH648495 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO	18/09/2024 14:56:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH648495 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO.



Entre contas correntes

Debitado

Nome	SME PIRAMBU-SE - FEB
Agência	2206-3
Conta corrente	15359-1

Creditado

Nome	SIRIUS E C LTDA
Agência	8081-0
Conta corrente	22757-9
Valor	16.830,82
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 354996086.

Usuário: JH648496 FABRICIO MUNIZ DOS SANTOS.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

SETEMBRO/2024

Nota de Liquidação: 0918010 Fonte: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Data: 18/09/2024

FORNECEDOR

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA CNPJ/CPF: 50.907.330/0001-33

Endereço: RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS, 229 Compl: SALA B

Bairro: INACIO BARBOSA Cidade: Aracaju UF: SE

E-mail: secltda@gmail.com Telefone: (79)88526-9620 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 Educação

SubFunção: 365 Educação Infantil

Programa: 0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Ação: 1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações

SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo

Fonte: 15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

Marcador: 15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

Centro Custo:

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0730001	30/07/2024	19.360,38	18.826,42	533,96

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº 55/2024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO NA UNIDADE DE ENSINO LEONOR BARRETO FRANCO, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

NOTA FISCAL 0015/2024 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO NA UNIDADE DE ENSINO LEONOR BARRETO FRANCO, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2024.

Documento	Valor
Nota Fiscal (15 / Série: A / UF: SE / Emissão: 15/09/2024)	18.826,42

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
123210601 - Obras em Andamento	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	18.826,42
Retenção		Valor
21881010201-Inss		1.242,54
21881010403-Imposto de Renda - Outros rendimentos		282,40
21881010801-Iss		470,66

DEZOITO MIL E OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Total Retido:	1.995,60
Total Liquido:	16.830,82



TERMO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 50.907.330/0001-33

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS

Bairro: INACIO BARBOSA

E-mail: secltda@gmail.com

Compl: SALA B

Cidade: Aracaju

Telefone: (79)88526-9620

UF: SE

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Conta:

RE Razão EMPENHO	EMIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	FONTE
0730001	30/07/2024	1011.44905100-15420000	Global	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº 55/2024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO NA UNIDADE DE ENSINO LEONOR BARRETO FRANCO, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2024.

Documentação

Nota Fiscal 15
Valor R\$ 18.826,42
Emissão 15/09/2024
Horário de Entrega 18/09/2024 12:53:31

Para acompanhar o andamento do seu processo na fila pública, acesse o link abaixo:

<http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pirambu/fornecedor/filapagamento>

Cadastrado por: Santiago Santos Gois

☒ Aprovado
☐ Reprovado

Obs. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

15/09/2024 19:29:00

Período de Competência

09/2024

Município de Prestação do Serviço

Pirambu - SE

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Pirambu

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Nome Fantasia

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES

Email

SECLTDA@GMAIL.COM

CPF/CNPJ

50.907.330/0001-33

Inscrição Municipal

1440598

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 98852-6962

Endereço

Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, SALA B, Inácio Barbosa - CEP: 49040-830 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PIRAMBU

CPF/CNPJ

13.095.039/0001-81

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3276-1693

E-mail

sec.obraseurbanismo@gmail.com

Endereço

AV CESAR VALDEMIR BOMFIM ROCHA, 16 - Centro - CEP: 49190-000 - Pirambu - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços nº 04/2024 do 1º Termo do Aditivo referente a Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco no Município de Pirambu, Estado de Sergipe, Conforme contrato nº: 55/2024.

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

1.242,54

IR (R\$)

282,40

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

18.826,42

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

18.826,42

Alíquota (%)

2,5000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

470,66

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

16.830,82

Valor Total da Nota (R\$)

18.826,42

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 2.532,15 Federal e R\$ 941,32 Municipal. Fonte: IBPT [19CB11]

Visualizado em: 15/09/2024 19:29:00

Para validação desta NFSe acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

FATURA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2024

BOLETIM Nº 04/2024

**SIRIUS ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕES**

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA
DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU,
ESTADO DE SERGIPE.**

Aracaju - SE. 13 de setembro de 2024

À
Prefeitura Municipal de Pirambu – SE.

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16, Centro.

Pirambu - Estado de Sergipe.

Prezado Senhor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, nossa **Fatura de serviços nº 04/2024 do 1º termo de aditivo**, referente a **Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco no município de Pirambu, Estado de Sergipe**. Conforme **Contrato nº 55/2024** ao mesmo tempo em que solicitamos de Vossa Senhoria se digne homologar.

BANCO: BANCO DO BRASIL
AG.: 8081-0
CONTA CORRENTE: 22757-9

Atenciosamente,



SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Ana Maria Santos
Sócia Administradora

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

FATURA DO 1º TERMO DE ADITIVO Nº. 04/2024

CONTRATO Nº 55/2024 – PREFEITURA DE PIRAMBU-SE.

OBRA: Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco Localizada na Sede do município de Pirambu, Estado de Sergipe.

01 – VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 18.826,42
Importa a presente fatura em (dezoito mil oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos).

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Ana Maria Santos
Sócia Administradora

Aracaju (SE) 13 de setembro de 2024

R E C I B O

R\$ 18.826,42

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pirambu – SE a importância de **R\$ 18.826,42 (dezoito mil oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos)**, referente à **Fatura de serviços nº 04/2024 do 1º termo de aditivo**, referente a **Execução dos Serviços de Reforma da Escola Leonor Barreto Franco no município de Pirambu, Estado de Sergipe**. Conforme **Contrato nº 55/2024**

Aracaju SE. de de

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Ana Maria Santos
Sócia Administradora

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$			%
				ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	
01	REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO										
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES										
01.01.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	6,88	6,88		6,88	28,36	195,12	-	195,12	100,0%
01.01.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022	m2	45,50	25,00	20,50	45,50	73,68	1.842,00	1.510,44	3.352,44	100,0%
01.01.001.006	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	20,10	20,10		20,10	248,67	4.998,27	-	4.998,27	100,0%
01.01.001.007	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	139,50	139,50		139,50	9,43	1.315,49	-	1.315,49	100,0%
01.01.001.008	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 (CALÇADA EXTERNA E INTERMA DO PRÉDIO)	m²	205,11	205,11		205,11	24,16	4.955,46	-	4.955,46	100,0%
01.01.001.009	Demolição de concreto manualmente (CINTA DE CONCRETOS DOS MURO EXISTENTE)	m³	2,24	2,24		2,24	241,73	541,48	-	541,48	100,0%
01.01.001.010	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	94,00	94,00		94,00	9,28	872,32	-	872,32	100,0%
01.01.001.011	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m²	34,40	34,40		34,40	19,06	655,66	-	655,66	100,0%
01.01.001.012	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	197,20	197,20		197,20	4,11	810,49	-	810,49	100,0%
01.01.001.013	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	unid	2,00		2,00	2,00	386,10	-	772,20	772,20	100,0%
01.01.001.014	Lona plástica preta	m²	276,65	150,00	126,65	276,65	5,28	792,00	668,71	1.460,71	100,0%
01.01.001.015	Demolição de reboco	m2	86,40	86,40		86,40	8,18	706,75	-	706,75	100,0%
TOTAL DO ITEM 01.01								17.685,04	2.951,35	20.636,39	100,0%
01.02	ELEVAÇÕES										
01.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	29,12	29,12		29,12	56,45	1.643,82	-	1.643,82	100,0%
01.02.003	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neopren, massa impermeabilizante, inclusive argamassa impermeabilizadora esp=2cm	m2	21,70	21,70		21,70	121,86	2.644,36	-	2.644,36	100,0%
01.02.004	Alvenaria bloco cerâmico vedação de 15x20x30cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:28 (cimento/sareia/areia média) 7cm - Rev.09 resp. Técnico CREA 27197661-2	m2	49,95	49,95		49,95	48,87	2.441,06	-	2.441,06	100,0%

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.

Local : PIRAMBU/SE.

CONTRATO

55/2024

PERÍODO:

31/08/2024
a
13/09/2024

BOLETIM Nº



BM 04

SIRIUS
ENGENHARIA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$			%
				ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	
01.02.006	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	196,62	150,00	46,62	196,62	7,41	1.111,50	345,45	1.456,95	100,0%
01.02.007	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	196,62	150,00	46,62	196,62	35,02	5.253,00	1.632,63	6.885,63	100,0%
01.02.013	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	52,88		52,88	52,88	60,59	-	3.204,00	3.204,00	100,0%
01.02.015	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	105,41	105,41		105,41	120,18	12.668,17	-	12.668,17	100,0%
01.02.016	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabianinha ou similar - Rev 02	m2	105,41	105,41		105,41	57,85	6.097,97	-	6.097,97	100,0%
02.02.017	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m³	40,00	40,00		40,00	168,57	6.742,80	-	6.742,80	100,0%
02.02.001.018	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	146,11	146,110		146,11	34,84	5.090,47	-	5.090,47	100,0%
02.02.001.019	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	141,50	141,50		141,50	62,26	8.809,79	-	8.809,79	100,0%
02.02.001.020	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	58,30		58,30	58,30	128,63	-	7.499,13	7.499,13	100,0%
02.02.001.021	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEl, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 02 (TUBO P/ÁGUA PLUVIAL)	m	16,00		16,00	16,00	47,05	-	752,80	752,80	100,0%
02.02.001.022	Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 horas por dia	h	96,00	96,00		96,00	6,15	590,40	-	590,40	100,0%
02.02.001.023	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. af_08/2022	m³	1,83	1,83		1,83	531,15	972,00	-	972,00	100,0%
02.02.001.024	Concreto magro para lastro, traço 1:4:5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m³	0,70	0,70		0,70	411,03	287,72	-	287,72	100,0%
02.02.001.025	Reaterro manual apoiado com soquete. af_10/2017	m³	19,97	19,97		19,97	51,22	1.022,86	-	1.022,86	100,0%
02.02.001.026	Aço CA - 50 Ø 6,3 3,12 5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens e acessórios para fundações e superestruturas e fundações - R1	Kg	583,48	583,48		583,48	14,16	8.262,08	-	8.262,08	100,0%

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - R.N. nº 211797661-2

Ana Maria Santos
Resp. Técnica - CREA 2708814572

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO											
OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.					Local : PIRAMBU/SE.						
CONTRATO					PERÍODO:		BOLETIM Nº				
55/2024					31/08/2024 a 13/09/2024		BM 04				
											
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$			%
				ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	
02.02.001.027	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	KG	170,60	170,60		170,60	13,21	2.253,63	-	2.253,63	100,0%
02.02.001.028	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos	m²	49,28	49,28		49,28	82,13	4.047,37	-	4.047,37	100,0%
02.02.001.029	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	90,18	90,18		90,18	113,43	10.229,12	-	10.229,12	100,0%
02.02.001.030	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	9,29	9,29		9,29	614,77	5.711,21	-	5.711,21	100,0%
TOTAL DO ITEM 01.02											
01.07	LOUÇAS E METAIS										
	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	3,00	3,00		3,00	652,32	1.956,96	-	1.956,96	100,0%
01.01.007.006	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	4,00	4,00		4,00	67,01	268,04	-	268,04	100,0%
01.01.007.007	Chuveiro plástico sem registro	un	2,00	2,00		2,00	33,25	66,50	-	66,50	100,0%
01.01.007.008	Registro de pressão bruto, latão, rosável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	2,00	2,00		2,00	86,47	172,94	-	172,94	100,0%
TOTAL DO ITEM 01.07											
01.08	DIVERSOS										
01.01.008.002	Limpeza geral	m²	237,67			0,00	2,26	-	-	-	
TOTAL DO ITEM 01.08											
								103.588,58	18.826,42	122.414,99	99,57%
ANOTAÇÕES:											
Atesto que os serviços acima foram executados. Pirambu-Sergipe, __/__/2024											
SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.  Ana Maria Santos Resp. Técnico - CREA 2708814672											
SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  Manoel Messias Soares Neto Engenheiro Civil RNM - 10.22.019/001-1											



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Certidão nº: 39819294/2024

Expedição: 07/06/2024, às 07:14:18

Validade: 04/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 50.907.330/0001-33, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Declaração de Recolhimento do ICMS N. 513434 / 2024

Identificação do Solicitante: 50.907.330/0001-33

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **50.907.330/0001-33** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **50.907.330/0001-33** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **14/09/2024 às 16:10:47**, válida até **14/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 14 de Setembro de 2024

Autenticação: 20240914AUJJLZ



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 513430 / 2024

Inscrição Estadual: 27.197.535-0
Razão Social: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 50.907.330/0001-33
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Endereço: RUA - MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS - SALAB - 229
INACIO BARBOSA - ARACAJU - CEP:49040830

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **14/09/2024 às 15:56:09, válida até 14/10/2024** deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 14 de Setembro de 2024

Autenticação: 20240914ADTNYI



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 50.907.330/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 00:42:08 do dia 21/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/11/2024.

Código de controle da certidão: **CF72.90D1.80DB.E10E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 26 de Agosto de 2024
Nº. 202400516762

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Contribuinte: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 24/11/2024 ✓

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: JH.0097.0037.DH.083C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.907.330/0001-33
Razão Social: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS 229 SALA B / INACIO BARBOSA
/ ARACAJU / SE / 49040-830

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/09/2024 a 05/10/2024 ✓

Certificação Número: 2024090621466105315445

Informação obtida em 14/09/2024 15:37:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 471918/2024

Emissão: 07/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 20159

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Registro: 0000207977

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 50.000,00

Data do Capital: 01/06/2023

Faixa: 1

Objetivo Social Pleno: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA: AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, E DIVISÓRIAS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS.

Endereço Matriz: RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS, 229, SALA B, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU, SE, 49040830

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 26/06/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000020842DDSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANA MARIA SANTOS

Registro: 2708814672

CPF: 312.***.***-20

Data Início: 28/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE

Registro: 2702649815

CPF: 103.***.***-91





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 471918/2024

Emissão: 07/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 20159

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Data Início: 06/09/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGOS 7º e 25 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 470378/2024

Emissão: 11/02/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 5b2d7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: ANA MARIA SANTOS

Registro: 2708814672

CPF: 312.***-**-20

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 03/10/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Restrições: PORTOS E VIAS NAVEGAVEIS, POCOS, AEROPORTOS E FERROVIAS.

Instituição de Ensino: ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA PIO DECIMO

Data de Formação: 07/08/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000207977

CNPJ: 50.907.330/0001-33

Data Início: 28/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANA MARIA SANTOS

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 2708814672

Registro: 0000001279SE

Empresa contratada: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro : 0000207977-SE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU -SERGIPE
PRAÇA NOSSA SENHORA DE LURDES

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

Nº: 16

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PIRAMBU

UF: SE

CEP: 49190000

Contrato: 55/2024

Celebrado em: 13/03/2024

Valor: R\$ 246.882,77

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA GEMIRO DOS SANTOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PIRAMBU

UF: SE

CEP: 49190000

Data de Início: 18/03/2024

Previsão de término: 15/06/2024

Coordenadas Geográficas: -10.633969, -36.803492

Finalidade: Outro

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU -SERGIPE

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA	101,86	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #TOS_1.1.6 - DE MURO	131,05	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRAMBU SERGIPE CONFORME CONTRATO n.º 55/2024

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado a Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar


7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SERGIPE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data


ANA MARIA SANTOS - CPF: 312.095.995-20
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU -SERGIPE - CNPJ:
13.095.039/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 262,55

Registrada em: 01/04/2024

Valor pago: R\$ 262,55

Nosso Número: 8203074143

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 99ZA3
Impresso em: 07/04/2024 às 18:15:10 por: , ip: 189.70.218.124





CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra	Nome da obra	Data do cadastramento		
90.018.68401/71	SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	04/04/2024 17:36		
Origem do cadastramento				
e-CAC				
Tipo Zona	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Zona Urbana	SE20240373270			55/2024
Data do início da obra	CNAE			
18/03/2024	4399103 Obras de alvenaria			

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	18/03/2024

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	PIRAMBU	SE	49.190-000
Bairro	Logradouro	Número	
CENTRO	RUA GEMIRO DOS SANTOS	S/N	

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	50.907.330/0001-33	Construtora
Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade	
18/03/2024		

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
13.095.039/0001-81	MUNICIPIO DE PIRAMBU

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Comercial salas e lojas	Alvenaria	131,05 m²

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Reforma	Comercial salas e lojas	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	131,05 m²	0,00 m²	131,05 m²

Área Resultante



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

ORDEM DE SERVIÇO

VIGÊNCIA:

13/03/2024

CONTRATO: N° _55/2024

OBJETO DO CONTRATO: Contrato de empreitada por preço global para
**REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO LOCALIZADA NA SEDE
DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU, SERGIPE "**

PRAZO DO CONTRATO: 12 meses

DATA DO CONTRATO: 13 de Março de 2024

RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


CONTRATADA: SIRIUS ENGENHARIA E

CONSTRUÇÕES LTDA

Tendo em vista o instrumento contratual acima descrito, celebrado com esta Prefeitura, fica Vossa Senhoria cientificado de que o prazo para início dos serviços objeto do contrato começará a partir de 18/03/2024.

Outrossim, informamos que foi designado pela Prefeitura Municipal de Pirambu, o engenheiro Manoel Messias Soares Neto, para fiscalização dos serviços.

Pirambu, 18 de Março de 2024



Prefeitura de Pirambu
Guilherme Jullius Zacarias de Melo
PREFEITO


CIENTE:



Documento assinado digitalmente
MANOEL MESSIAS SOARES NETO
Data: 18/03/2024 11:31:03-0300
verifique em <https://validar.id.gov.br>

Engº Fiscal: _____

Firma Contratada: _____





MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04/2024 DO 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 55/2024

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO NO
MUNICÍPIO DE PIRAMBU, ESTADO DE SERGIPE.


ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LOCALIZAÇÃO	UNID	QUANT
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022		
	Cálculo: $20,50 \times 1,00 = 20,50 \text{ m}^2$ Total=20,50 m²	m2	20,50
01.01.004			
	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos		
	Cálculo: Total= 2,00 unid	unid	2,00
01.01.001.013			
	Lona plástica preta		
	Cálculo: $16,40 \times 7,73 = 126,77 \text{ m}^2$ Total=126,77 m²	m ²	126,65
01.01.001.014			
01.02	ELEVAÇÕES		
	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09		
	Cálculo: $18,50 \times 2,70 = 49,95 \text{ m}^2$ Total=49,95 m²	m2	49,95
01.02.004			
	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015		
	Cálculo: $8,63 \times 2,70 = 23,31 \times 2 = 46,62 \text{ m}^2$ Total=46,62 m²	m ²	46,62
01.02.001.006			
	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm		
	Cálculo: $8,63 \times 2,70 = 23,31 \times 2 = 46,62 \text{ m}^2$ Total=46,62 m²	m ²	46,62
01.02.001.007			
	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e encerramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado		
	Cálculo: $16,40 \times 3,23 = 52,97 \text{ m}^2$ Total=52,97 m²	m ²	52,88
02.02.001.013			
	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm		
	Cálculo: Total=58,30 m	m	58,30
02.02.001.020			
	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 02 (tubo p/água pluvial)		
	Cálculo: Total=16,00 m	m	16,00
02.02.001.021			

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Ana Maria Santos
Resp. Técnico - CREA 2708814572

Marcos Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661-2

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO DO ADITIVO
DA OBRA REFORMA DA ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**


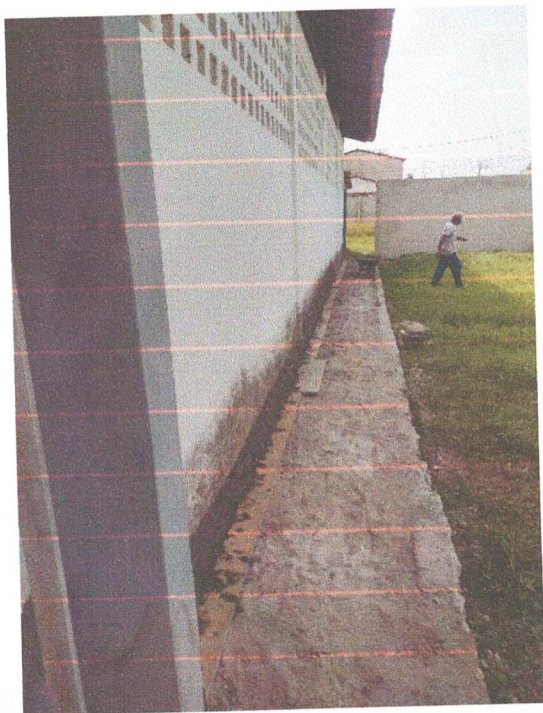


SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

Ana Maria Santos
Resp. Técnico - CREA 2708814672

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 27179766

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO DO ADITIVO
DA OBRA REFORMA DA ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

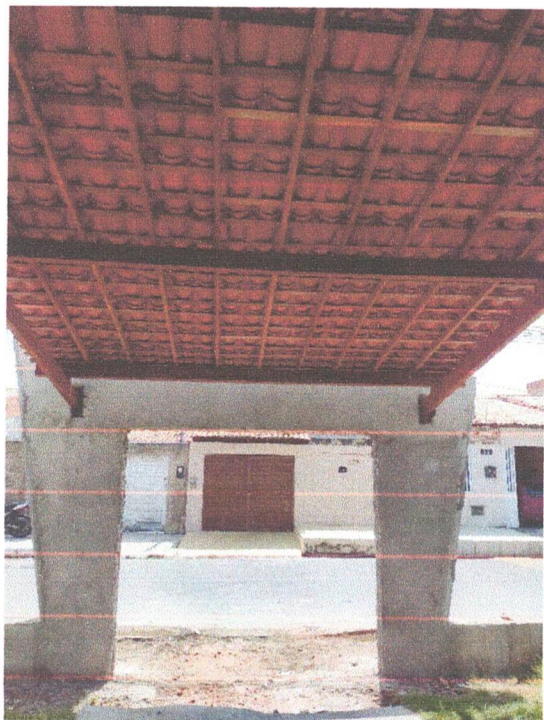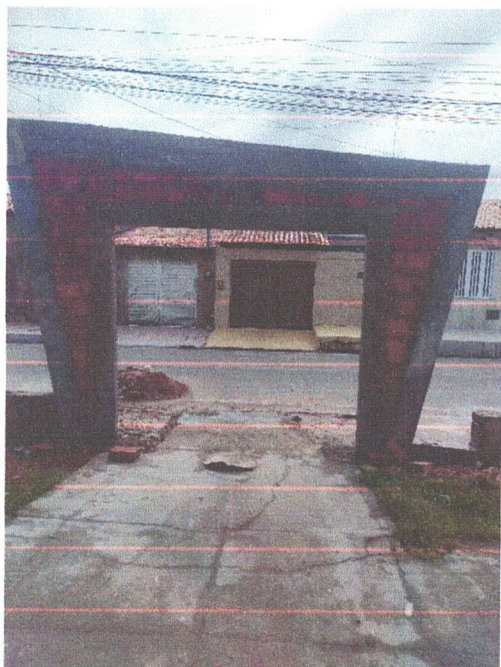

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33

Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa

Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962

EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com


SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ana Maria Santos

Resp. Técnico - CREA 2708814672

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO DO ADITIVO
DA OBRA REFORMA DA ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

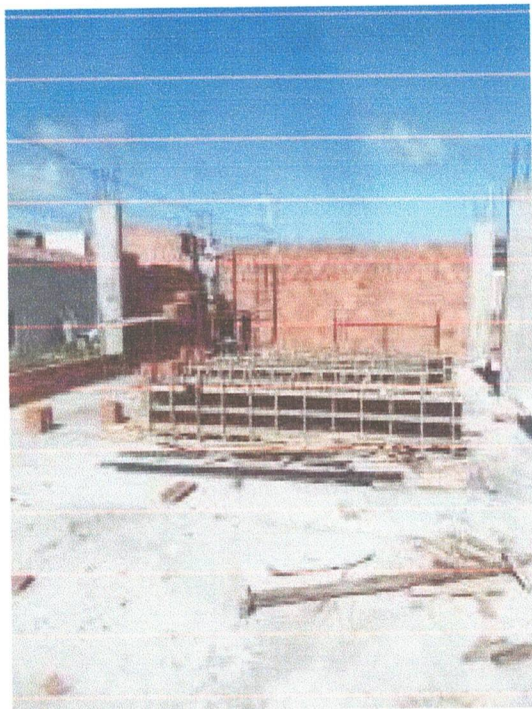

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33

Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA





Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962

EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

Ana Maria Santos
Resp. Técnico - CREA 2708814672

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 271797661

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO DO ADITIVO
DA OBRA REFORMA DA ESCOLA LEONOR GARRETO FRANCO – PIRAMBU SERGIPE**

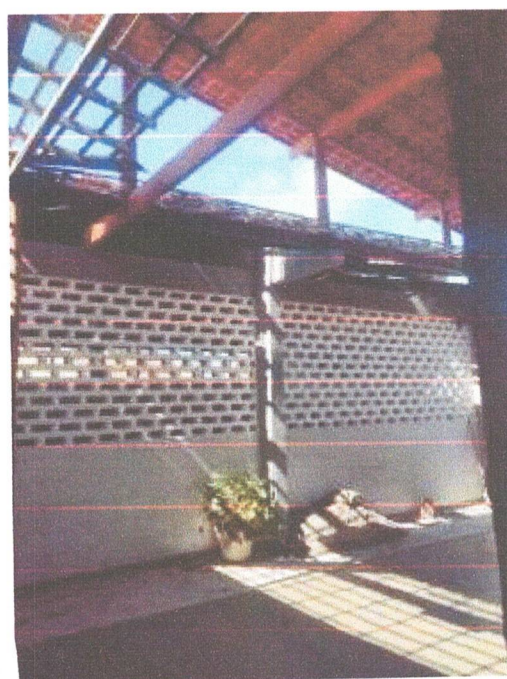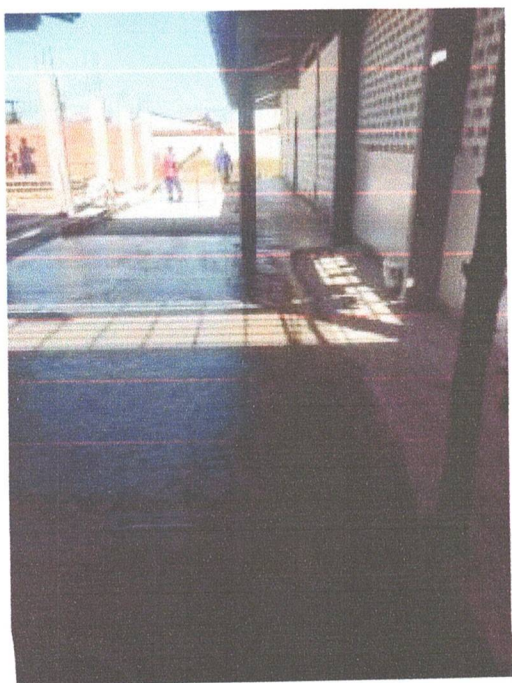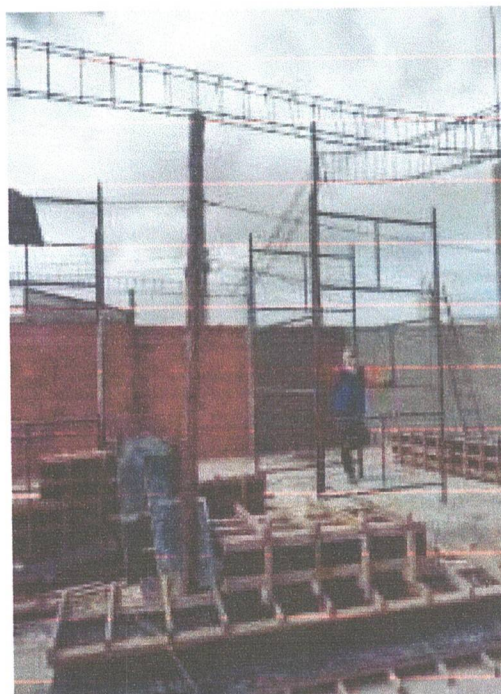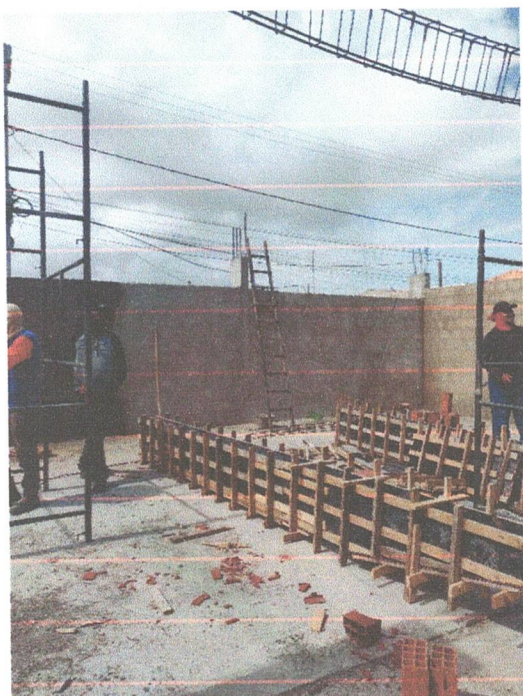

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 50.907.330/0001-33
Rua Manoel de Oliveira Martins, 229, Sala B - Inácio Barbosa
Aracaju-Sergipe - Fone: (79) 98852 6962
EMAIL: siriusconstrucoeseng@gmail.com

Ana Maria Santos
Resp. Técnico - CREA 2708814672

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil R.N. nº 271797661-2



DIARIO DE OBRA

OBJETO:SERVIÇOS DE REFORNA DA ESCOLA LEONOR BARRETO
FRANCO - PIRAMBU-SERGIPE

1º TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 55/2024

DATA: 02/09/2024

Hoje segue a execução dos passeios (calçadas) em concreto despolado sendo lançado antes a lã preta de plástico. Tempo bom

DATA: 03/09/2024

Continua a execução dos serviços do dia anterior. Tempo bom.

DATA: 04/09/2024

Continua a execução dos serviços do dia anterior. Hoje também começamos a execução das rampas para acessibilidades as áreas de circulação da escola. Tempo bom.

DATA: 05/09/2024

Hoje concluímos as calçadas em concreto despolado e rampas de acessibilidade. Também seguimos com a execução de alvenaria de bloco cerâmico. Tempo bom.

DATA: 06/09/2024

Foi concluído o serviço de elevação alvenaria de bloco cerâmico e iniciamos o revestimento das paredes com o chapisco e reboco com argamassa. Tempo bom.

DATA: 09/09/2024

Continua a execução dos serviços de revestimento das paredes do dia anterior. Tempo bom.

DATA: 10/09/2024

Concluímos a execução dos serviços de revestimento de paredes e iniciamos a execução do piso de alta resistência. Tempo bom

DATA: 11/09/2024

A execução do revestimento de parede foi concluída e segue a execução do piso de alta resistência. Tempo bom

DATA: 12/09/2024

Continua a execução do serviço do dia anterior. Tempo bom

DATA: 13/09/2024

Seguem os serviços do dia anterior e iniciamos a colocação das calhas em alumínio. Tempo bom

Engenheiro civil:

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Anna Maria Santos
Resp. Técnico - CREA 2708814672

Fiscal da obra:

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - R.N. 271707661-2

Data da consulta: 02/09/2024 05:12:23

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **50.907.330/0001-33**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/06/2023**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	50.907.330/0001-33
Nome	SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
Período de apuração	08/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	27955258216 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 526,91	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.260,13	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.787,04	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Esta declaração foi entregue fora de prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 50000264570129 conforme previsto no art. 11 do Decreto nº 7.574, de 29 de setembro de 2011.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome	ANA MARIA SANTOS
CPF	312.095.995-20
Telefone	-
Recibo de Entrega da DCTFWeb	
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/09/2024 14:40:03
Nº do recibo de entrega	0000050000264570129

CPF/CNPJ do Empregador
50.907.330

Nome/Razão Social do Empregador
SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124091328222950-4

Tag
50907330 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/09/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

271,35

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	2	271,35	0,00	0,00	0,00	271,35
Total Geral:		271,35	0,00	0,00	0,00	271,35

Data de geração da Guia: 13/09/2024 às 11:43:57 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/10c6d9220c4942d3815e7616149604d9520400005303986582BR5923CA1EA ECONOMICA FEDERAL400R0can115a62079503**630493C7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/10c6d9220c4942d3815e7616149604d9

(Sem assunto)

De: Ana Maria Santos Santos (anamaria1866@yahoo.com.br)
Para: anamaria1866@yahoo.com.br
Data: sábado, 14 de setembro de 2024 às 18:39 BRT



Pix enviado
R\$ 271,35

Sobre a transação

Data da transação 14/09/2024
Horário 18h37
Identificador e3c9de8c0f9c4fcd97c0c8b04e21331d
ID da transação E00416968202409142135ScrEWDCPO6u

Quem pagou

Nome SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTD
CPF/CNPJ 50.907.330/0001-33
Conta 348405782
Agência 0001
Instituição BANCO INTER S.A.

Quem recebeu

Nome Caixa Economica Federal
CPF/CNPJ 00.360.305/0001-04
Agência 0647
Número da conta 9999000537000360305-5
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

[Yahoo Mail. Simples, sensível e aumenta sua produtividade.](#)
